

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.10

工程名稱：頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程



0k+183 右側擋土牆側面，局部蜂窩、孔洞產生。

說明

0k+183 右側擋土牆側面，局部蜂窩、孔洞產生。



道路兩側擋土牆頂面及排水溝面層，混凝土養護不足，局部塑性收縮裂縫。

10/08/2022


說明

道路兩側擋土牆頂面及排水溝面層，混凝土養護不足，局部塑性收縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.10

工程名稱：頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程

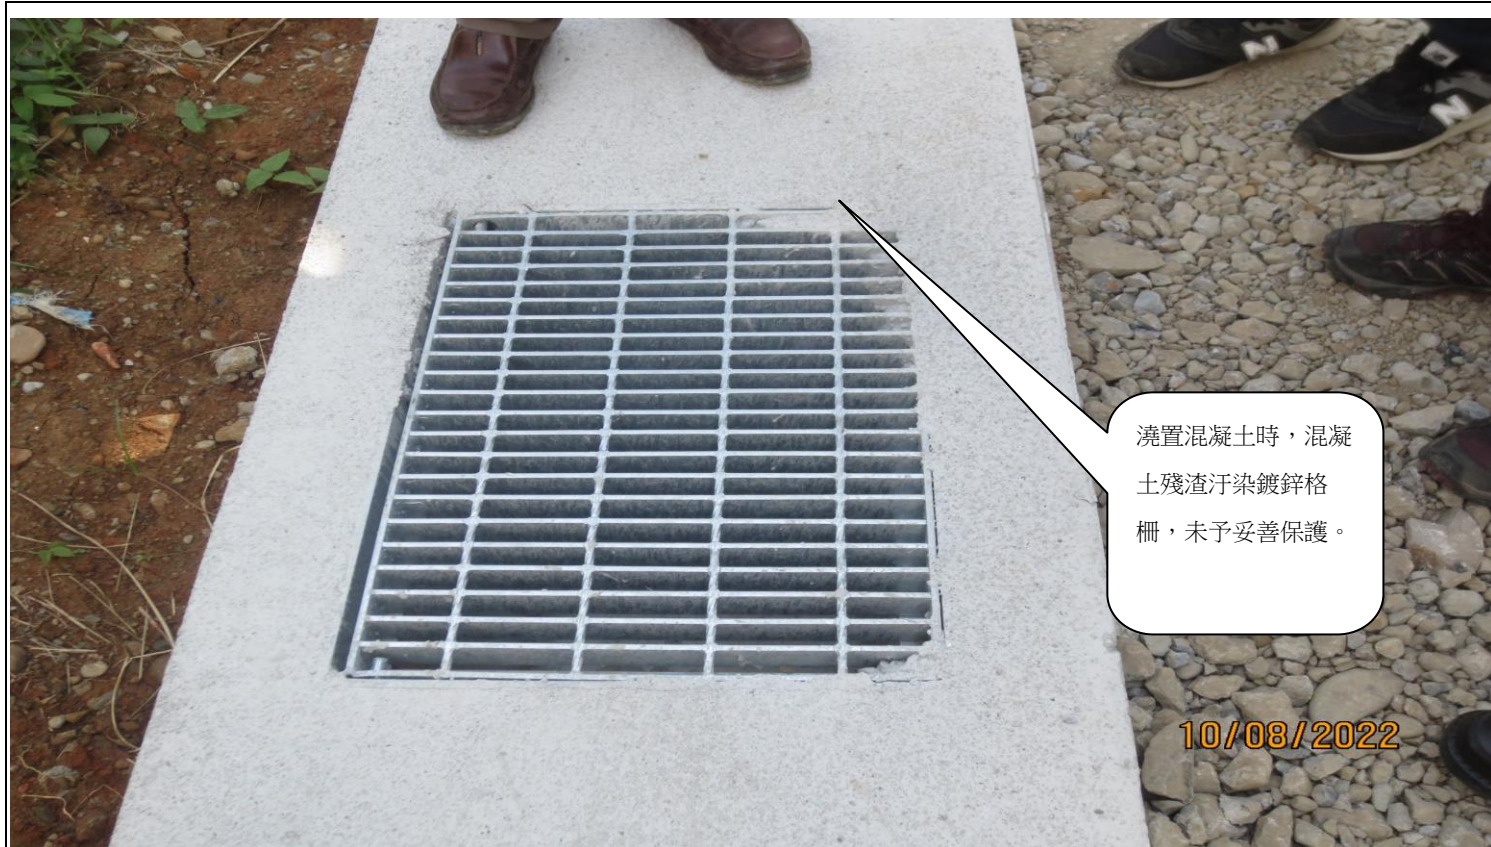

說明

澆置混凝土時，混凝土殘渣汙染鍍鋅格柵，未予妥善保護。



說明

0k+160 左側排水溝，牆筋保護層不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.10

工程名稱：頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程



說明

草溝回填區局部塊石、飲料瓶、垃圾未清除。



說明

工程告示牌，缺經費來源及專任工程人員電話資訊。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.10.

工程名稱：頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程



0k+110 右側擋土牆頂面，混凝土澆置時下雨，致完成面石料外露不平整。。

說明

0k+110 右側擋土牆頂面，混凝土澆置時下雨，致完成面石料外露不平整。



草溝回填區局部塊石、飲料瓶、垃圾未清除。

10/08/2022

說明

草溝回填區局部塊石、飲料瓶、垃圾未清除。
