


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.21

工程名稱：新整建運動場地—室外運動場地整修建工程

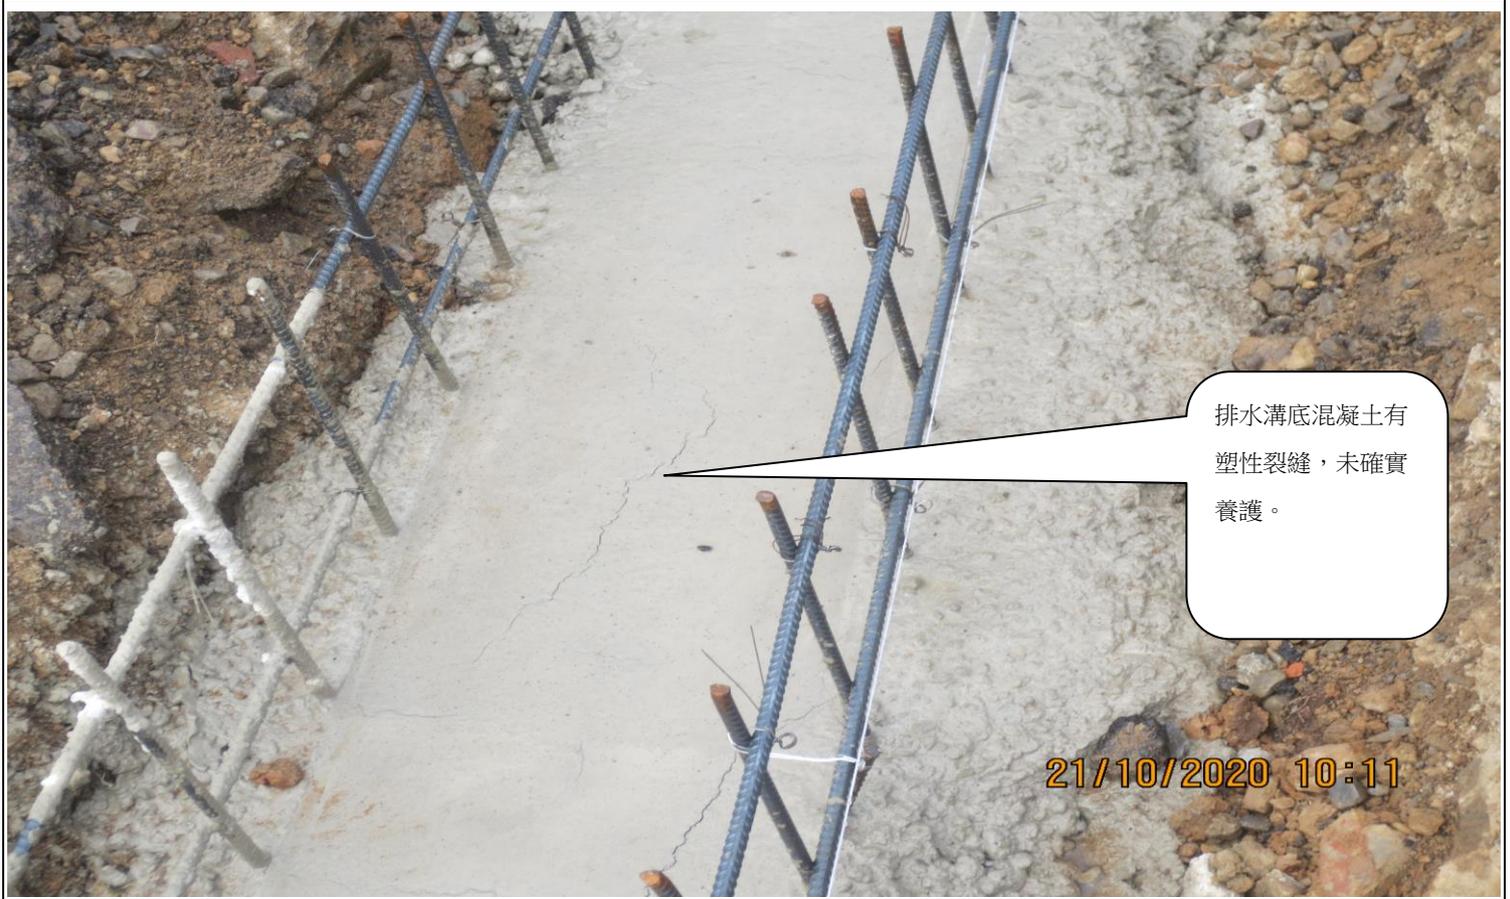

排水溝底混凝土有塑性裂縫，未確實養護。

21/10/2020 10:11

說明

排水溝底混凝土有塑性裂縫，未確實養護。



排水溝垂直鋼筋歪斜及部分間距不均，未確實綁紮固定。

21/10/2020 10:13

說明

排水溝垂直鋼筋歪斜及部分間距不均，未確實綁紮固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.21

工程名稱：新整建運動場地—室外運動場地整修建工程



部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。

21/10/2020 10:12

說明

部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。



暫置之PU及AC廢料請加強帆布覆蓋。

21/10/2020 10:15

說明

暫置之PU及AC廢料請加強帆布覆蓋。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.21

工程名稱：新整建運動場地—室外運動場地整修建工程



說明

排水溝臨跑道側開挖寬度不足。



說明

工地現場塵土飛揚應加強噴水或灑水。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.21

工程名稱：新整建運動場地—室外運動場地整修建工程



說明

級配層填築中，惟部分區域混雜混凝土塊及鋪面磚。



說明

工程告示牌政風欄位未填寫，請補正。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.21

工程名稱：新整建運動場地—室外運動場地整修建工程



說明

施工人員未戴安全帽，請確實配戴，以維安全。



說明

司令台兩處階梯緊鄰跑道無緩衝區域，人員安全是否妥適請檢視。
