

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.12.09

工程名稱：六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）



說明

1K+163 及 1K+280 左側擋土牆混凝土澆置，搗實不合規範有孔洞情形產生。

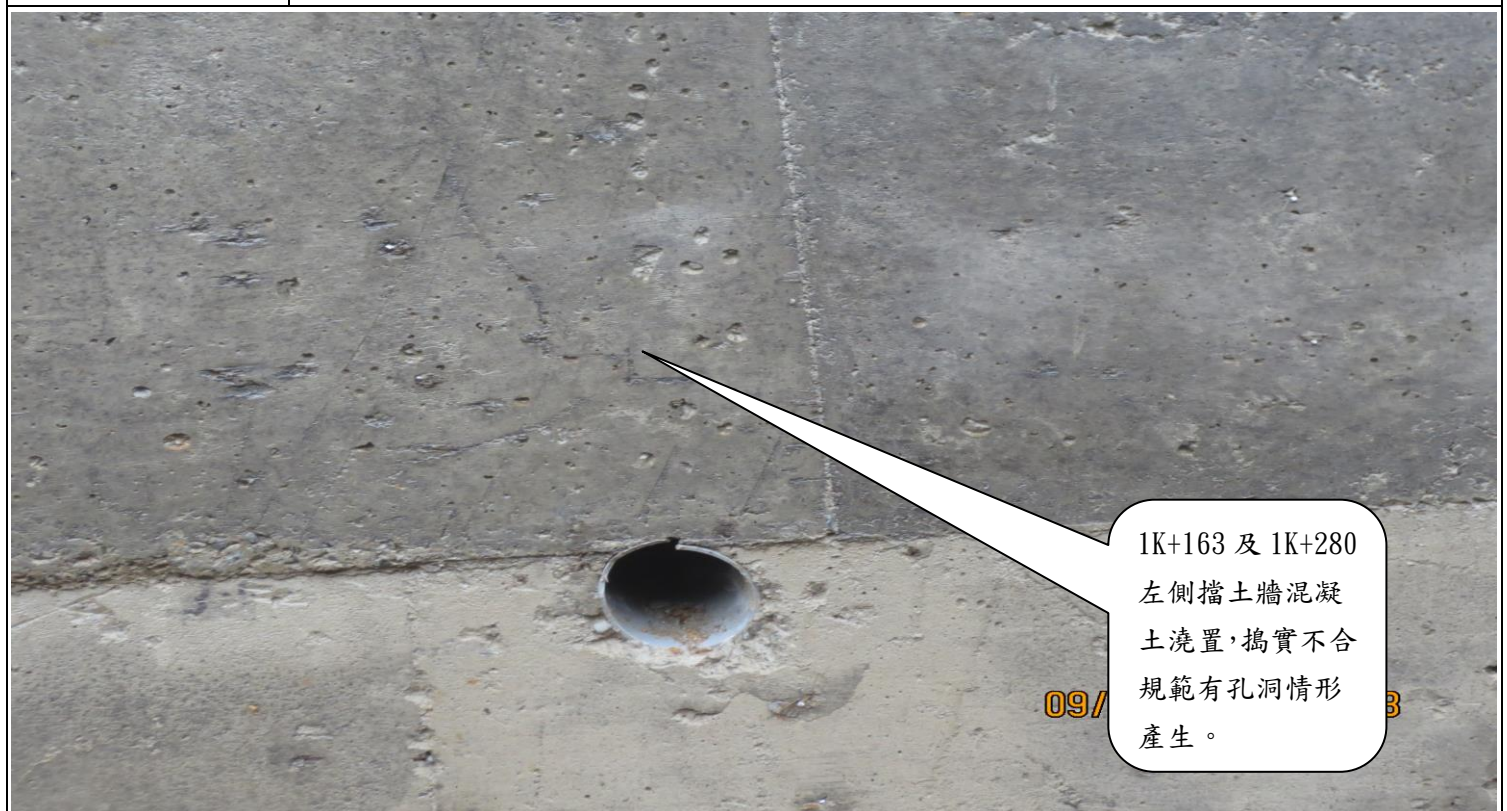

說明

1K+163 及 1K+280 左側擋土牆混凝土澆置，搗實不合規範有孔洞情形產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.09

工程名稱：六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）



說明

1K+280 左側擋土牆完成頂面不平整(不平順)。



說明

1K+175 左側擋土牆伸縮縫留設未對齊，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.09

工程名稱：六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）



說明

1K+177 左側擋土牆洩水管有破裂情形，請更換。



說明

模板支撐角材不足請檢討以避免爆模確保混凝土。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.09

工程名稱：六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）



擋土牆混凝土
完成面模板接
縫不平整

09/12/2020 10:21

說明

擋土牆混凝土完成面模板接縫不平整(模板施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。



橋樑伸縮縫內瀝
青混凝土廢料未
清除。

工程主辦機關名稱(Title of the Agency)			
六曲窩至小田部落道路改善工程(第二期工程)			
國聖工程顧問有限公司		設計單位 (Designey)	國聖工程顧問有限公司
亞春營造有限公司		工程概要 (Project Descriptions)	
109年11月05日至110年05月04日 (05/11/2020~04/05/2021)			
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	邱垂鴻	電話 (Tel)	0937-536100
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	劉弘生	電話 (Tel)	0918-081019
通報專線 (Complaints Suggestions)	全民督工專線及網 (Hot Line and Web site) 0800-009-609 電子條碼區域 http://www.pcc.gov.tw		
經費來源 (Budgetay sources)	1.中央: 16209.492 (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方: 2422.108 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. __年(Yr) __月(M) __日(D) 2. __年(Yr) __月(M) __日(D)		

09/12/2020 10:44

說明

工程告示牌內容缺主辦機關及政風單位電話未符規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.09

工程名稱：六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）



說明

請設計顧問公司對於矮牆頂部上方考慮增做土包矮牆起點至終點處應做收頭以防豪雨沖刷土石。



說明

請設計顧問公司對於矮牆頂部上方考慮增做土包矮牆起點至終點處應做收頭以防豪雨沖刷土石。
