

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.03

工程名稱：寶山鄉新東路災害復建工程



說明

擋土牆混凝土伸縮縫少部份設置不當(未切割到底)請改善。



說明

護欄鋼板端頭處，有泥土汙染情形請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.05.03

工程名稱：寶山鄉新東路災害復建工程



說明

工區廢棄混凝土未妥善處理請加強清理。

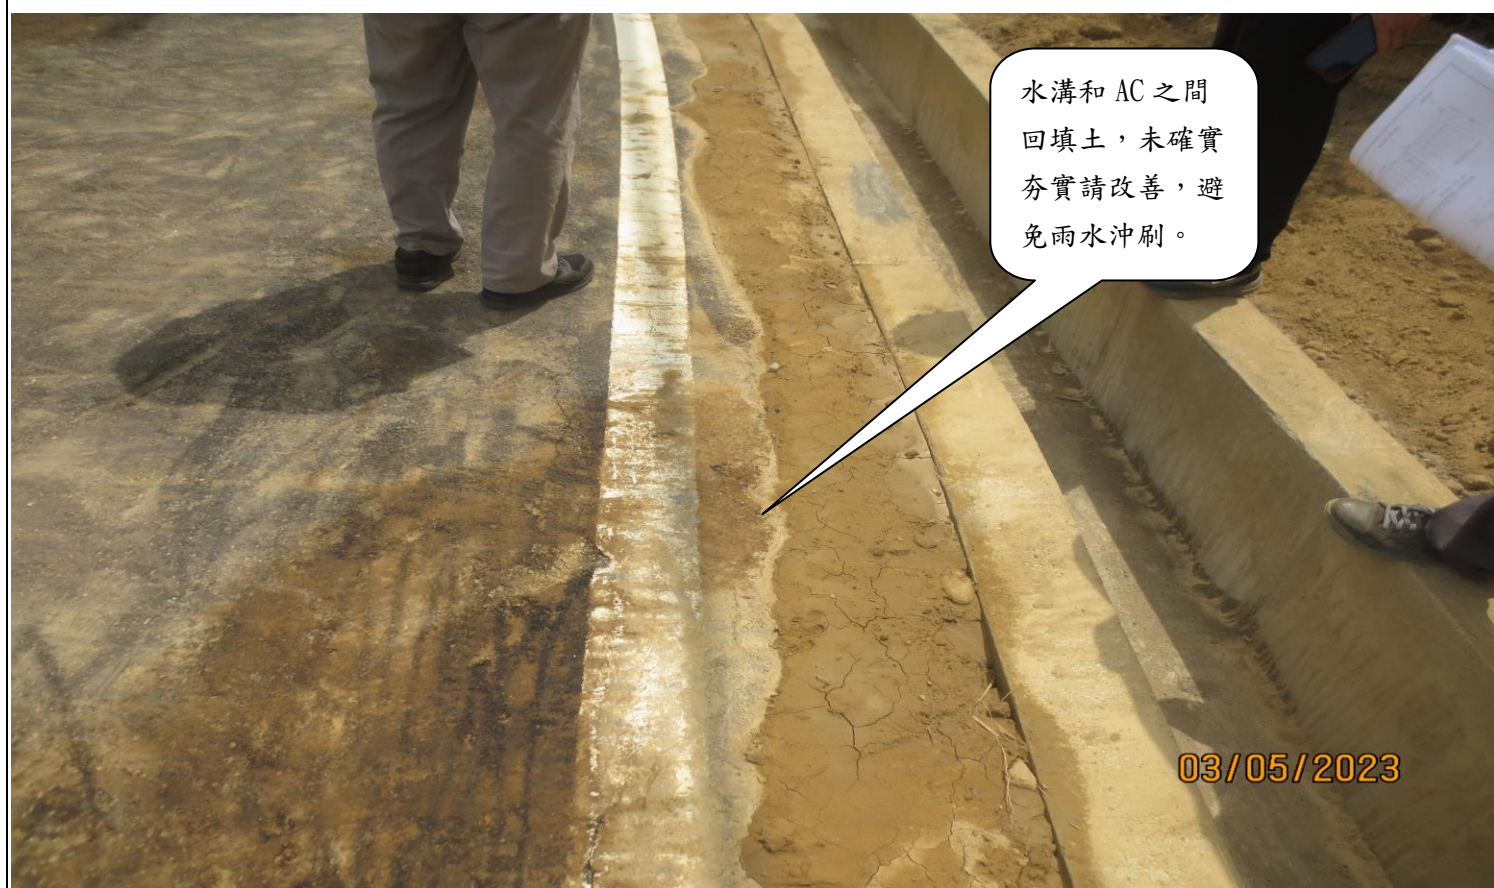

說明

水溝和 AC 之間回填土，未確實夯實請改善，避免雨水沖刷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.03

工程名稱：寶山鄉新東路災害復建工程



說明

集水井內有混凝土殘留，請改善。



說明

本工程職業安全衛生告示牌，緊急事故聯絡勞安單位及分送醫院有誤，請查明更正。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.03

工程名稱：寶山鄉新東路災害復建工程



說明

原有水溝和新做涵管銜接處，建議加設鐵網，以免日後造成阻塞。



說明

擋土牆二側和原土坡銜接處，建議沙包或其他方式收邊，以免豪雨造成崩落
