

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.01

工程名稱：清石道路 7.18K 等 3 件災害復建工程

混凝土養護不合規範，
塑性收縮造成裂縫
(7K+500 擋土牆頂有塑
性收縮造成裂縫)。

2024/04/01

說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(7K+500 擋土牆頂有塑性收縮造成裂縫)。

其他鋼鈹護欄缺失
(鋼鈹護欄端部接
合螺栓無墊圈)


2024/04/01

說明	其他鋼鈹護欄缺失(鋼鈹護欄端部接合螺栓無墊圈)
----	-------------------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.01

工程名稱：清石道路 7.18K 等 3 件災害復建工程

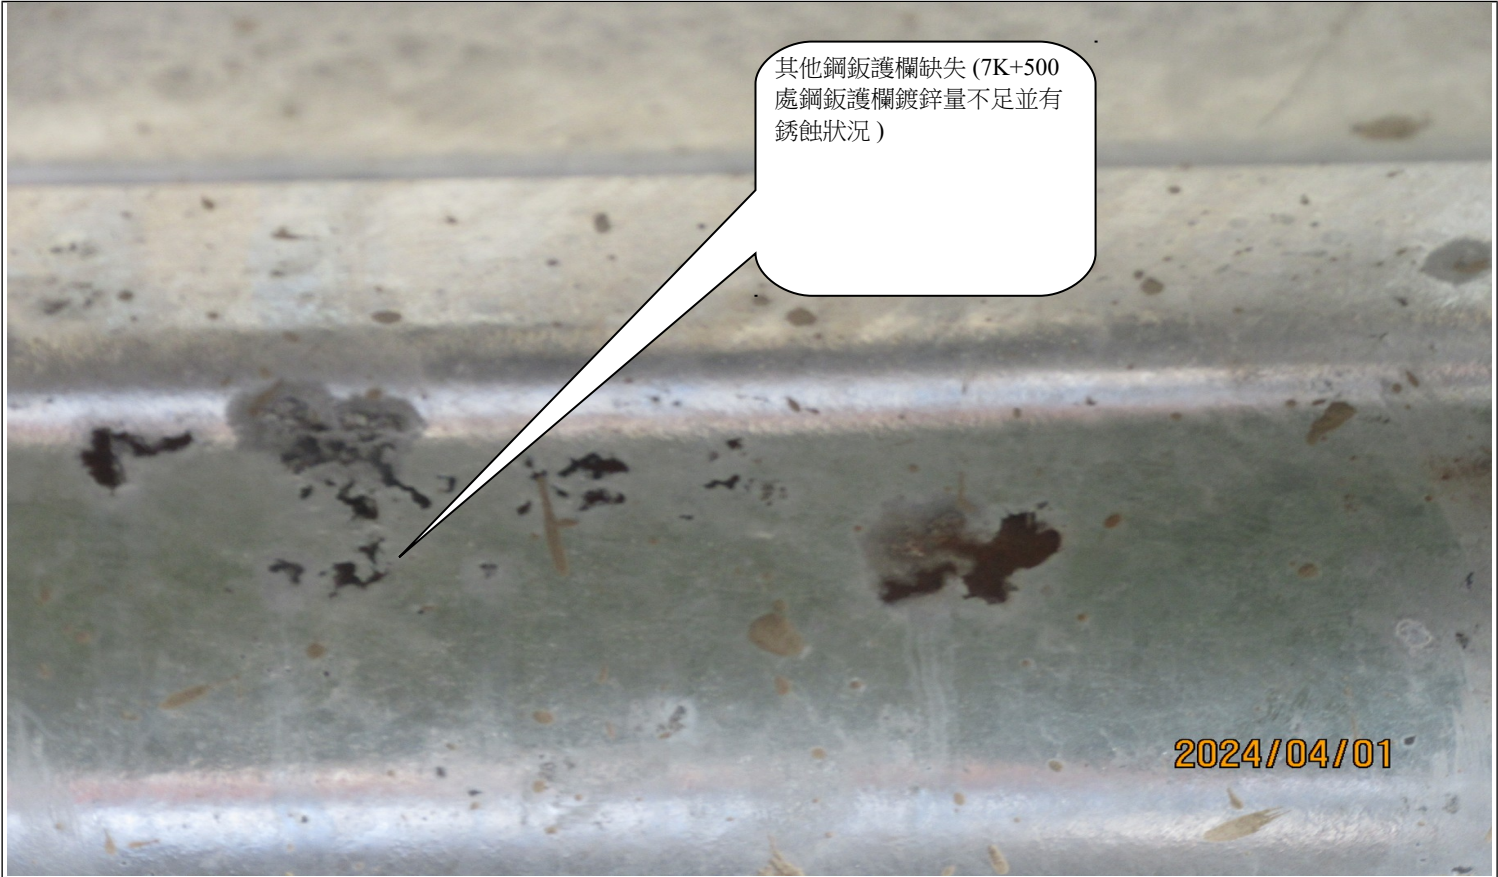

說明	其他鋼鈹護欄缺失(7K+500 處鋼鈹護欄鍍鋅量不足並有銹蝕狀況)
----	-----------------------------------

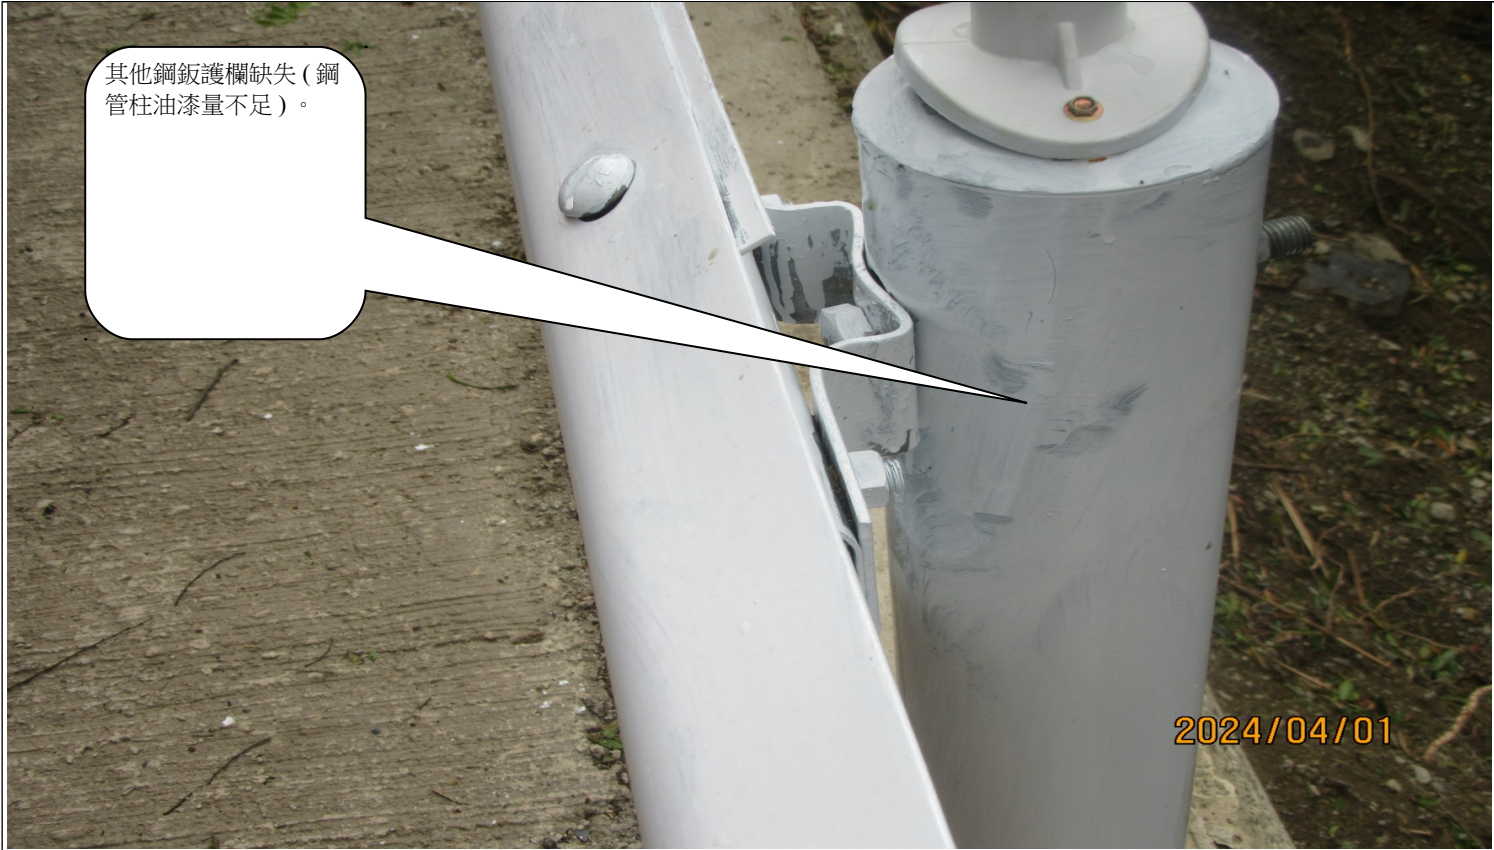

說明	其他鋼鈹護欄缺失(鋼管柱油漆量不足)。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.01

工程名稱：清石道路 7.18K 等 3 件災害復建工程



說明	開挖或回填土面高程或斷面不符(7K+200 處擋土牆基礎回填量不足，基礎外露)。
其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(抽查 7K+500~7K+530，在 7K+505~520 進場鋼鈹護欄鍍鋅量不足並有銹蝕狀況)。 	
說明	其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(抽查 7K+500~7K+530，在 7K+505~520 進場鋼鈹護欄鍍鋅量不足並有銹蝕狀況)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.01

工程名稱：清石道路 7.18K 等 3 件災害復建工程




建議日後若有類似復建工程，需考慮增設靠山側之排水溝及設置路面橫向截水溝，以避免大雨造成沖刷路面或路基。

2024/04/01

說明

建議日後若有類似復建工程，需考慮增設靠山側之排水溝及設置路面橫向截水溝，以避免大雨造成沖刷路面或路基。

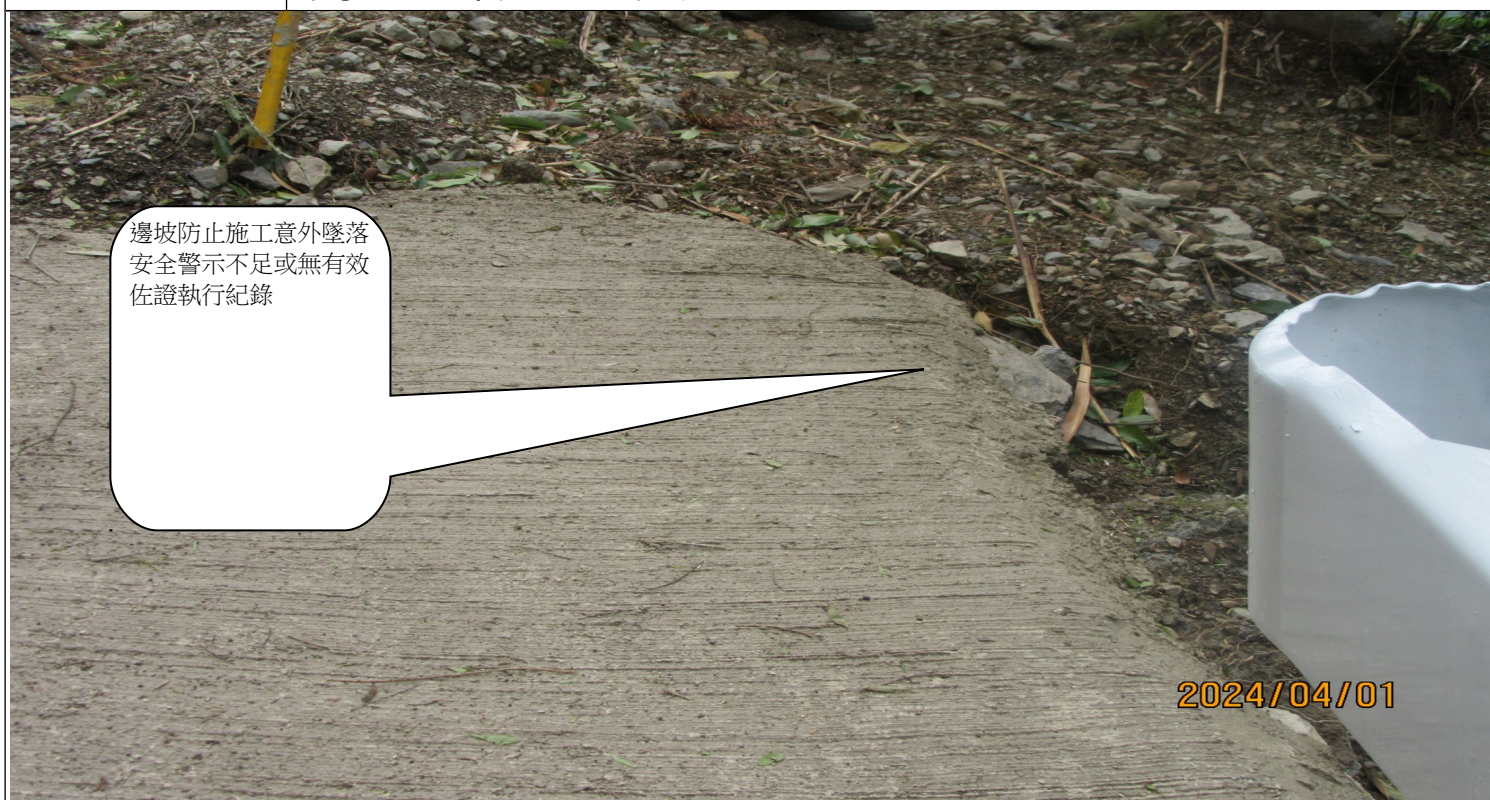

邊坡防止施工意外墜落安全警示不足或無有效佐證執行紀錄

2024/04/01

說明

邊坡防止施工意外墜落安全警示不足或無有效佐證執行紀錄
