

# 新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

地下2樓地坪基座未做倒角收邊。




說明

RF屋頂層女兒牆局部殘留多餘鋼筋未清除。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程

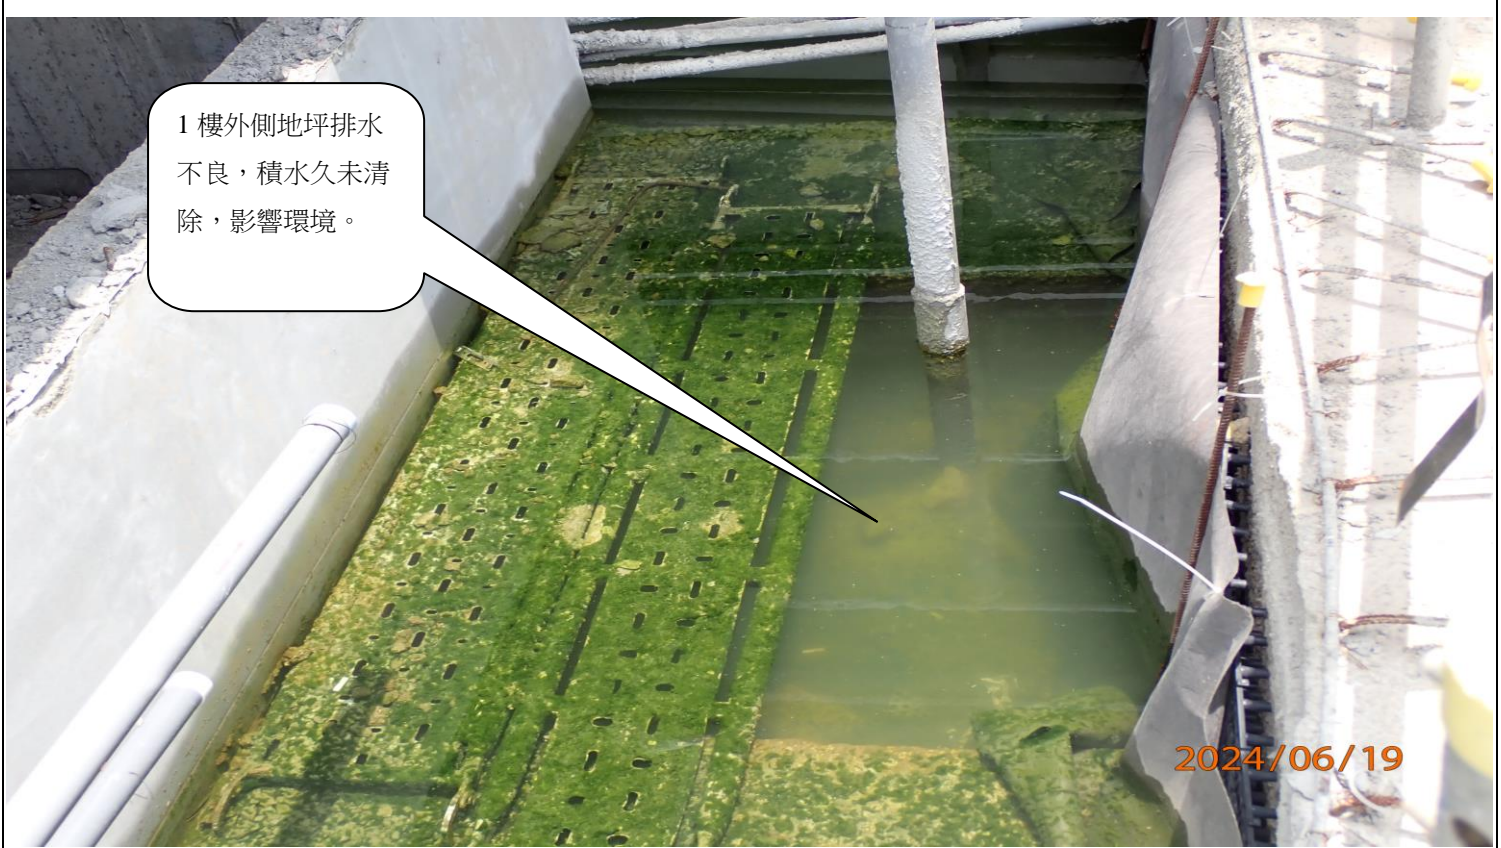

1 樓外側地坪排水不良，積水久未清除，影響環境。

## 說明

1 樓外側地坪排水不良，積水久未清除，影響環境。



給水立管層間垂直向未加固處理。

## 說明

給水立管層間垂直向未加固處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

. EMT 管扭斷螺絲未確實鎖緊。



4 樓雨排水懸空吊筋水平垂直向不穩固。


說明

4 樓雨排水懸空吊筋水平垂直向不穩固。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程

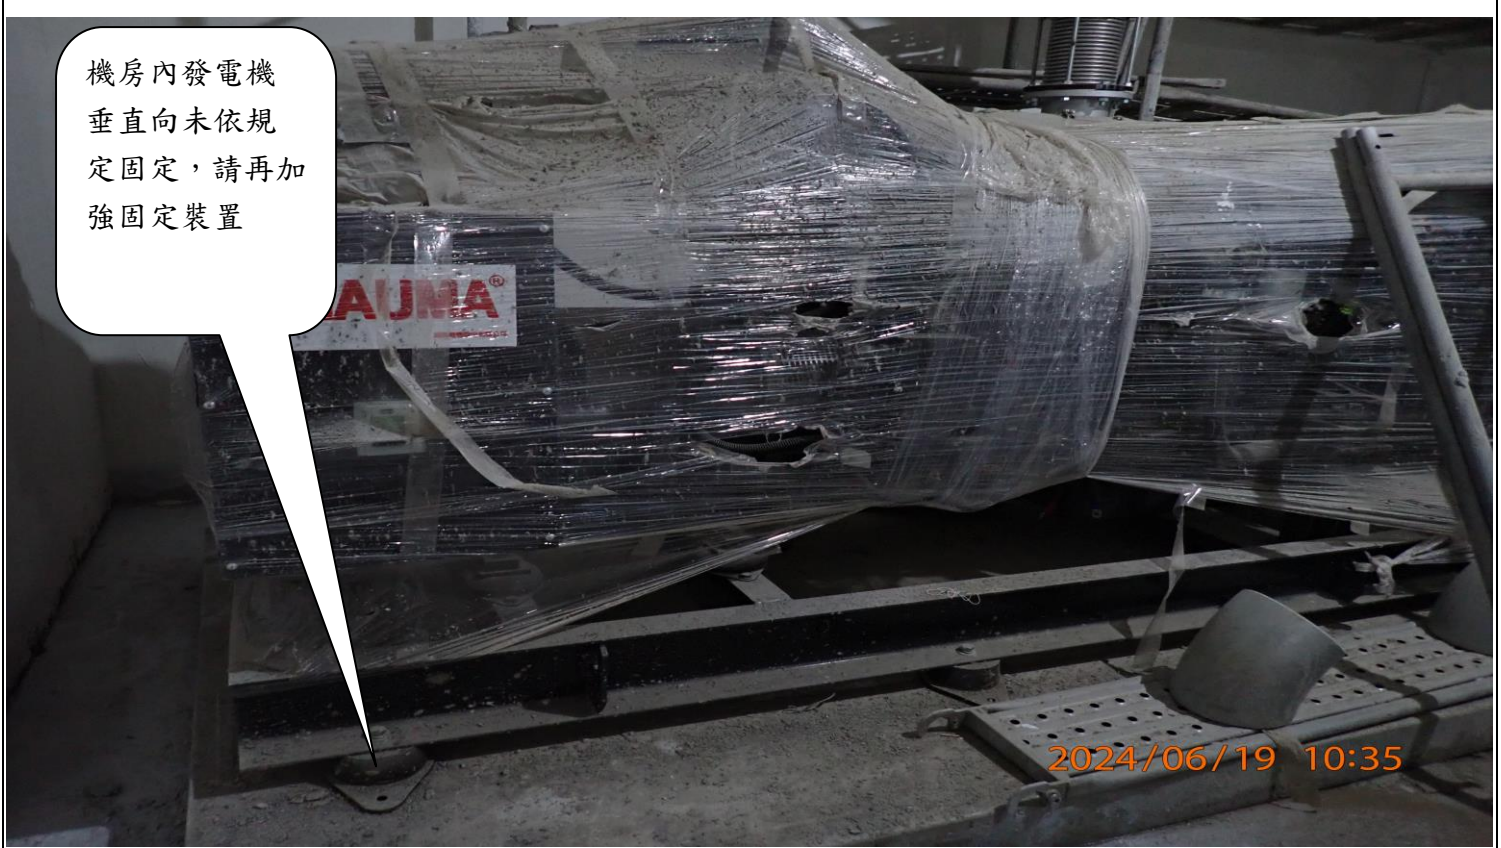

說明

機房內發電機垂直向未依規定固定，請再加強固定裝置



說明

管路油漆顏色有被刮傷受損，應及時修補(護)。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表


拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

3樓屋頂層地坪排水管一處未以帽蓋保護。

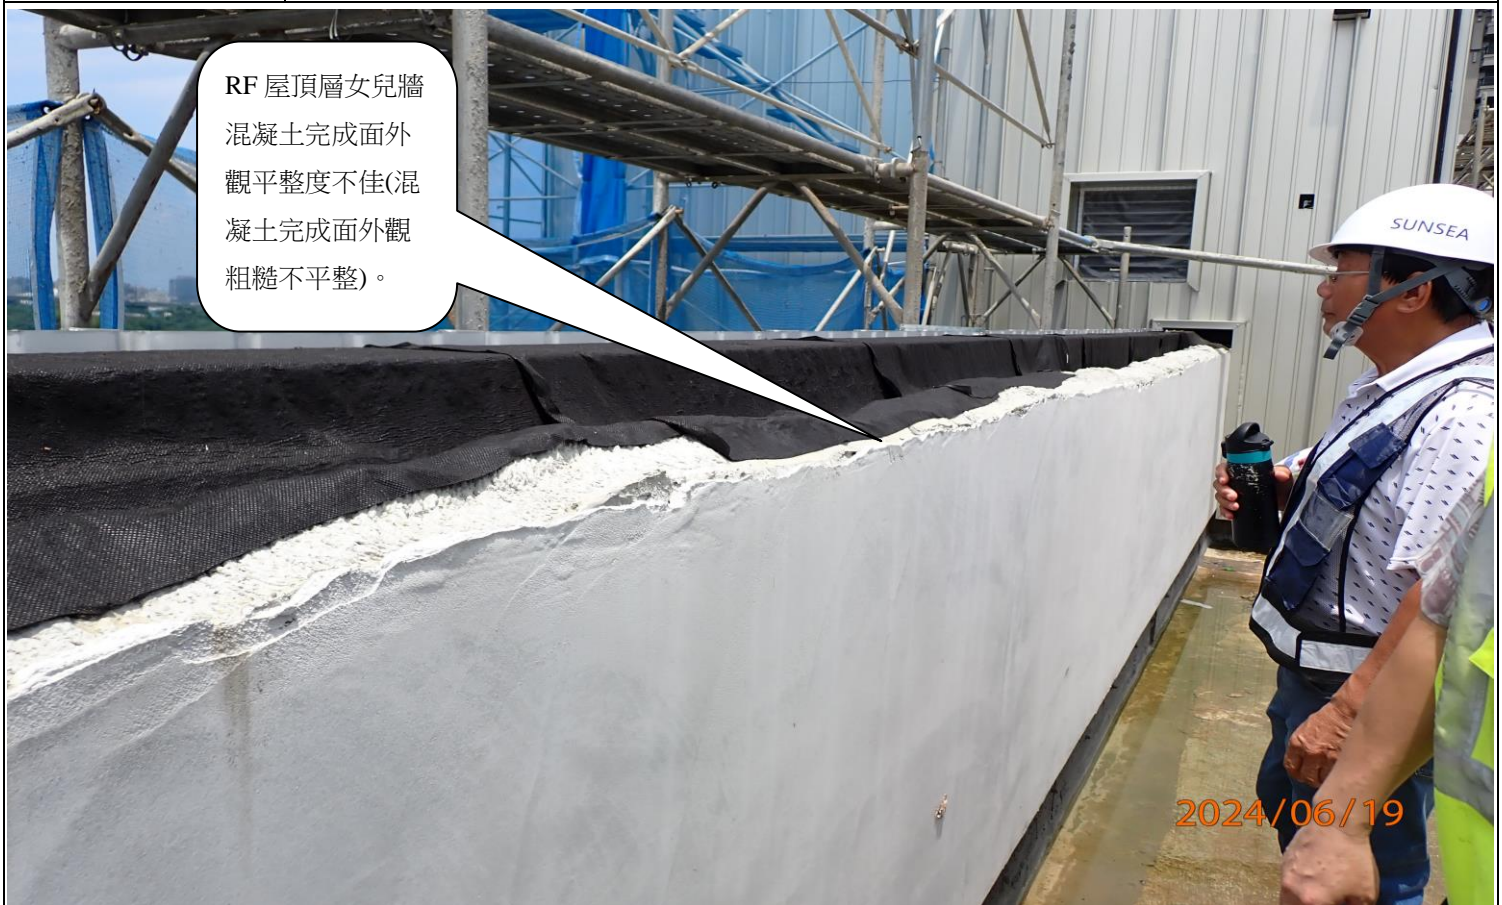

說明

RF屋頂層女兒牆混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙不平整)。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



1 樓外側地坪堆置鋼筋，與地面接觸，未架高懸空妥善保護。

2024/06/19

## 說明

1 樓外側地坪堆置鋼筋，與地面接觸，未架高懸空妥善保護。



1 樓南側入口安全護欄拆除未復舊。

2024/06/19

## 說明

1 樓南側入口安全護欄拆除未復舊。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

1/2 樓樓梯間間隙開口未以安全防護網保護。



說明

屋頂層風管吊筋臨時設置未設防護設施。

# 新竹縣政府工程複查代表照片表


拍攝日期：113.06.19

工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程



說明

屋頂層露臺工作架水平踏板、交叉拉桿局部拆除未符規定。

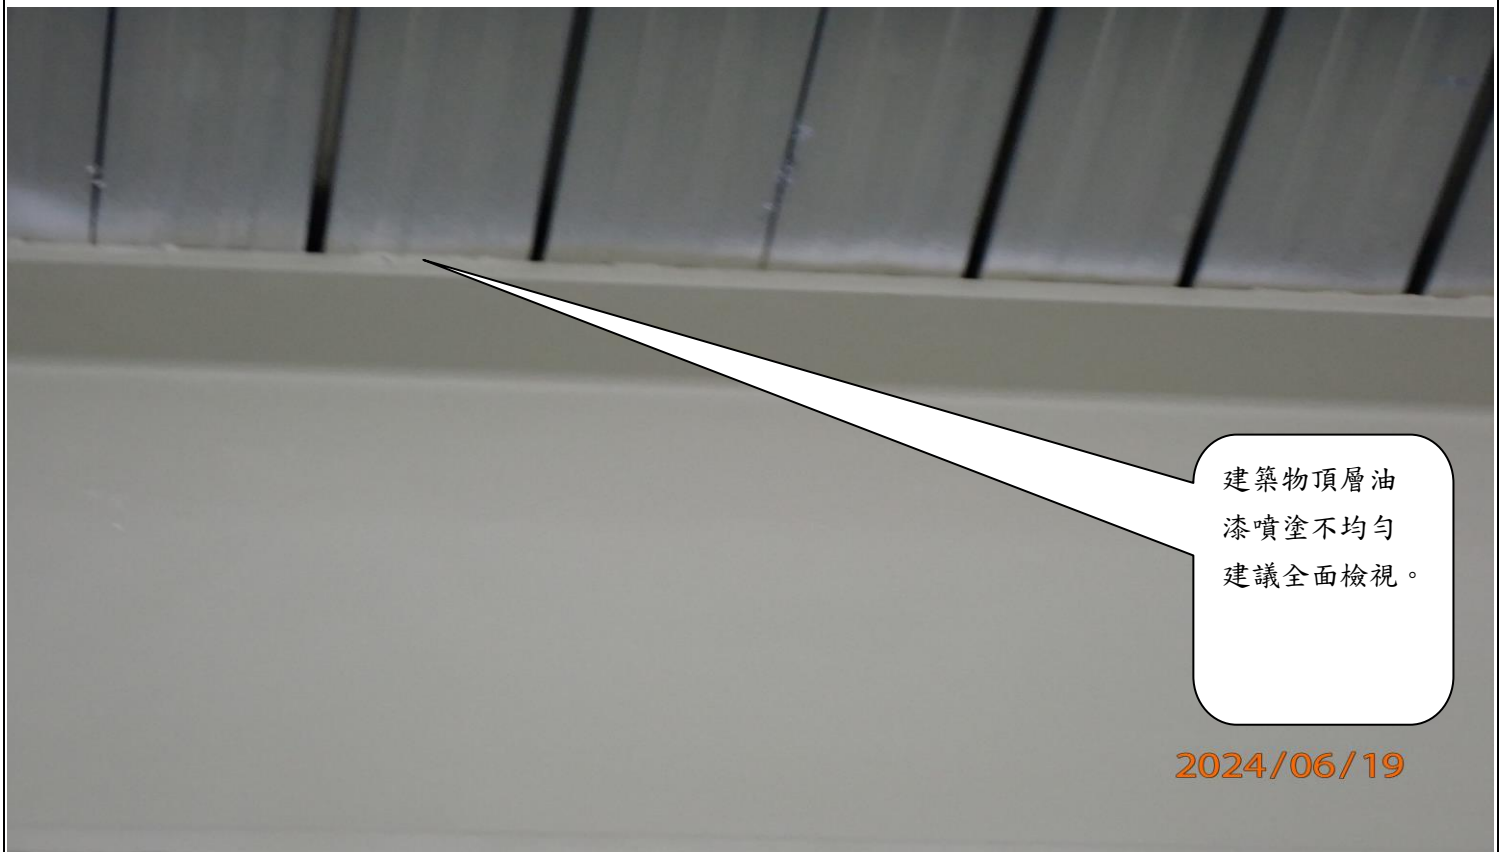

說明

建築物頂層油漆噴塗不均勻建議全面檢視。
