

新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.07.12


工程名稱：112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫



混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(現場混凝土步道發現)

2024/07/12

說明	混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(現場混凝土步道發現)
----	---------------------------------

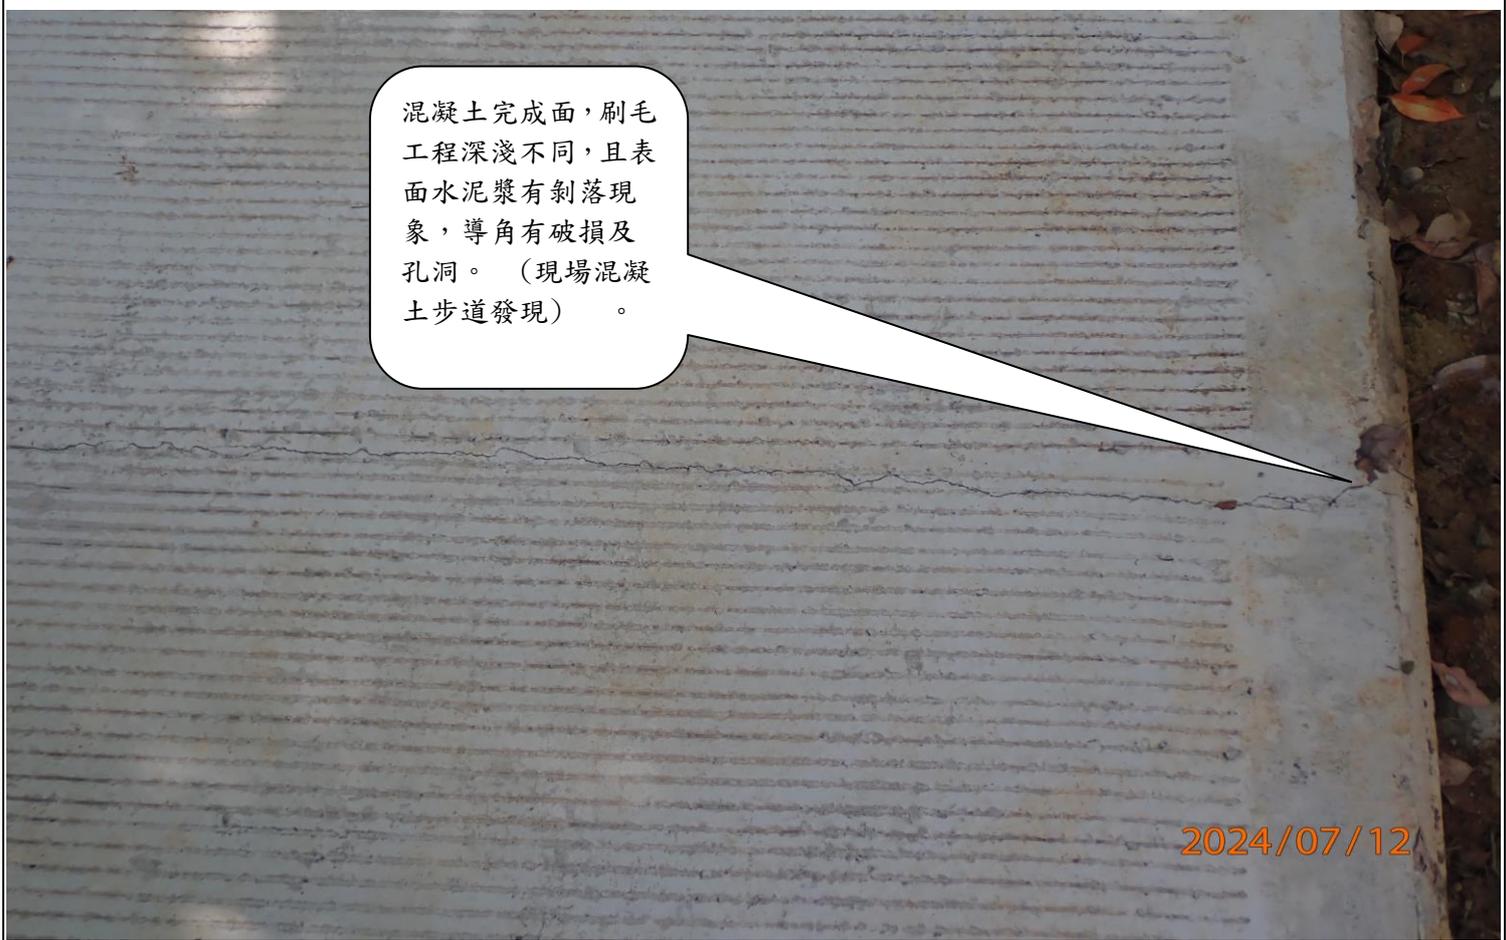

混凝土完成面，刷毛工程深淺不同，且表面水泥漿有剝落現象，導角有破損及孔洞。(現場混凝土步道發現)。

2024/07/12

說明	混凝土完成面，刷毛工程深淺不同導角有破損及孔洞。(現場混凝土步道發現)
----	-------------------------------------

新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.07.12

工程名稱：112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫



混凝土完成面，刷毛工程深淺不同，且表面水泥漿有剝落現象，導角有破損及孔洞。（現場混凝土步道發現）。

說明

混凝土完成面，刷毛工程深淺不同，且表面水泥漿有剝落現象，導角有破損及孔洞。（現場混凝土步道發現）。



遊戲砂池回填砂現場發現遊戲砂池邊緣粉刷不平整。

說明

遊戲砂池回填砂現場發現遊戲砂池邊緣粉刷不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.12

工程名稱：112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫



說明

遊戲砂池回填砂現場發現有雜物與石塊等



說明

原有地面之回填土高於混凝土步道情形，造成土方污損混凝土表面。

新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.07.12

工程名稱：112 年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫



木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面 50 公分，沒支撐角鐵發現有鏽蝕情形。

2024/07/12

說明

木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面 50 公分，角鐵發現有鏽蝕情形。



木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面 50 公分，沒有相關防護措施，

2024/07/12

說明

木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面 50 公分，沒有相關防護措施，

新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.07.12

工程名稱：112 年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫



說明

洗腳台頂部抵石子完成面有明顯剝落情形




說明

.混凝土步道新增出口與道路銜接處有 30 公分落差，容易造成使用人跌倒受傷。應妥善處理。

新竹縣政府工程複查代表照片表

拍攝日期：113.07.12

工程名稱：112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫

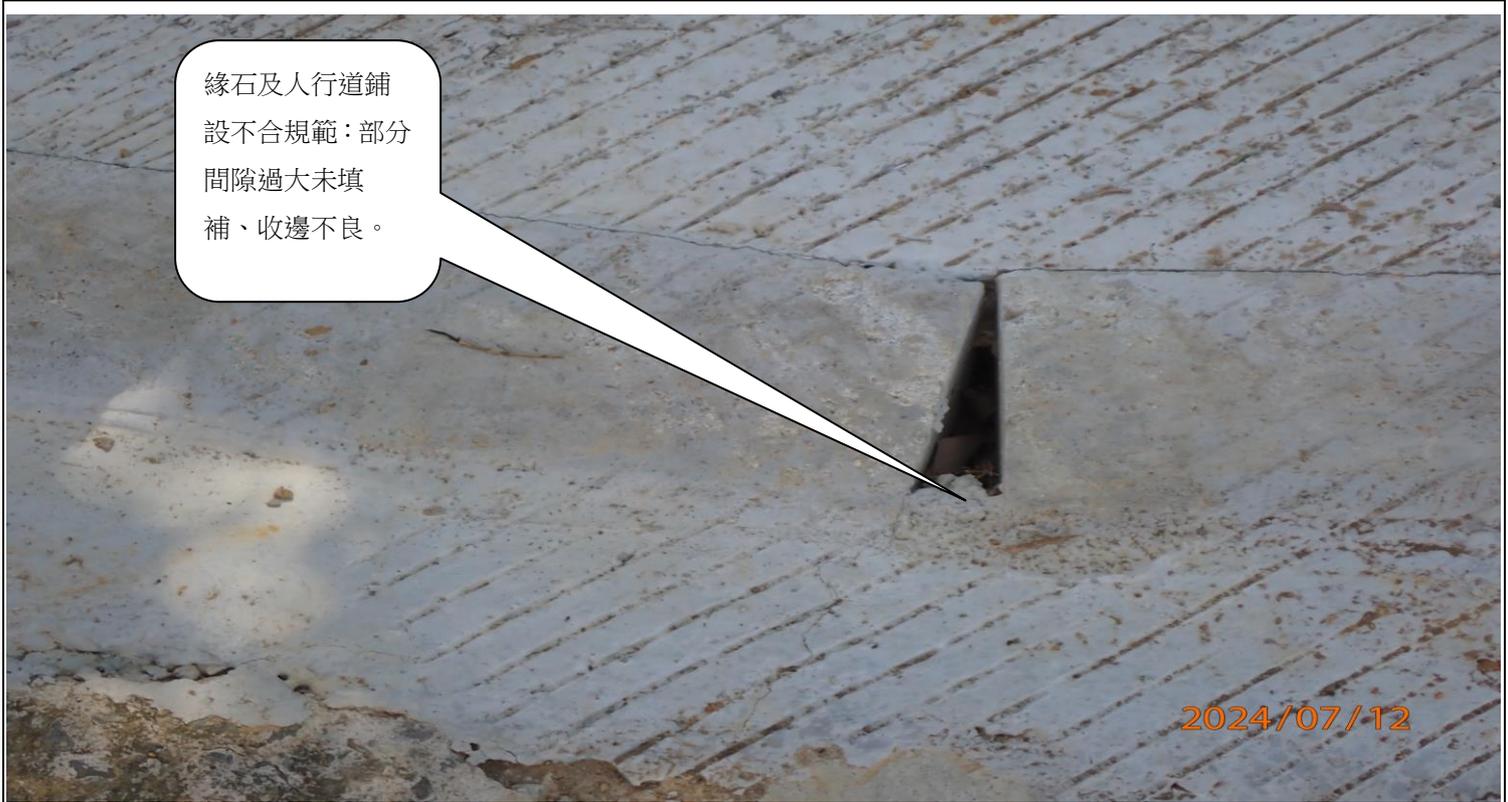

說明

緣石及人行道鋪設不合規範：部分間隙過大未填補、收邊不良。



說明

排水設施（洗腳台落水頭）配置不當請檢討改善。
