

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.22

工程名稱：110 年新竹縣橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

交通標線在巷道、店家廣場入口處左右 10 公尺範圍內應設紅線，以維行車安全。



說明

部分白色標線面有損壞痕跡請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.22

工程名稱：110 年新竹縣橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

現場完成瀝青鋪面平整度不佳。中正路段發現，尤其路面有粒料分離且縱向有少許裂縫，請全段檢查並改善。




說明

中正路段發現，尤其路面有粒料分離且縱向有少許裂縫，請全段檢查並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.22

工程名稱：110 年新竹縣橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程

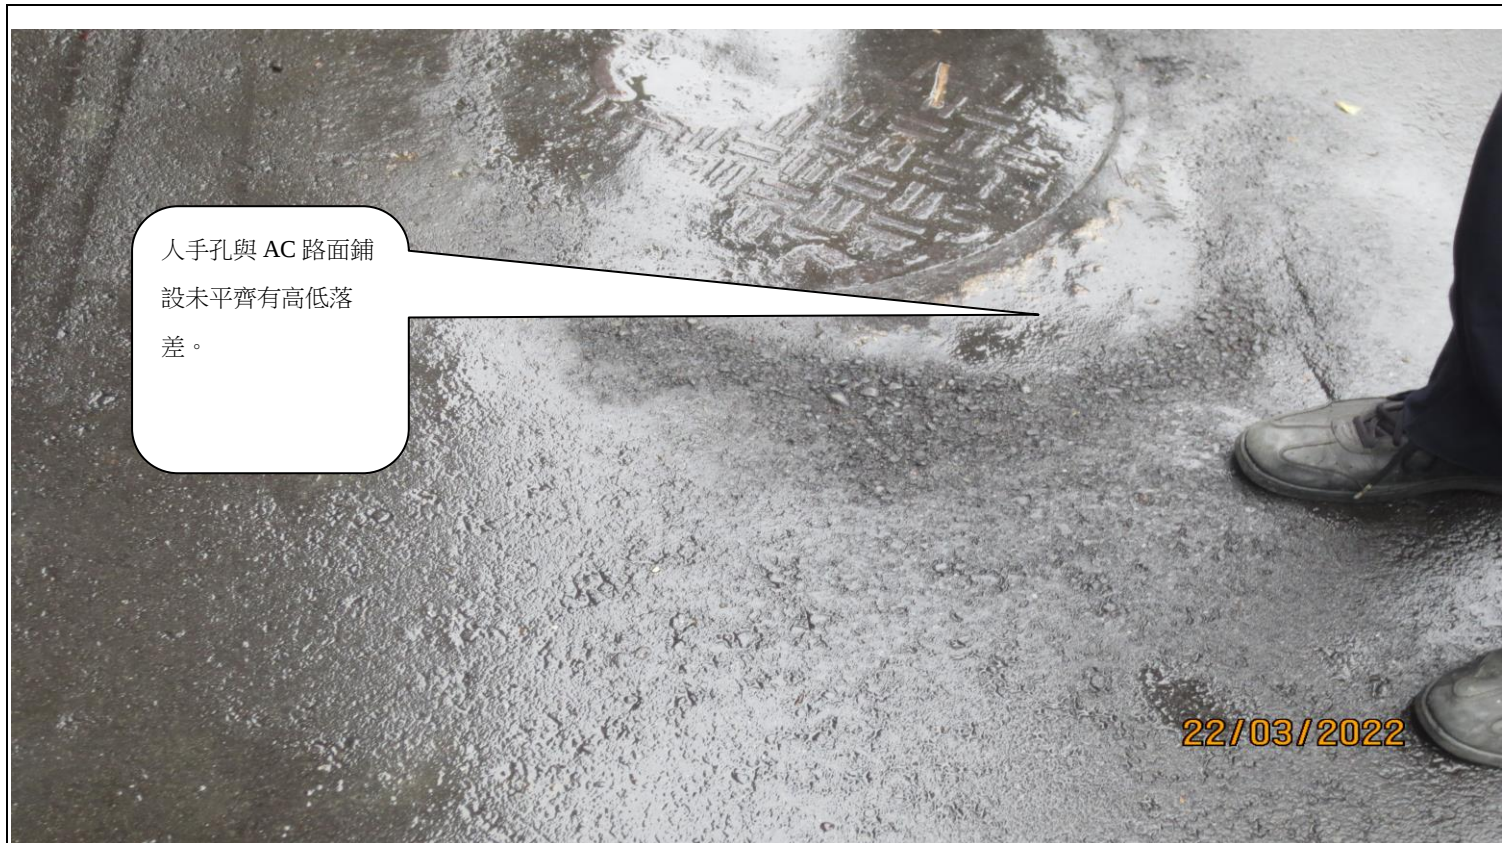

說明

人手孔與 AC 路面鋪設未平齊有高低落差。



說明

施工現場交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：臨溝圳旁設施警告不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.22

工程名稱：110 年新竹縣橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程



說明

11. 路上邊坡有傾斜樹木，欲墜之竹木應清除。



說明

.路邊與路肩有高低落差應整理平順以防車輪陷落及機車行車安全，並整理路肩適當之排水口。
