

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫



說明

部分護岸工程頂部澆置的混凝土有裂縫，側面亦有蜂窩。



說明

水牛意象牆處的地坪混凝土養護有塑性收縮造成裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

護岸部分左岸
0K+730 排水口上方
護欄基座混凝土部分
蜂巢及鐵件未剪除。

29/03/2022

說明

護岸部分左岸 0K+730 排水口上方護欄基座混凝土部分蜂巢及鐵件未剪除

護岸部分左岸 0K+765
河床上尚有固著模板
鐵絲遺留未清除。

29/03/2022


說明

護岸部分左岸 0K+765 河床上尚有固著模板鐵絲遺留未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

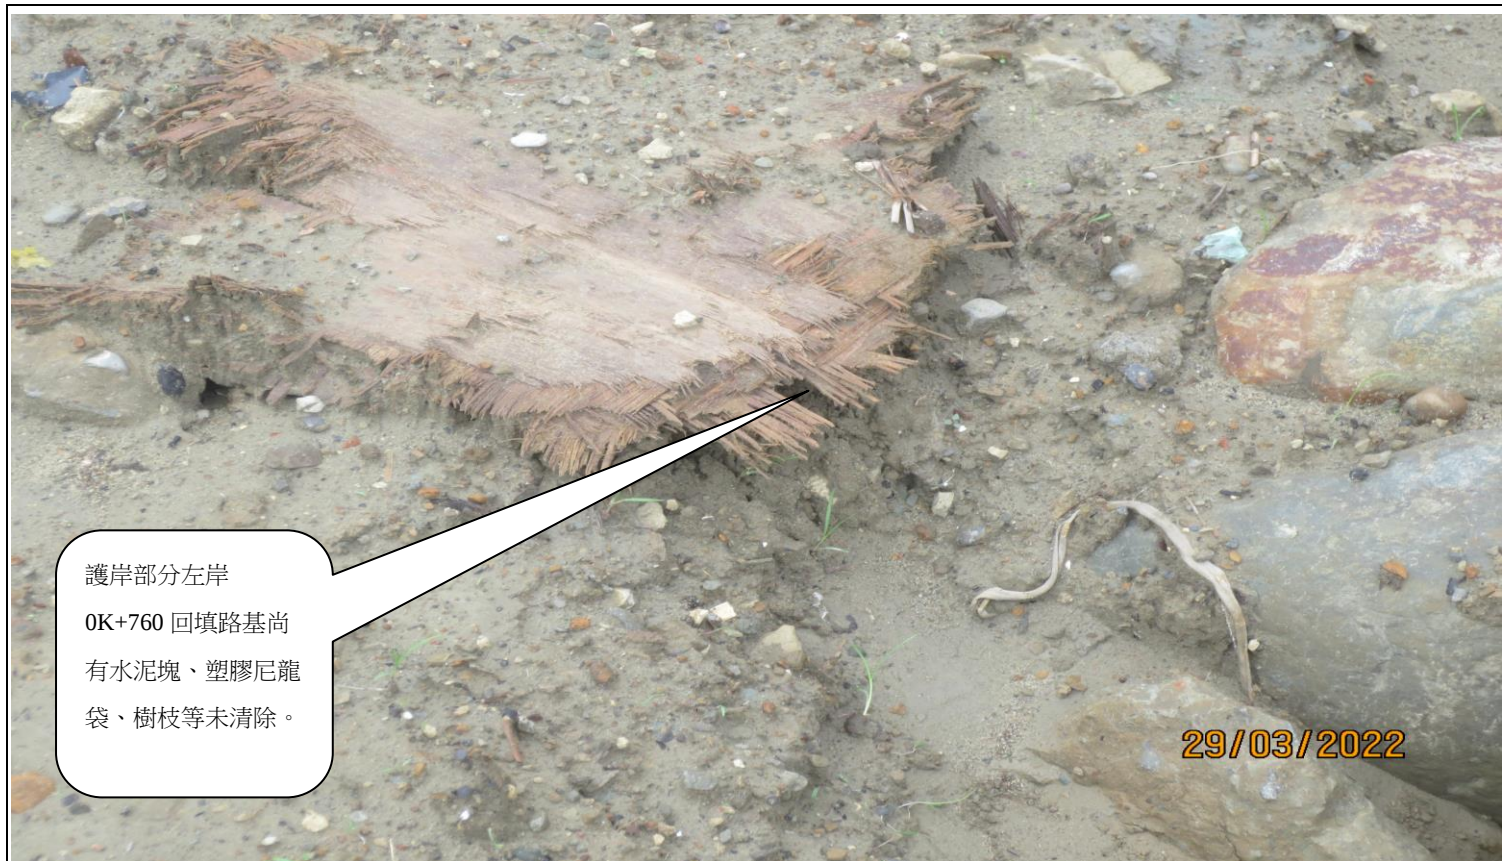

護岸部分左岸

0K+760 回填路基尚有
水泥塊、塑膠尼龍袋、
樹枝等未清除。

29/03/2022

說明

護岸部分左岸 0K+760 回填路基尚有水泥塊、塑膠尼龍袋、樹枝等未清除。



水牛意象區步造底端
(低處)有積水情形及
排入水溝出口未打除。

29/03/2022

說明

水牛意象區步造底端(低處)有積水情形及排入水溝出口未打除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫



說明

護岸部分左岸 0K+690 將切塊石表面尚有混凝土殘渣未清除。



說明

施工機器挖土機未裝設蜂鳴器，警示週遭其他工作人員。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫



說明

水牛意象牆處的工程告示牌完工日期未更正。

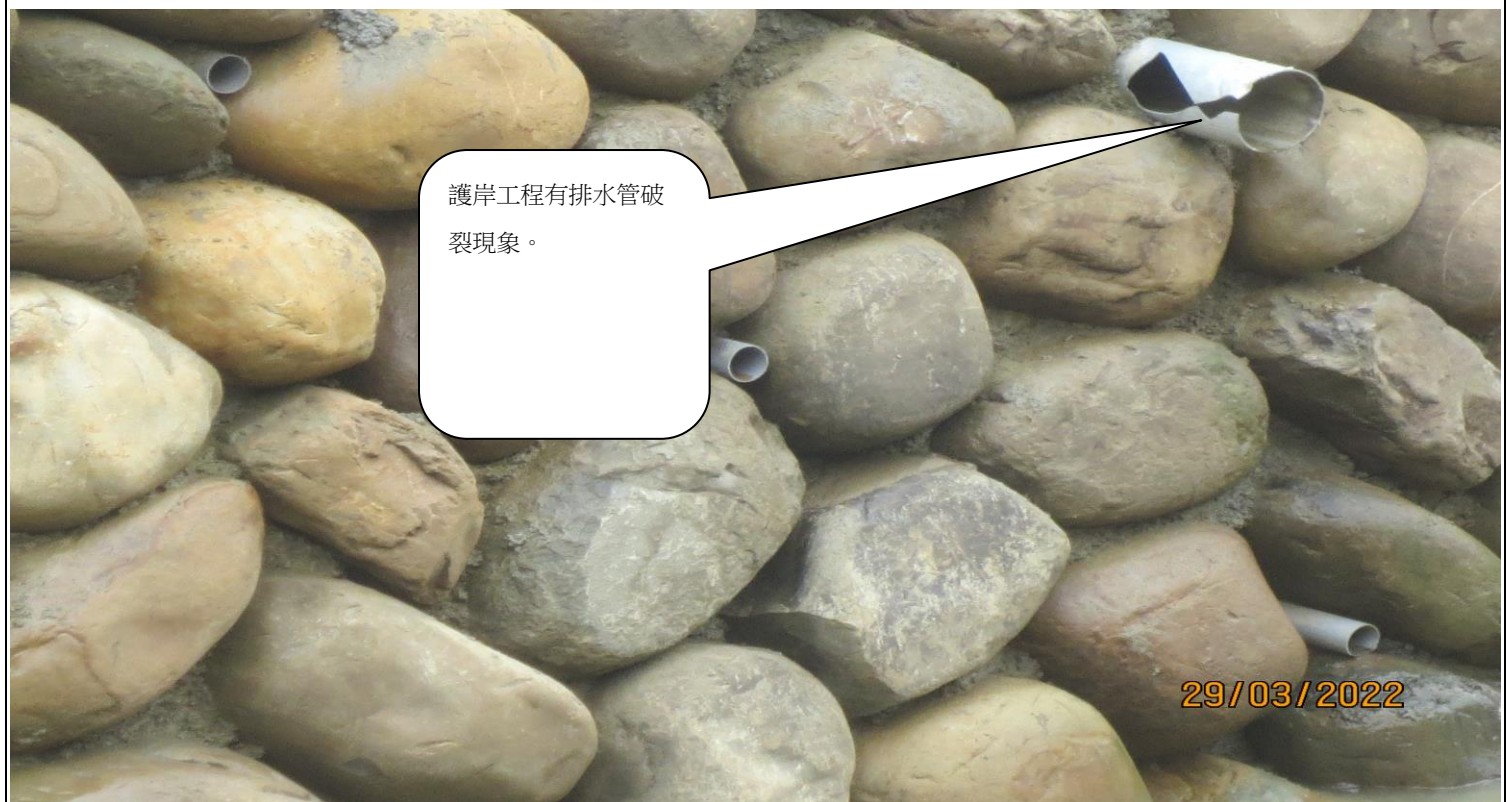

說明

護岸工程有排水管破裂現象。
