

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.17

工程名稱：新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程



說明

C 段尾端水溝版有混凝土澆置有蜂窩產生。




說明

界石伸縮縫留設未與人行道底板相配合。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.17

工程名稱：新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程

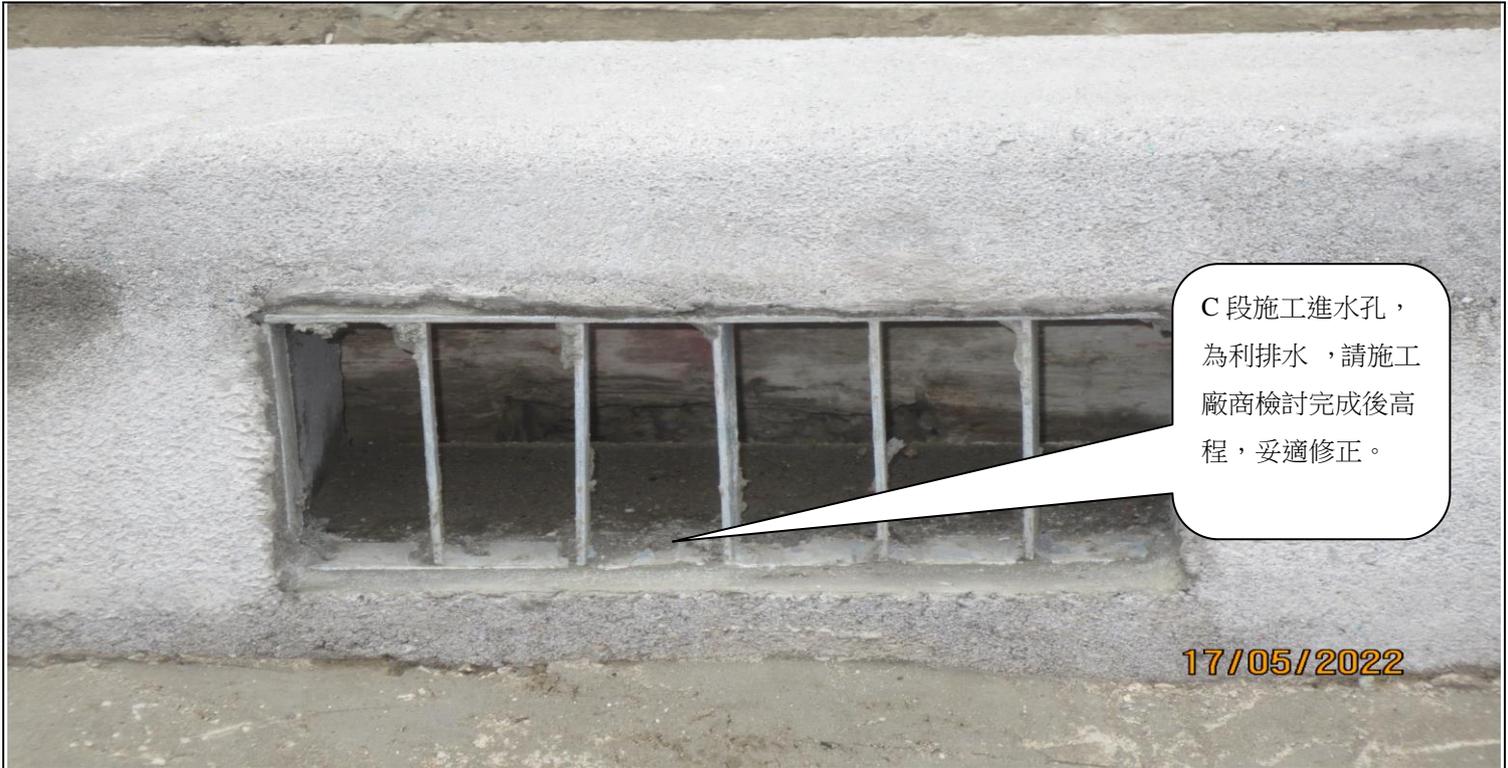

說明

C 段施工進水孔，為利排水，請施工廠商檢討完成後高程，妥適修正。



說明

各工區小部分銜接處，鋪設緣石面(施工面不平順)，請加以改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.17

工程名稱：新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程



緣石、人行道界石  
完成面有破損情形。

17/05/2022

說明

緣石、人行道界石完成面有破損情形。



工程告示牌之  
QR-code 應更新為行  
動版通報網址  
QR-code。

17/05/2022

說明

工程告示牌之 QR-code 應更新為行動版通報網址 QR-code。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.17

工程名稱：新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程



說明

路燈基座螺栓突出未加帽套等防護措施。



說明

人行道無障礙斜坡道之坡度及警示磚、定位磚位置應於鋪設前，需再詳予檢視，以免不當施工，延宕工期。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.17

工程名稱：新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程



說明

界石伸縮縫留設未與人行道底板相配合。



說明

C段部份路燈基座殘留混凝土殘渣，請清除。
