

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23.

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程

混凝土澆置表面高低不平、有弧形。

說明

混凝土澆置表面高低不平、有弧形。


地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。

說明	地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。
----	-----------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程

	
說明	地樑箍筋排列間距不整齊。



鋼軌樁中間之擋板為6分板，而夾板過雨水會膨脹，擋土效果不良。

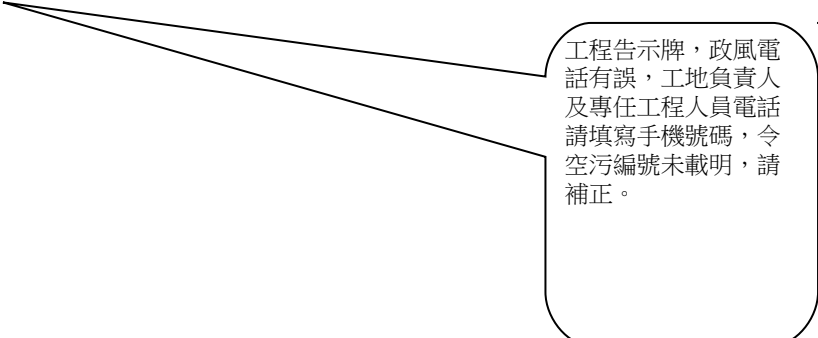
說明

鋼軌樁中間之擋板為6分板，而夾板過雨水會膨脹，擋土效果不良。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23.

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程

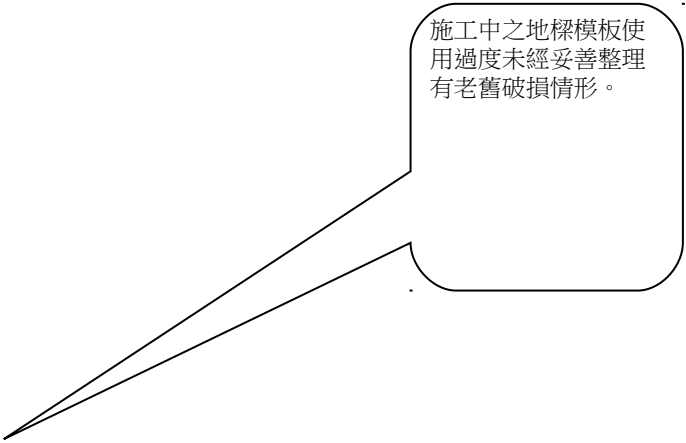


工程告示牌，政風電話有誤，工地負責人及專任工程人員電話請填寫手機號碼，令空污編號未載明，請補正。


說明	工程告示牌，政風電話有誤，工地負責人及專任工程人員電話請填寫手機號碼，令空污編號未載明，請補正。
	
說明	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工中之地樑高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備及防墜措施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23.
工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程



施工中之地樑模板使用過度未經妥善整理有老舊破損情形。

說明	施工中之地樑模板使用過度未經妥善整理有老舊破損情形。
 因工地在市區，夜間照明及警告設施應加強。	
說明	因工地在市區，夜間照明及警告設施應加強。
