


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.25

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程

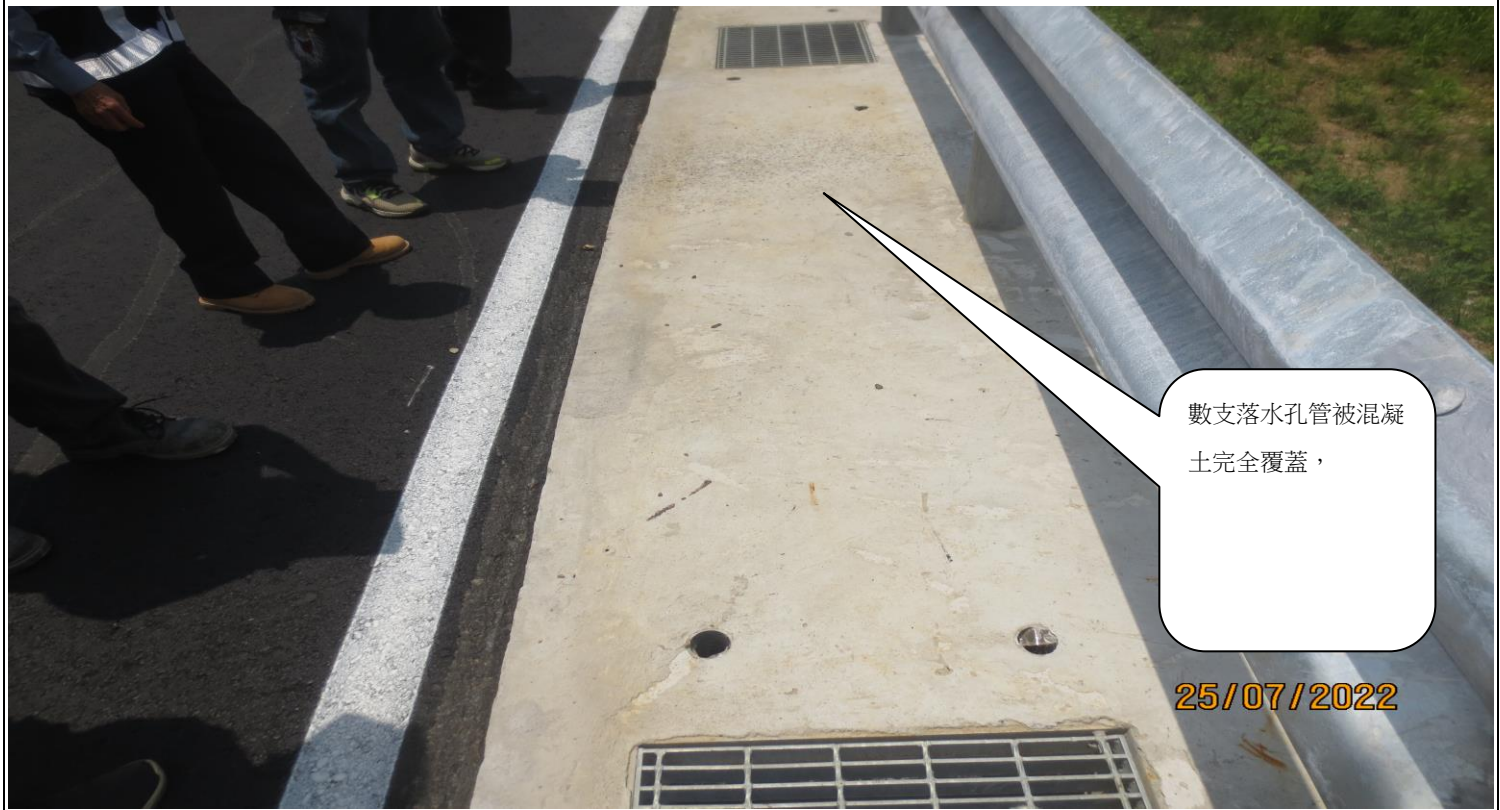


數支落水孔管被混凝土完全覆蓋，

25/07/2022

說明

3K+780 至 3K+940 路段右邊路側之 $\phi 5\text{cm}$ 垂直落水孔有設置不當情形，包括數支落水孔管被混凝土完全覆蓋，顯示 PVC 套管有陷落或側溝蓋板不平整造成，以及落水孔位置發生錯位不整齊一致情形。

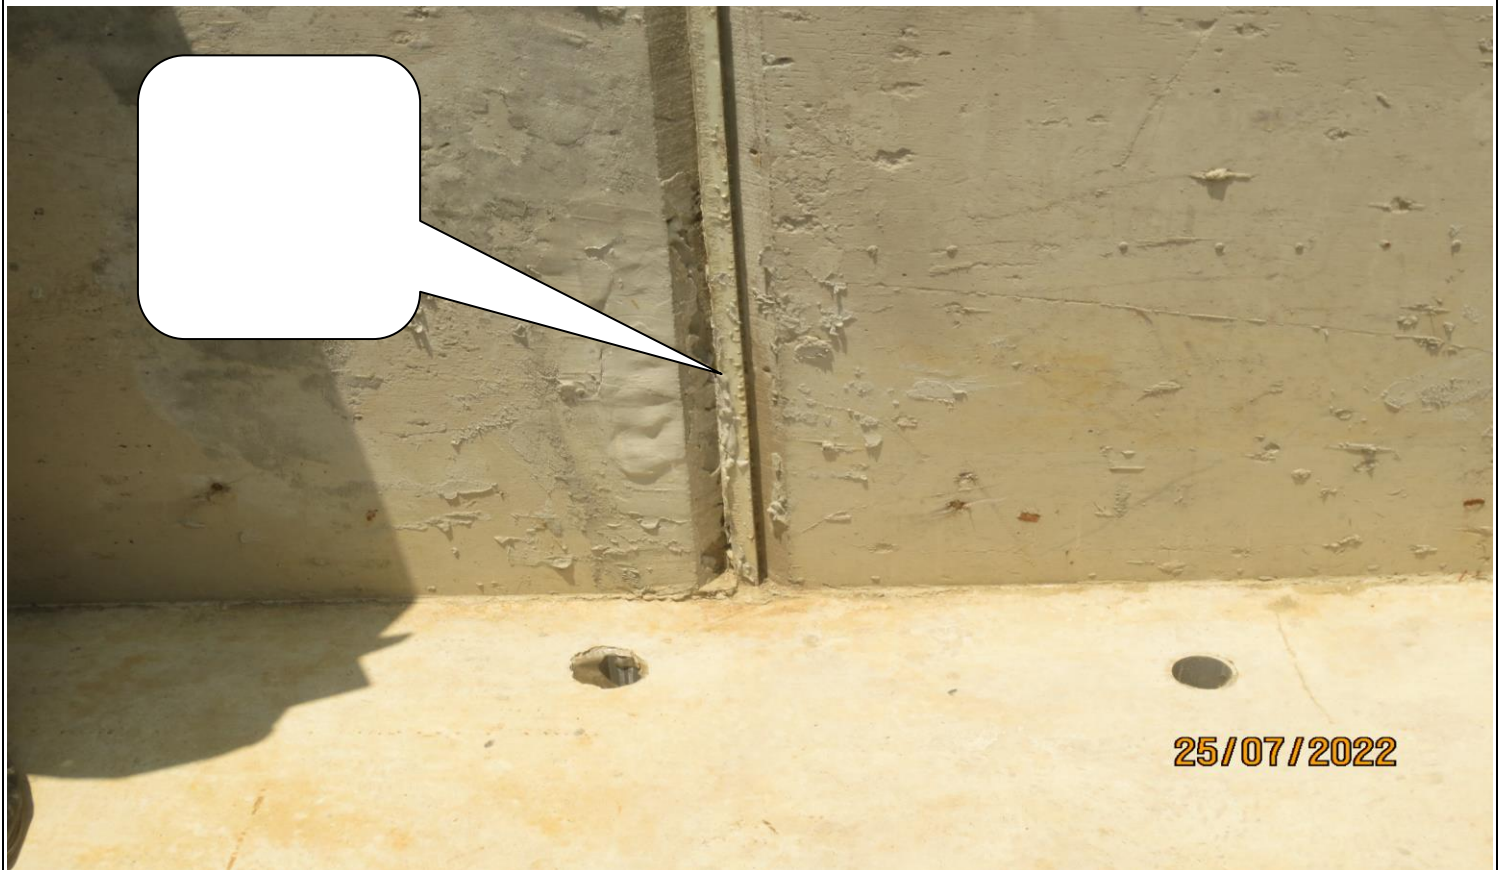

25/07/2022

說明

3K+780 至 3K+940 路段右邊路緣側壁之混凝土表面殘留雜物、混凝土冷接縫縫痕不整齊及凹孔面等不美觀缺失

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.07.25

工程名稱：新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹 43 線(3K+695 至 6K+000 段)拓寬工程



說明

3K+780 至 3K+940 路段右邊路緣側壁之頂部倒角(三角形截角)不平順。



說明

請加強兩端指揮人力，尤其兩端無法通視更宜增加無線對講通訊以利控管，避免發生意外事故
