

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.19

工程名稱：111年湖口鄉中興村公園旁排水溝(鐵騎橋\_永安橋)改善工程



工程告示牌 QR Code 不符規定，專任工程人員、工地負責人未留設行動電話，主辦機關鄉公所未有英譯。

說明	工程告示牌 QR Code 不符規定，專任工程人員、工地負責人未留設行動電話，主辦機關鄉公所未有英譯。
----	---



混凝土箱涵 0k+80 頂版澆置養護不合規範，塑性收縮造成多條裂縫。

說明	混凝土箱涵 0k+80 頂版澆置養護不合規範，塑性收縮造成多條裂縫。
----	------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.19

工程名稱：111 年湖口鄉中興村公園旁排水溝(鐵騎橋\_永安橋)改善工程



混凝土箱涵終端附近側牆表面，鐵絲、螺桿殘留物未清除。

19/10/2022

說明

混凝土箱涵終端附近側牆表面，鐵絲、螺桿殘留物未清除。



箱涵與鋼軌樁間回填料，間雜有廢輪胎、鋼筋廢料、垃圾未清理。

19/10/2022


說明

箱涵與鋼軌樁間回填料，間雜有廢輪胎、鋼筋廢料、垃圾未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.10.19

工程名稱：111年湖口鄉中興村公園旁排水溝(鐵騎橋\_永安橋)改善工程

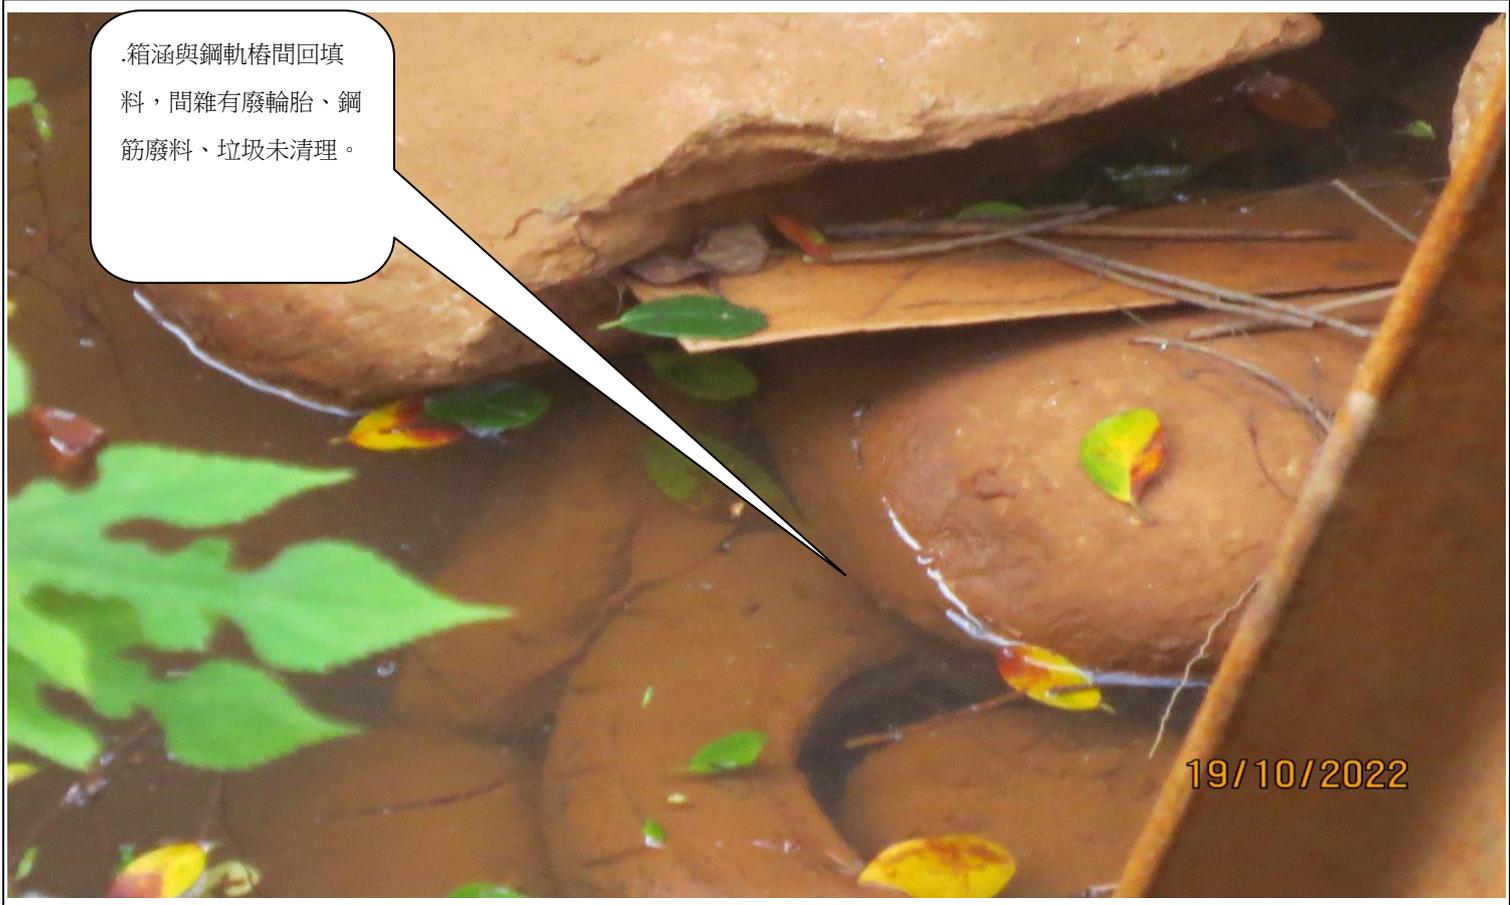

說明

箱涵與鋼軌樁間回填料，間雜有廢輪胎、鋼筋廢料、垃圾未清理。

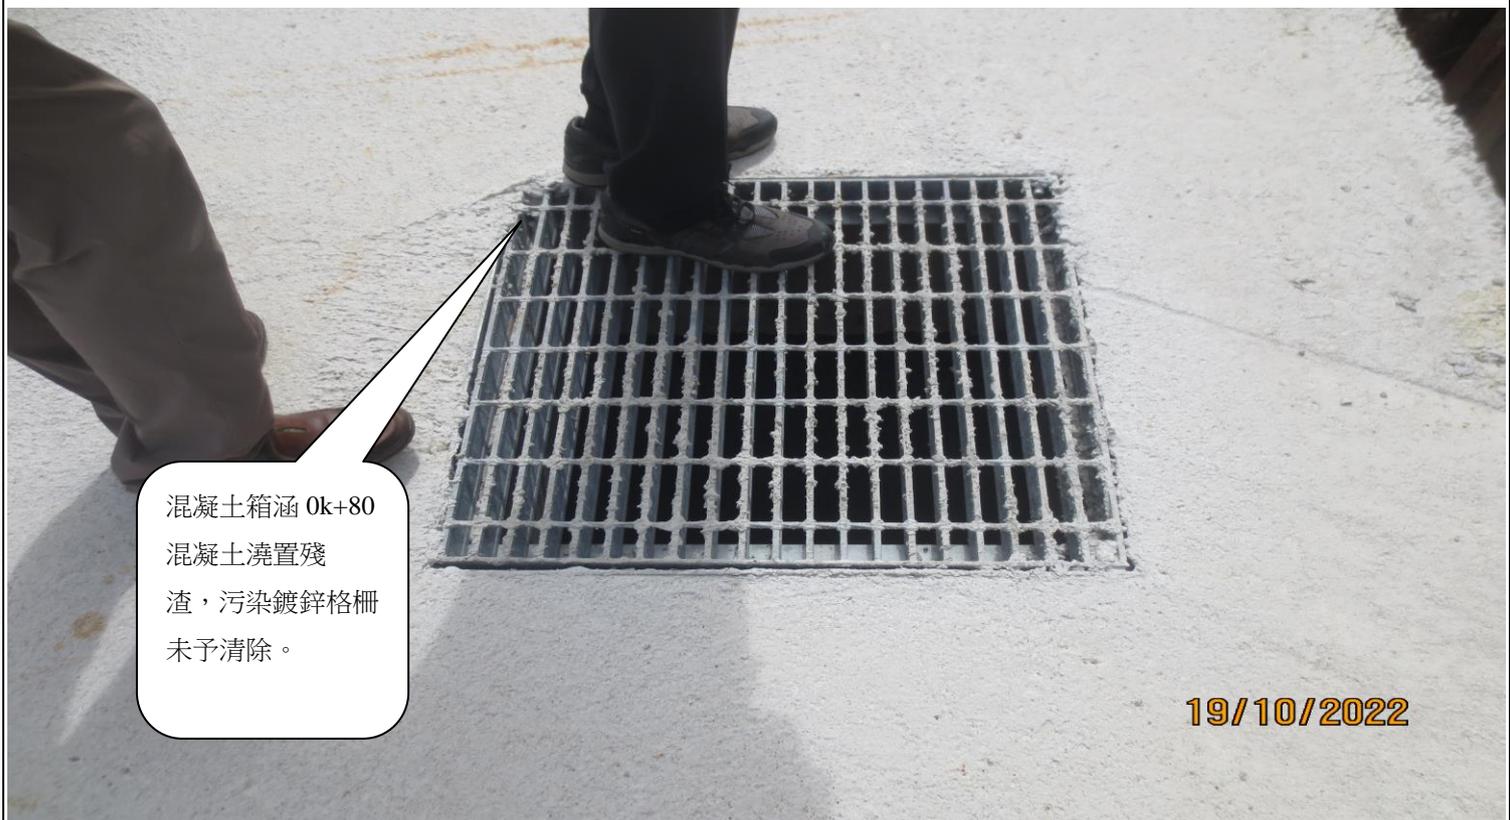

說明

混凝土箱涵 0k+80 混凝土澆置殘渣，污染鍍鋅格柵未予清除。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.19

工程名稱：111 年湖口鄉中興村公園旁排水溝(鐵騎橋\_永安橋)改善工程



說明

工地現場施工終點緊臨永安橋端，未設工程圍籬、與中興公園交界之圍籬有缺口及未固定之圍籬)



說明

工地現場施工終點緊臨永安橋端，未設工程圍籬、與中興公園交界之圍籬有缺口及未固定之圍籬)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.19

工程名稱：111 年湖口鄉中興村公園旁排水溝(鐵騎橋\_永安橋)改善工程



說明

於高差 2 公尺以上之場所邊緣，未設置符合規定之護欄。(箱涵旁，尚未回填土方處現場發現)



說明

建議從橋樑底改為漸變段，讓橋底與已完成箱涵是順坡銜接，以利排水。
