

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程

魚池邊地坪伸縮縫，
未與護岸 0K+060 伸縮
縫對齊且伸縮縫在地
坪上未切割。

13/02/2023

說明

魚池邊地坪伸縮縫，未與護岸 0K+060 伸縮縫對齊且伸縮縫在地坪上未切割。

0K+050 至 0K+090
處混凝土護欄已減
項未施作，該處混
凝土護岸頂部未依
護欄施作截角。


13/02/2023

說明	0K+050 至 0K+090 處混凝土護欄已減項未施作，該處混凝土護岸頂部未依護欄施作截角。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程

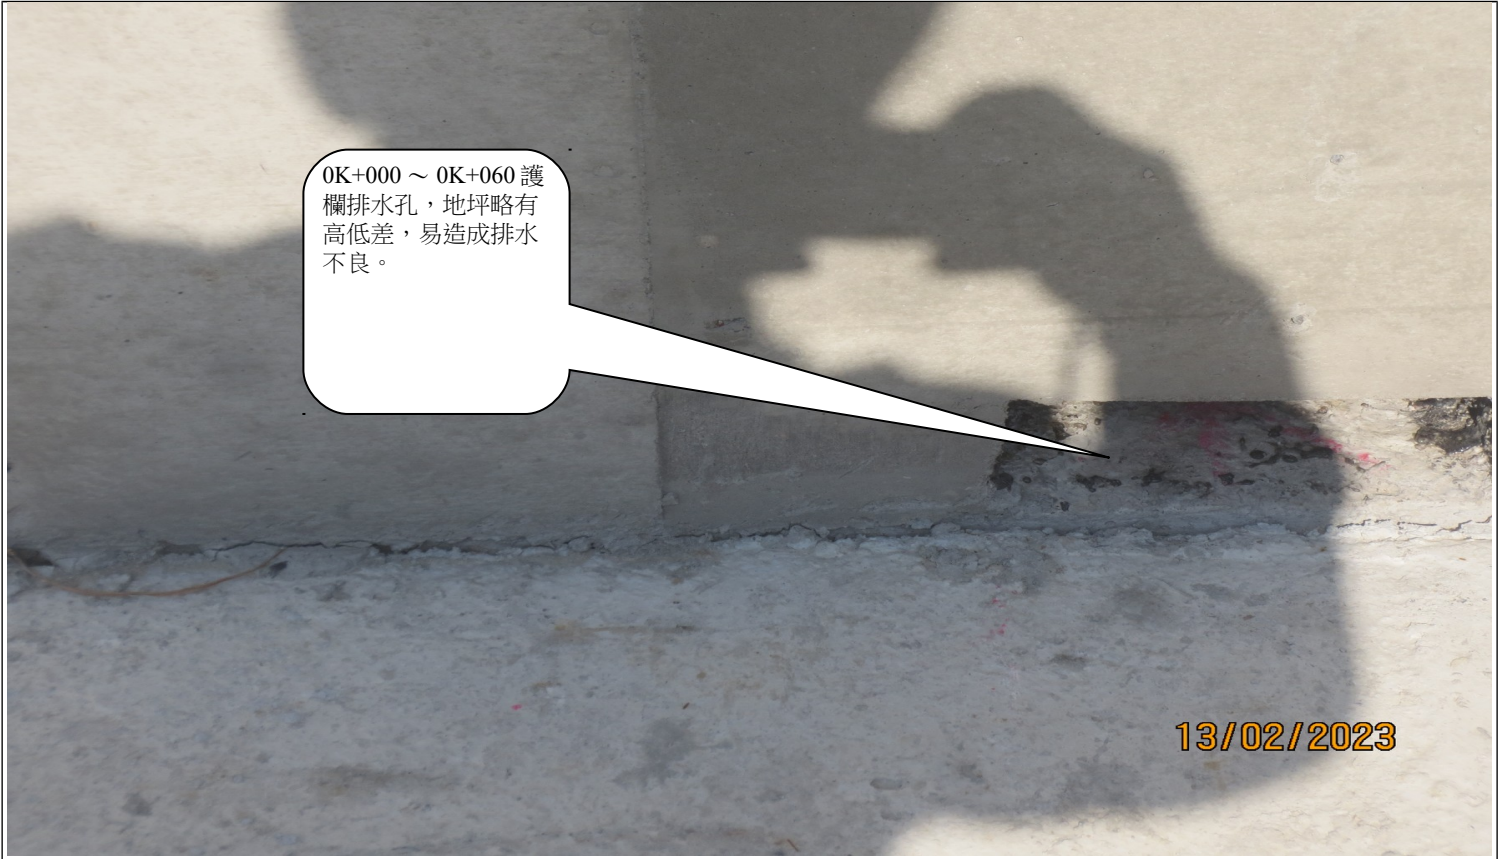

0K+000 ~ 0K+060 護欄排水孔，地坪略有高低差，易造成排水不良。

13/02/2023

說明	0K+000~0K+060 護欄排水孔，地坪略有高低差，易造成排水不良。
----	--------------------------------------

新竹縣北埔鄉公所			
工程名稱 (Project Name)		埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程	
監造單位 (Construction Supervisor)		問有限公司	設計單位 (Designer) 東和工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)		限公司	工程概要 (Project Description) 混凝土護岸
施工期間 (Duration)		日至民國112年3月13日止 (14/1/2022 ~ 13/3/2022)	
工地主任或工地負責人 (Site Manager)		彭賜皓	電話 (TEL) 0978-467-396
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)		范為善	電話 (TEL) 035802864
通報專線 (Complaints & Suggestions)		全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address) 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
		政風單位 (Government Ethics Department) 03-580-2204	
經費來源 (Budgetary Sources)		1. 中央: _____ (千元) (Unit: NT\$1,000) 1. 地方: 899 _____ (千元) (Unit: NT\$1,000)	
重要公告事項 (Notice)		1. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D) 2. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)	

工程告示牌 QR Code 不符需求，專任工程人員未記載行動電話資料。

13/02/2023

說明	工程告示牌 QR Code 不符需求，專任工程人員未記載行動電話資料。
----	-------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程



材料暫存區無夜間警告燈。

13/02/2023

說明	材料暫存區無夜間警告燈。
	
說明	護岸 OK+000 收尾工與即有土岸銜接處建議以土包袋加強保護。
