

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程



說明

1k+240 混凝土路面刷毛完成面局部乾縮裂縫。



說明

1k+360, 1k+400 混凝土路面工程地坪伸縮縫未延伸至路肩，施作不當。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程



說明

1k+360，1k+400 混凝土路面工程地坪伸縮縫未延伸至路肩，施作不當。




說明

1K+573 左側護欄基礎有夾板未拆除。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程

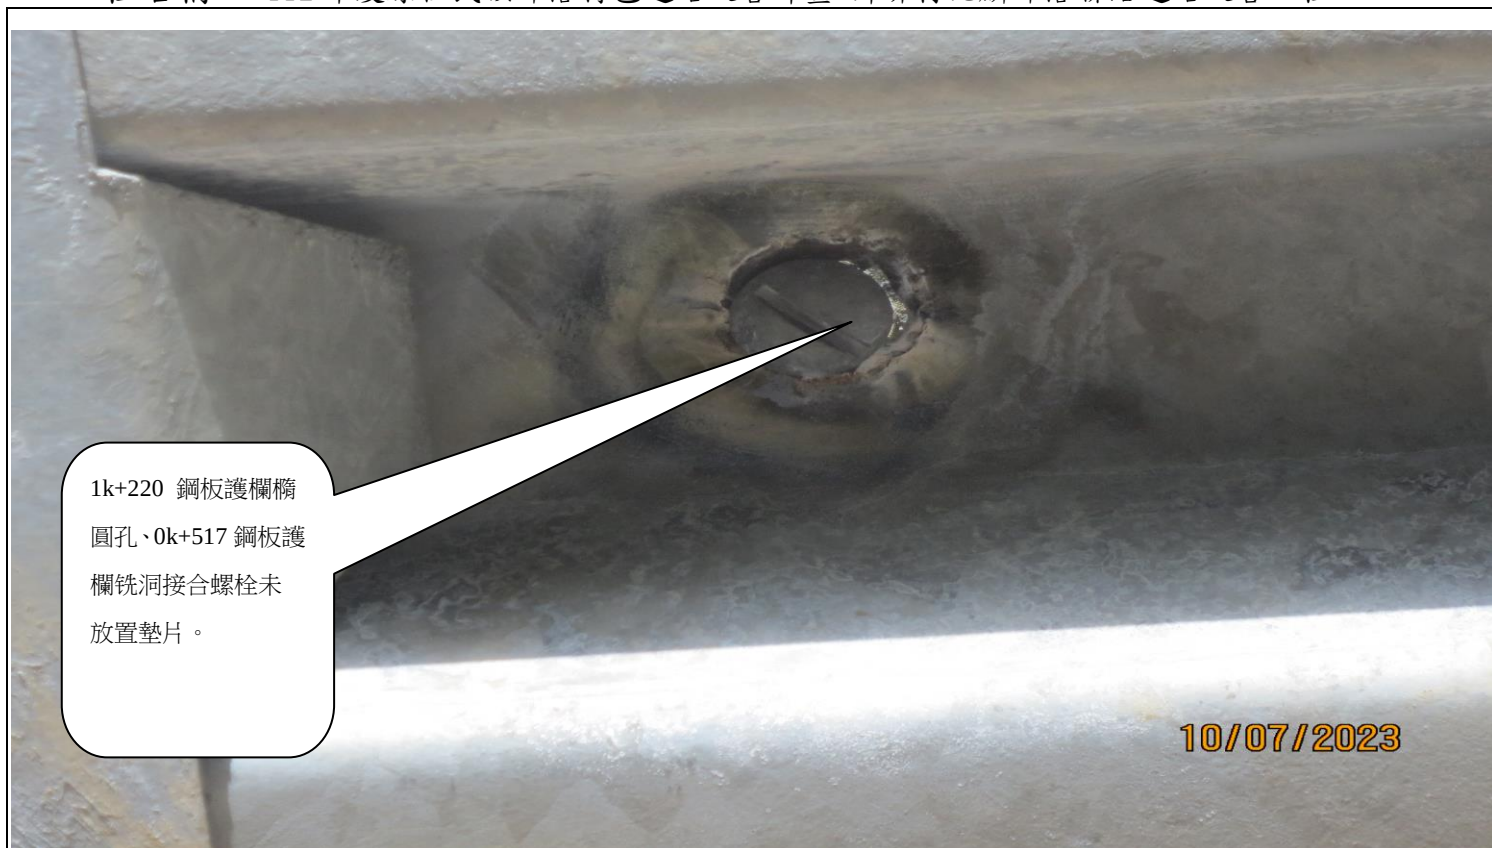

說明

1k+220 鋼板護欄橢圓孔、0k+517 鋼板護欄銑洞接合螺栓未放置墊片。

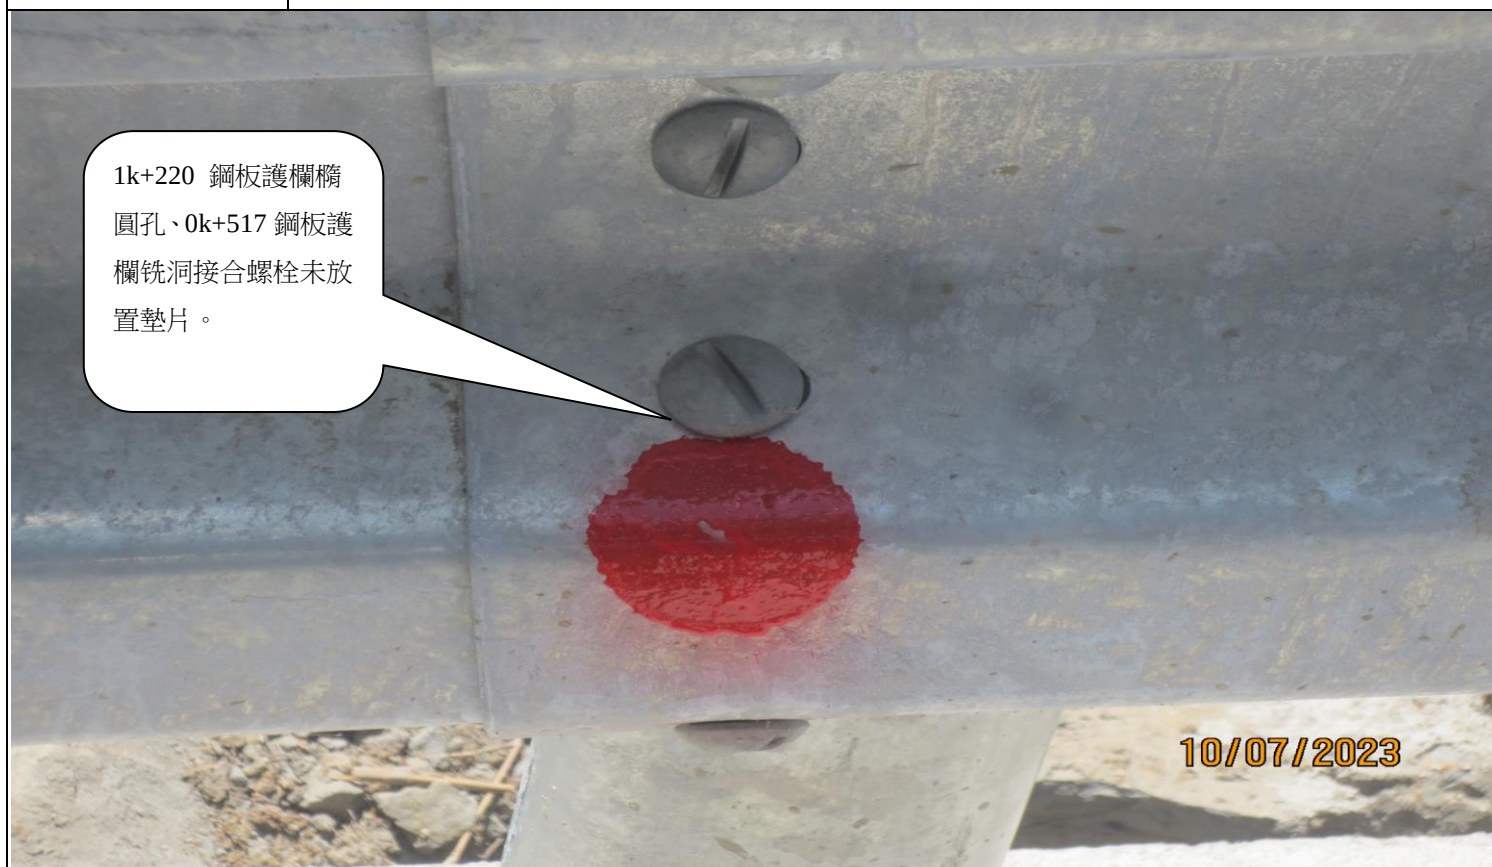

說明

1k+220 鋼板護欄橢圓孔、0k+517 鋼板護欄銑洞接合螺栓未放置墊片。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程



說明

1k+620~1k+650 路肩回填土含樹根雜物且未夯實。



說明

1k+620~1k+650 路肩回填土含樹根雜物且未夯實

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程



說明

1k+204 鋼板護欄頂端、鍍鋅表面不均勻。

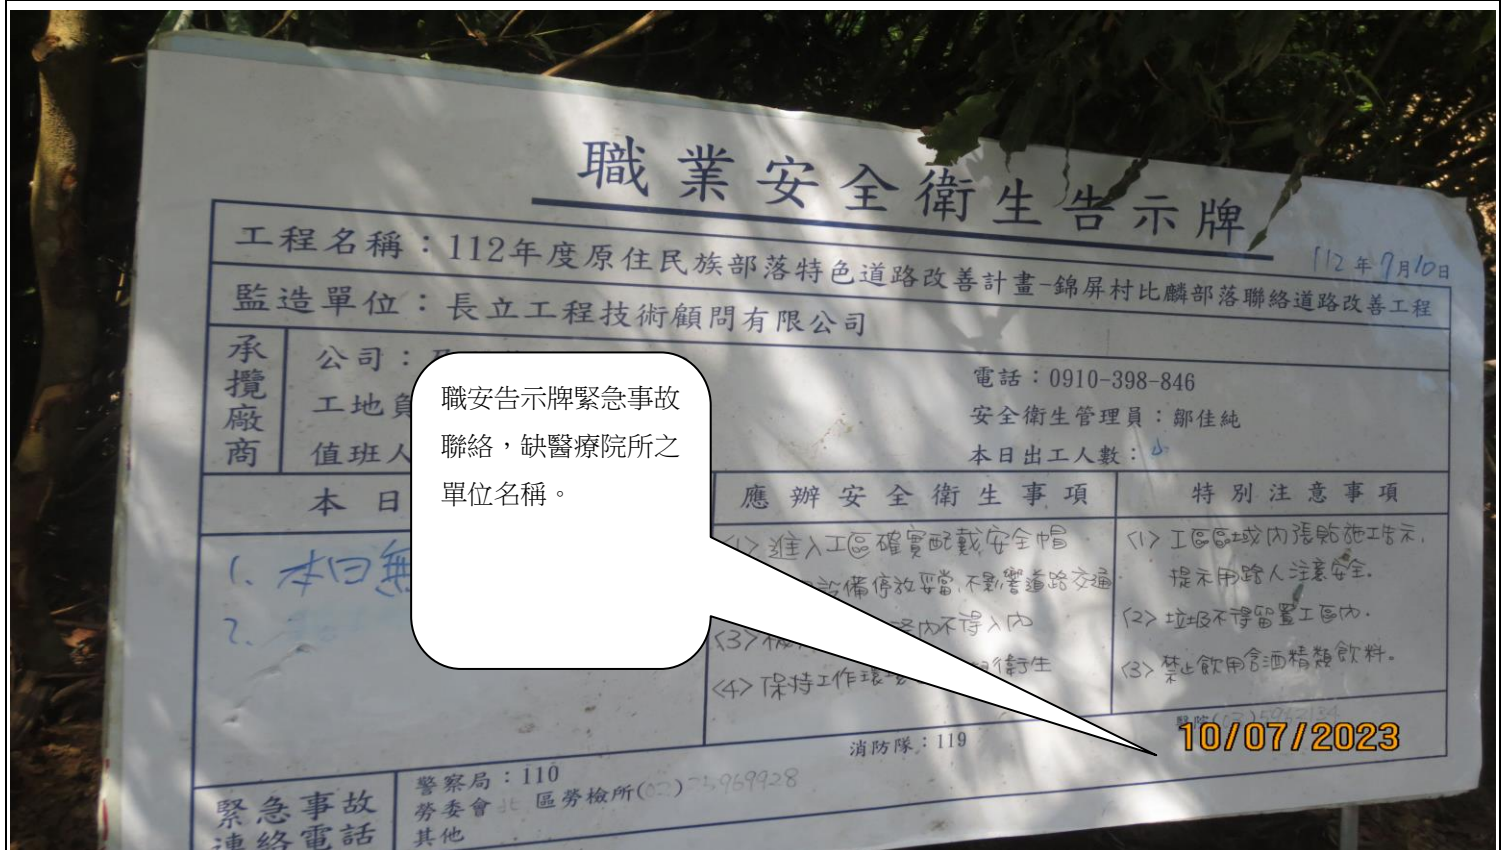

說明

職安告示牌緊急事故聯絡，缺醫療院所之單位名稱。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.10

工程名稱：112 年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程



說明

1k+420 右側土溝以土堤分流降低排水量，建議就地取材以石塊堆疊設置溢流口，以減少土壤流失。

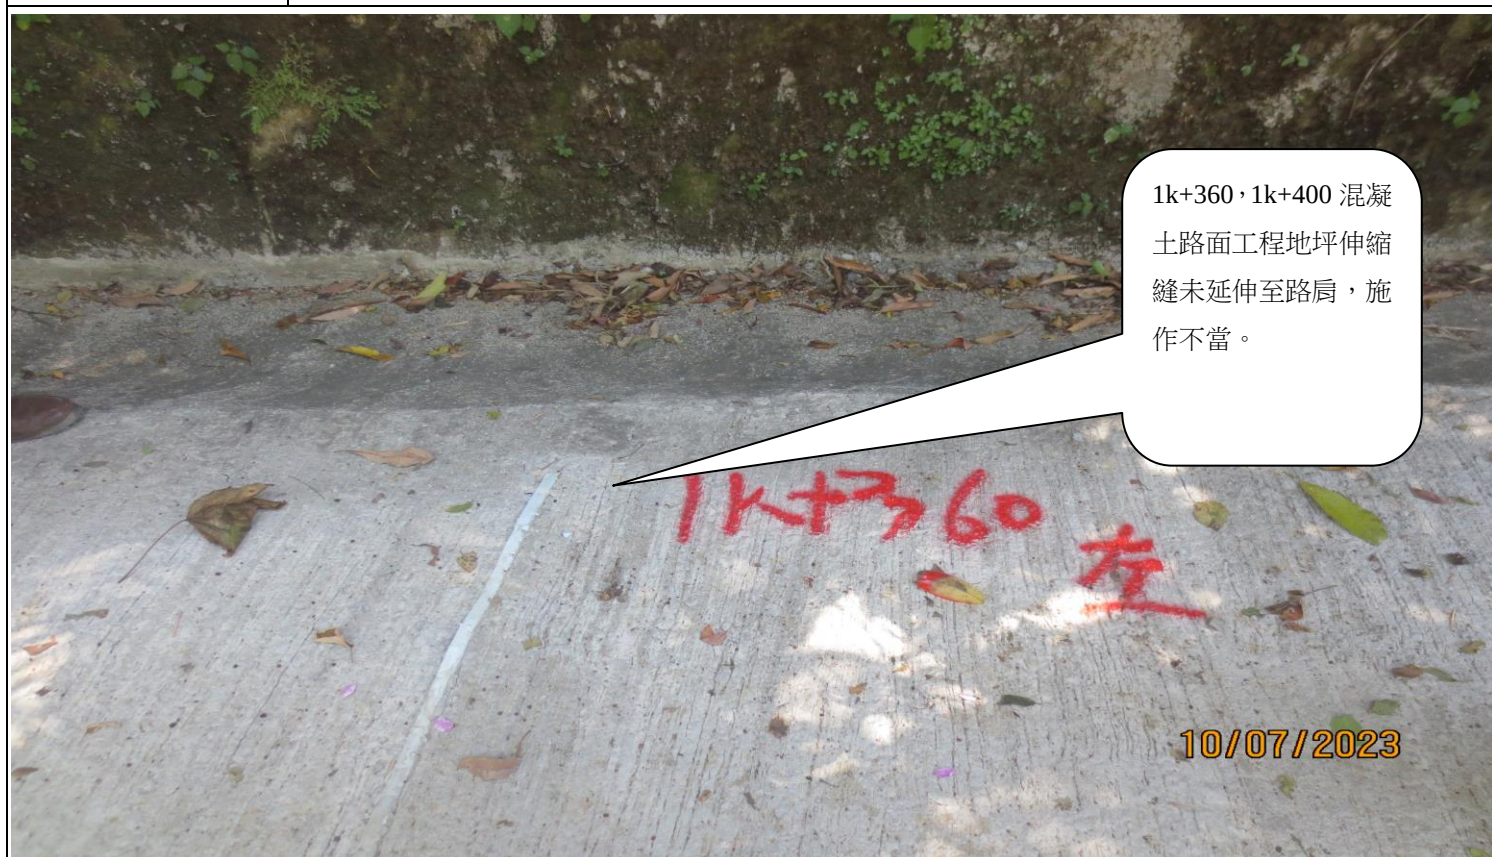

說明

1k+360，1k+400 混凝土路面工程地坪伸縮縫未延伸至路肩，施作不當。
