

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.12

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



屋頂圓柱造型混凝土
有部分收縮裂縫。

12/07/2023

說明

屋頂圓柱造型混凝土有部分收縮裂縫。



施工中樓層地面有四
處丟棄之煙蒂，未劃
設或管制吸煙區。

12/07/2023

說明	施工中樓層地面有四處丟棄之煙蒂，未劃設或管制吸煙區。
----	----------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.12

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



說明	樓梯梯級之金屬扶手垂直托架底座之錨定螺絲，有部分螺絲之鑽孔位置過於接近梯級邊梁致使梯級邊梁破損。
----	--




說明	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞，不利拉線或排水。
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.12

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

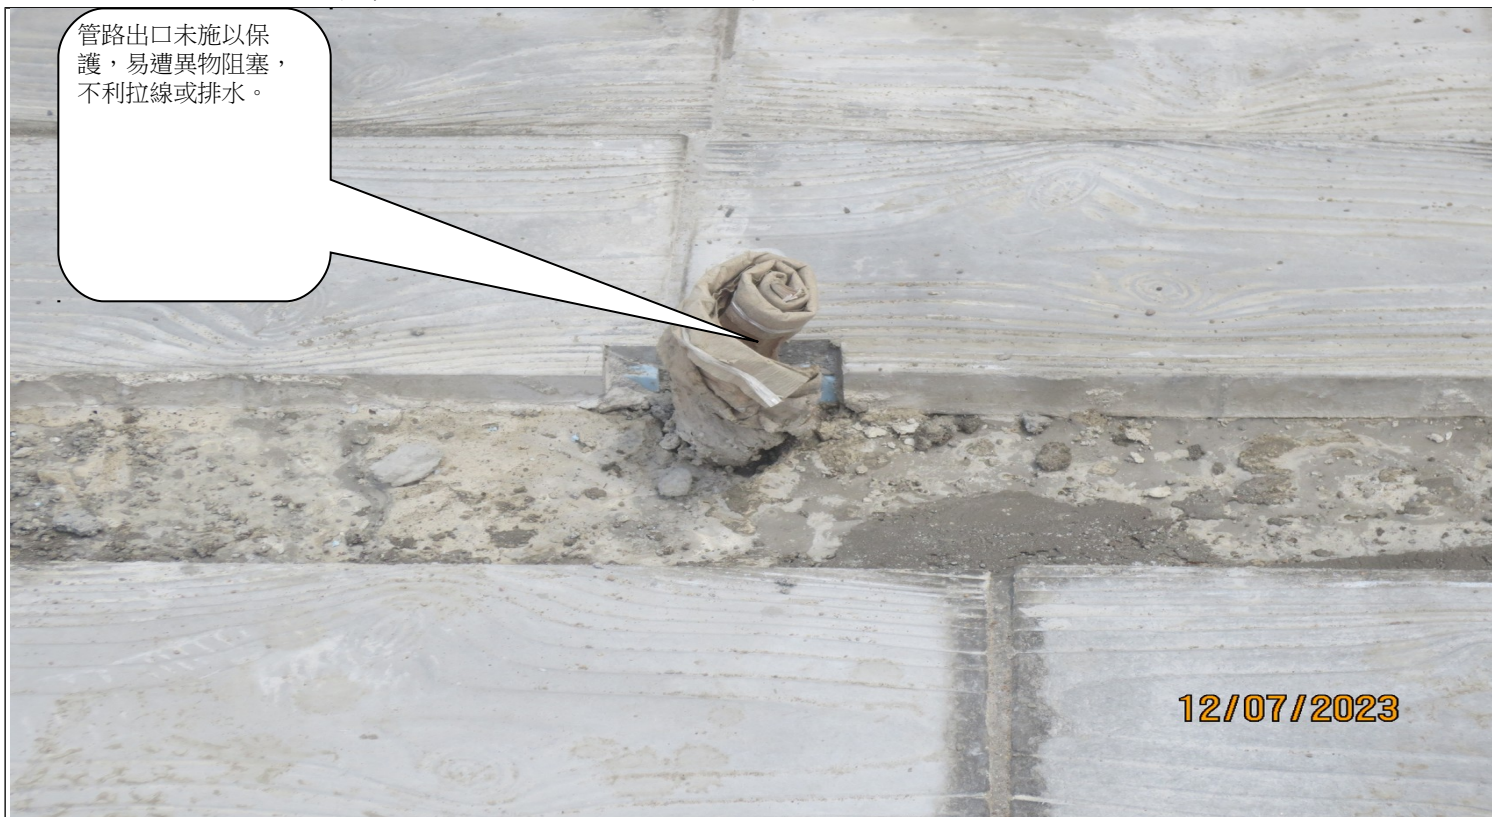

說明	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞，不利拉線或排水。
----	---------------------------

校舍樓梯抵石子邊牆之裝飾邊條於邊牆轉折處未予以貫通成連續線條而不美觀。

12/07/2023

說明

校舍樓梯抵石子邊牆之裝飾邊條於邊牆轉折處未予以貫通成連續線條而不美觀。
