

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程




完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。

25/09/2023

說明

完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。

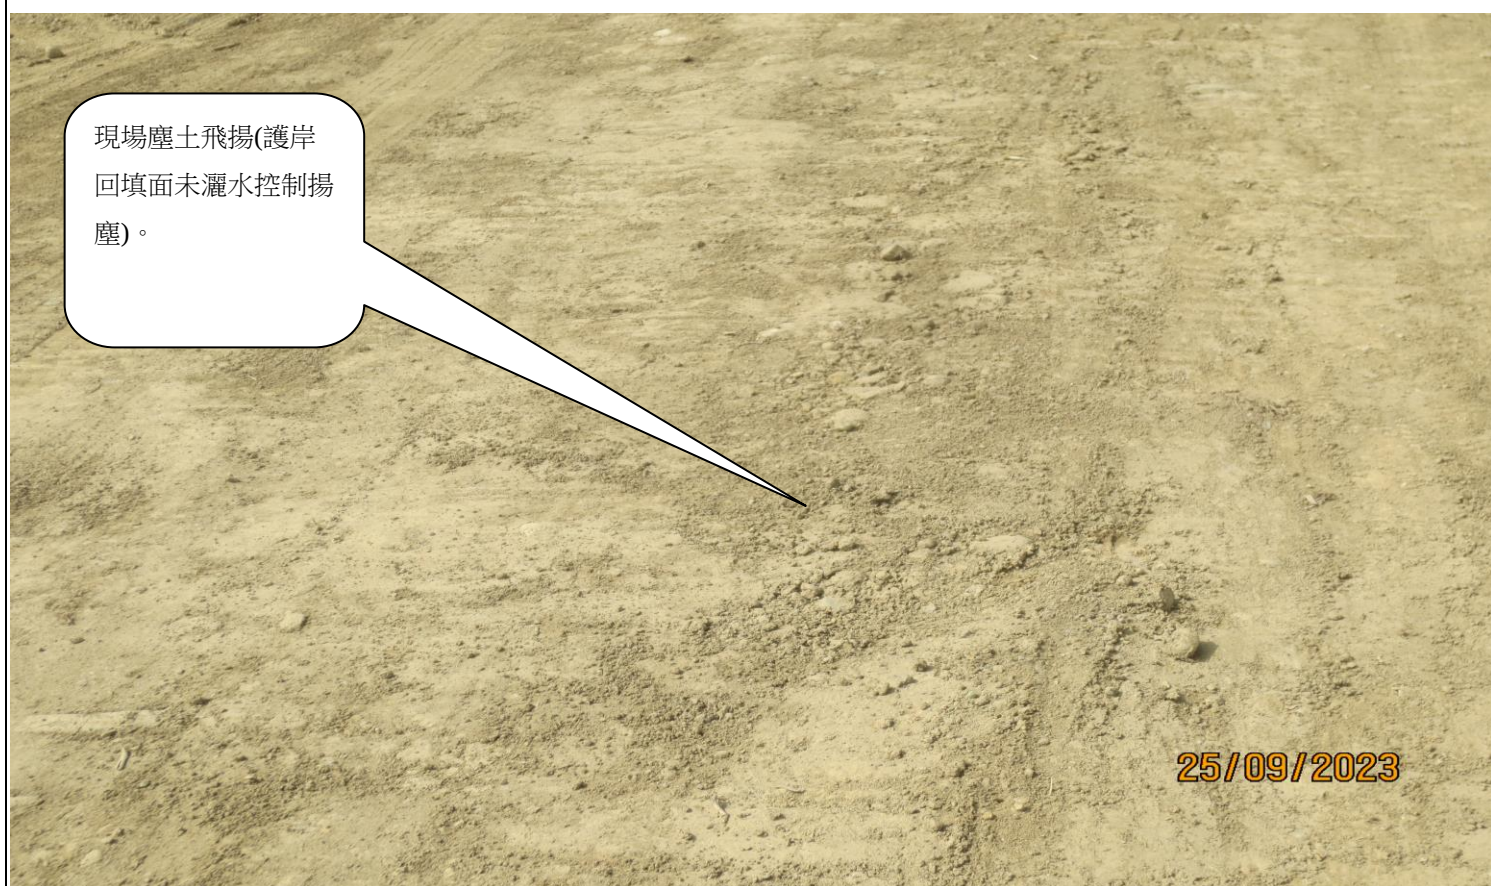

現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。

25/09/2023

說明

現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程

混凝土平整度不佳
(護岸背面約 1k+540
處平整度不佳或表
面粗糙)。

25/09/2023

說明

混凝土平整度不佳(護岸背面約 1k+540 處平整度不佳或表面粗糙)。

施工現場交通警告等
設施不足(施工現場
入口夜間交維警示不
足)。

25/09/2023

說明

施工現場交通警告等設施不足(施工現場入口夜間交維警示不足)。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程



說明

護岸尾端 1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。

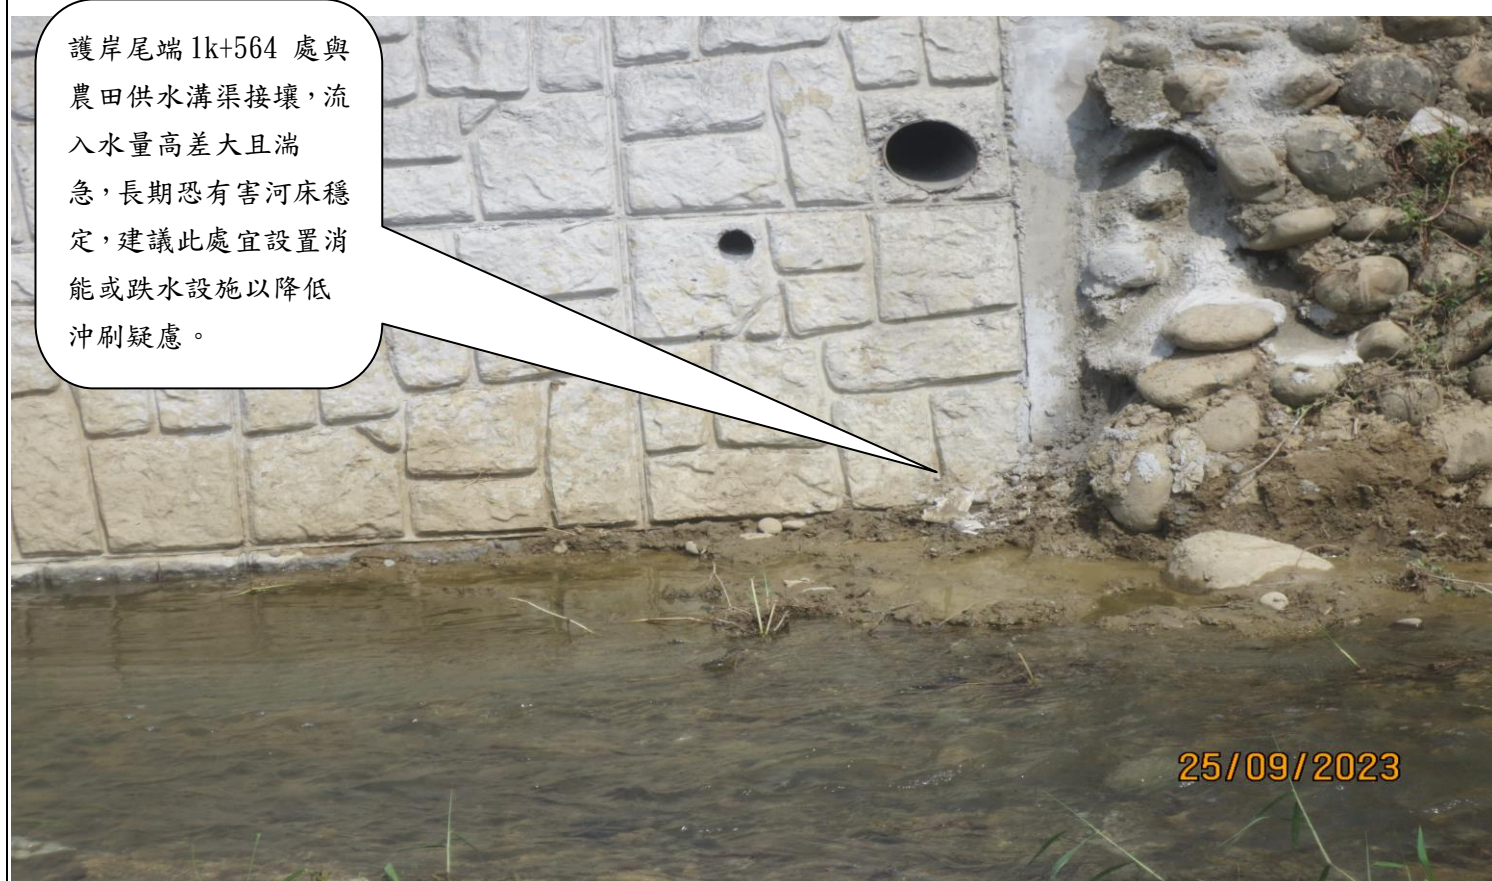

說明

護岸尾端 1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程



說明

工地出入口應有門禁管制措施。。

說明
