

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程



說明

完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。



說明	現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。
----	-----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程

混凝土平整度不佳 (護岸背面約 1k+540 處平整度不佳或表面 粗糙)。  25/09/2023	
說明	混凝土平整度不佳(護岸背面約 1k+540 處平整度不佳或表面粗糙)。



說明


施工現場交通警告等設施不足(施工現場入口夜間交維警示不足)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程

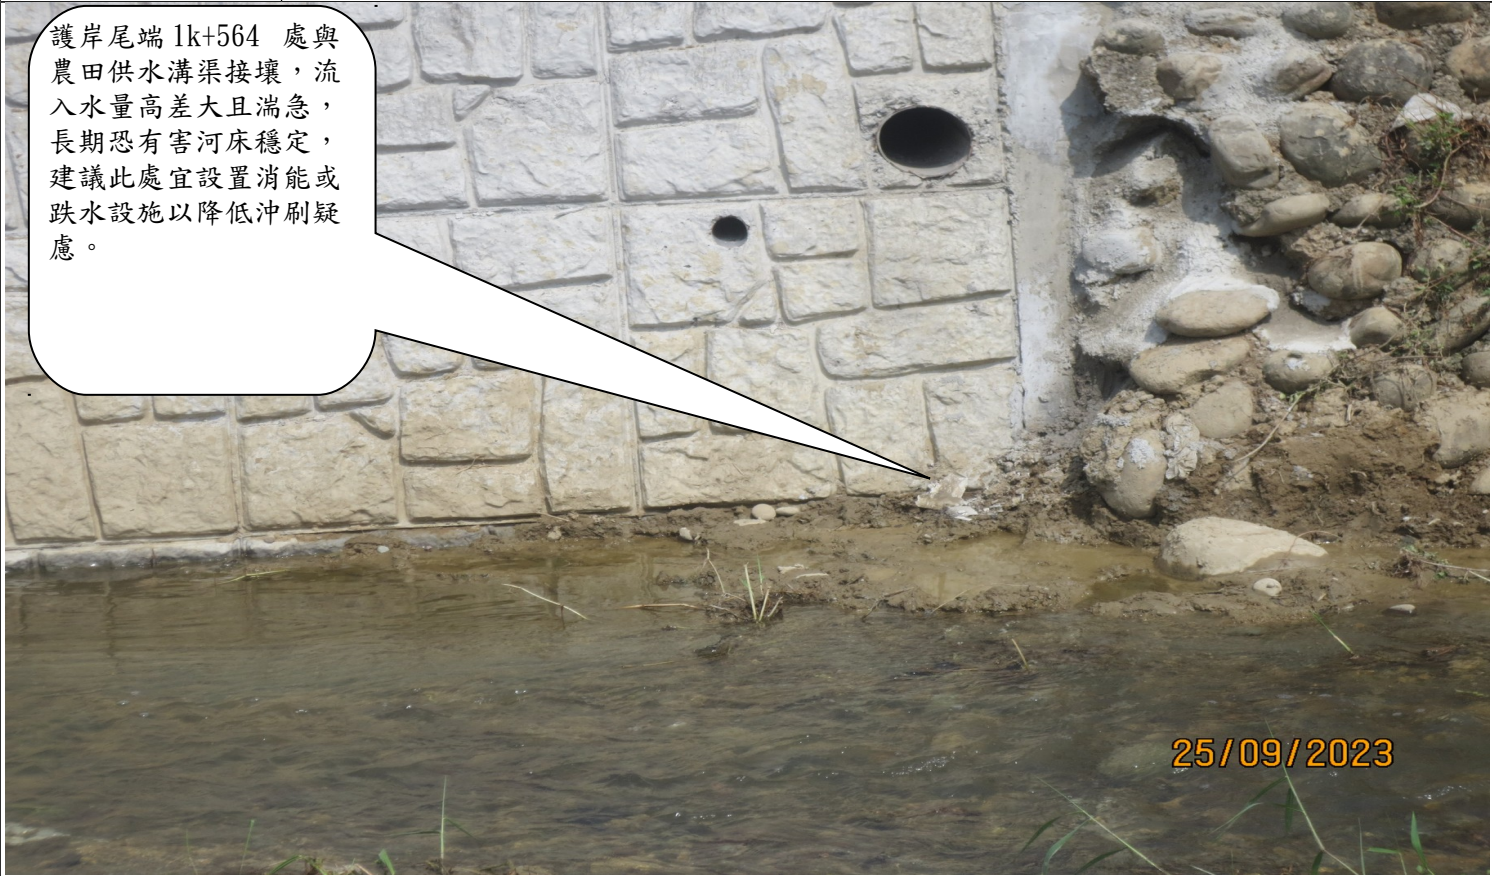

說明	護岸尾端 1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。
護岸尾端 1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。	 25/09/2023
說明	護岸尾端 1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.09.25

工程名稱：尚義里二中支圳護岸改善工程



說明

工地出入口應有門禁管制措施。。



說明
