

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



說明

教室之拱形之金屬框之接合處及與牆面之縫隙未妥善處理。




說明

欄杆、扶手設置不合規範。(欄杆間距超過 15 公分，兒童遊戲攀爬，容易穿越產生意外事件)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程

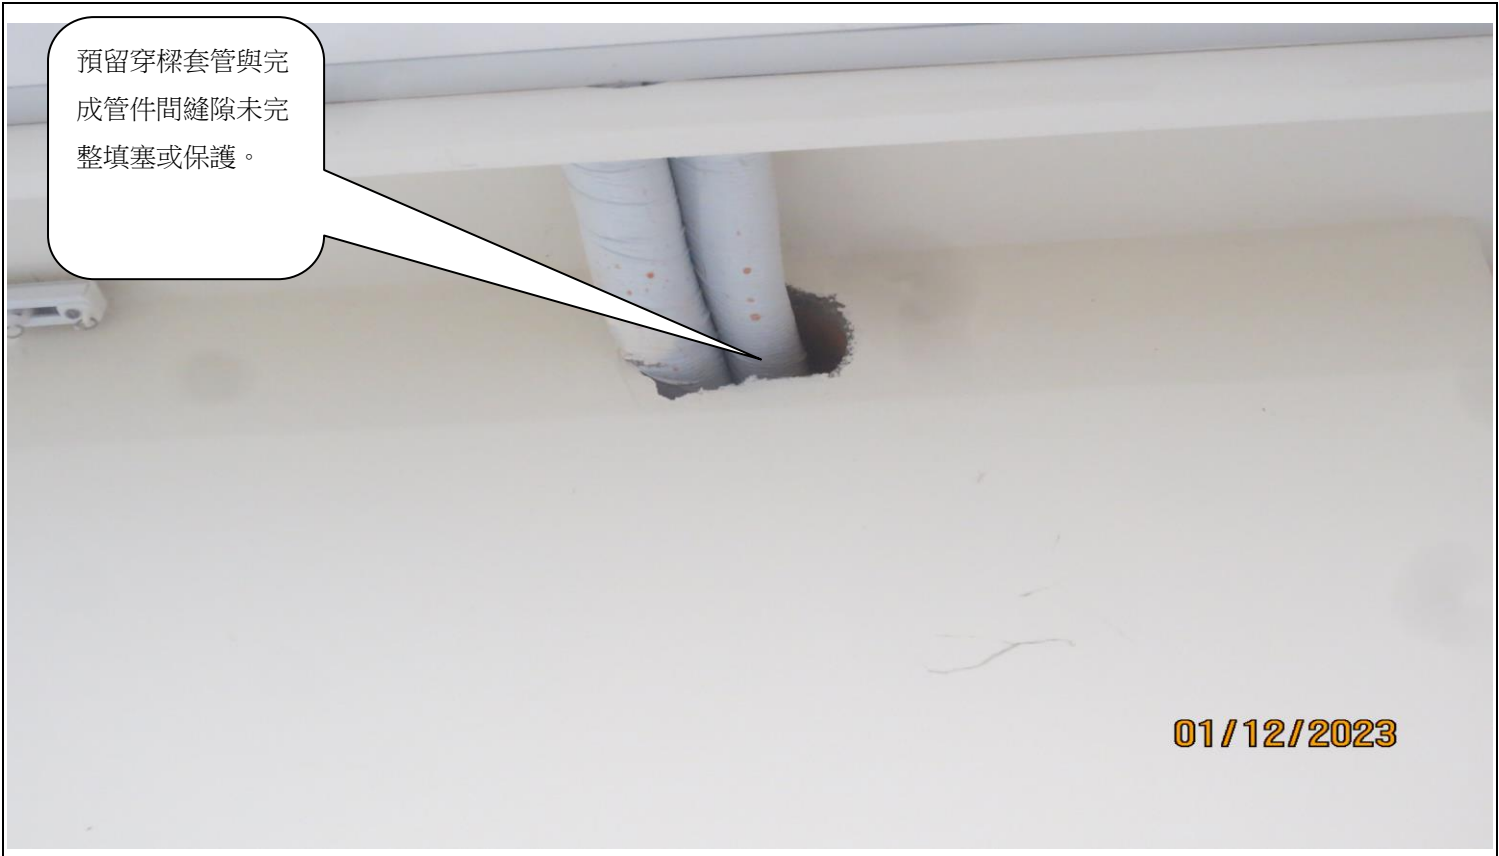

說明

預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。



說明

儲藏室之排水管之顏色只有一種，不可與污水管混用未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



說明

管線鋪設不當，影響美觀。(教室牆壁，留設冷氣機冷媒管、電線未整理固定)




說明

教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程

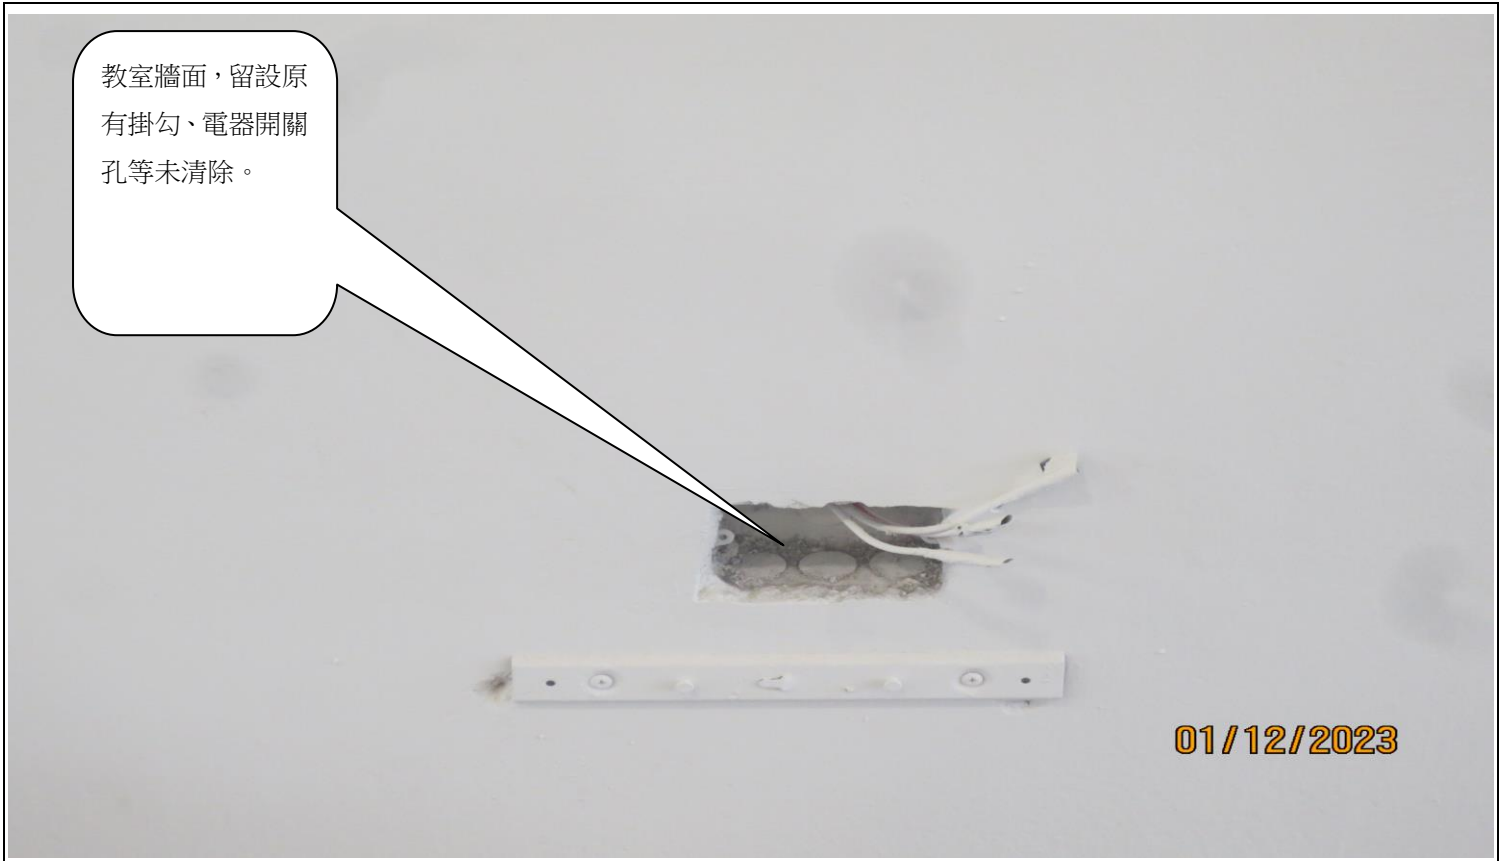

01/12/2023

說明	教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。
----	------------------------



01/12/2023

說明	工程告示牌全銜沒有英文翻譯、專任工程人員缺行動電話、QR Code 不符合需求，標準只有一個。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



說明

1 樓無障礙廁所之門寬請設計單位再檢核。



說明

預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。
