

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



說明

教室之拱形之金屬框之接合處及與牆面之縫隙未妥善處理。



說明	欄杆、扶手設置不合規範。(欄杆間距超過15公分，兒童遊戲攀爬，容易穿越產生意外事件)
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



說明	預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。
----	-------------------------

儲藏室之排水管之顏色只有一種，不可與污水管混用未處理。



說明

儲藏室之排水管之顏色只有一種，不可與污水管混用未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程

管線鋪設不當，影響美觀。(教室牆壁，留設冷氣機冷媒管、電線未整理固定)




說明	管線鋪設不當，影響美觀。(教室牆壁，留設冷氣機冷媒管、電線未整理固定)
	
說明	教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01

工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程

教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。

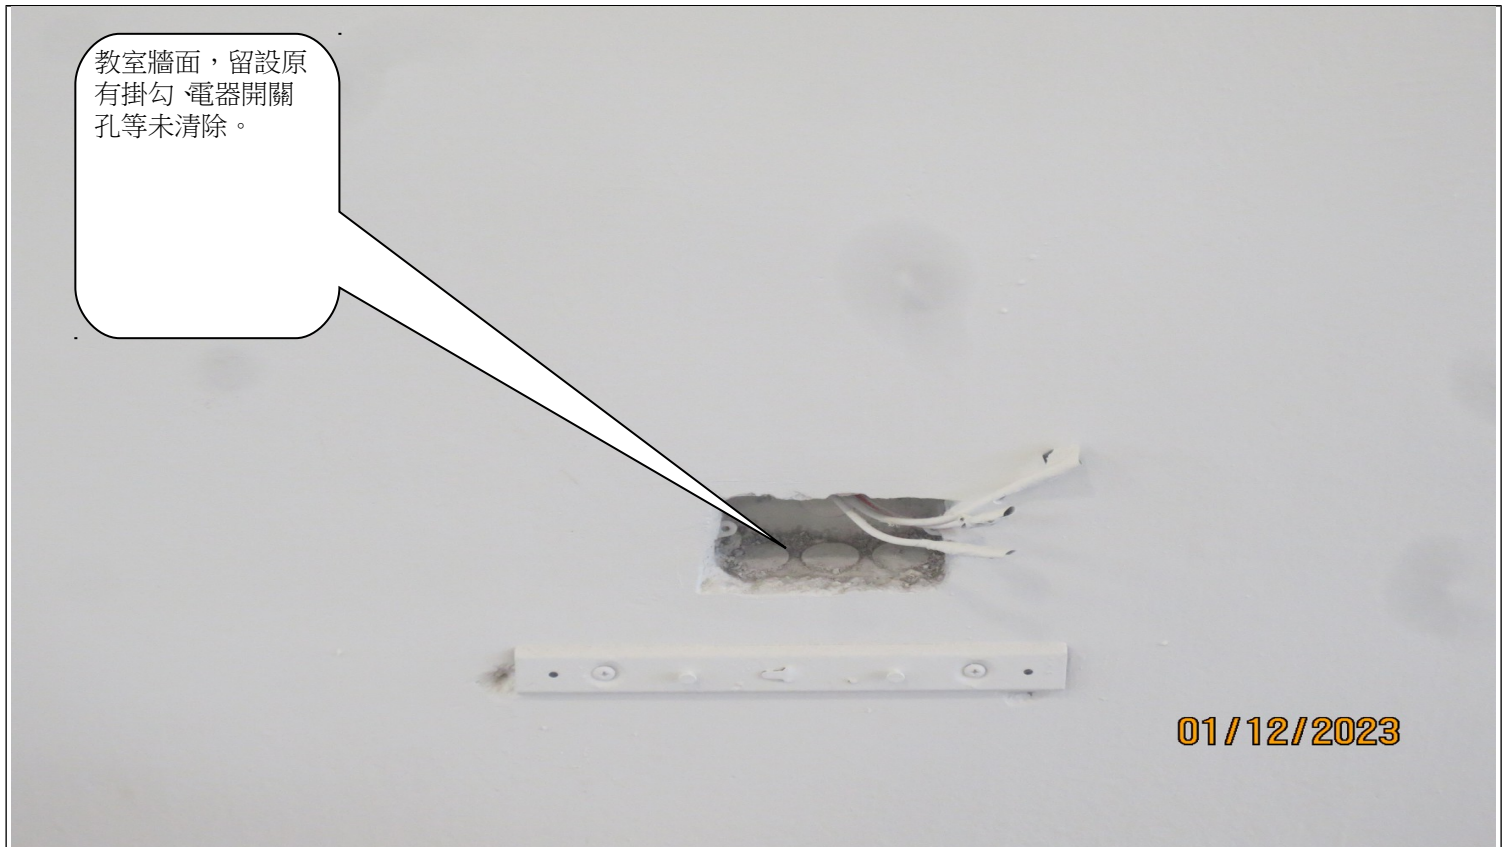

01/12/2023

說明

教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。



01/12/2023

說明

工程告示牌全銜沒有英文翻譯、專任工程人員缺行動電話、Q R Coad 不符需求，標準只有一個。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.01


工程名稱：111 年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程



1樓無障礙廁所之門寬請設計單位再檢核。

說明

1樓無障礙廁所之門寬請設計單位再檢核。

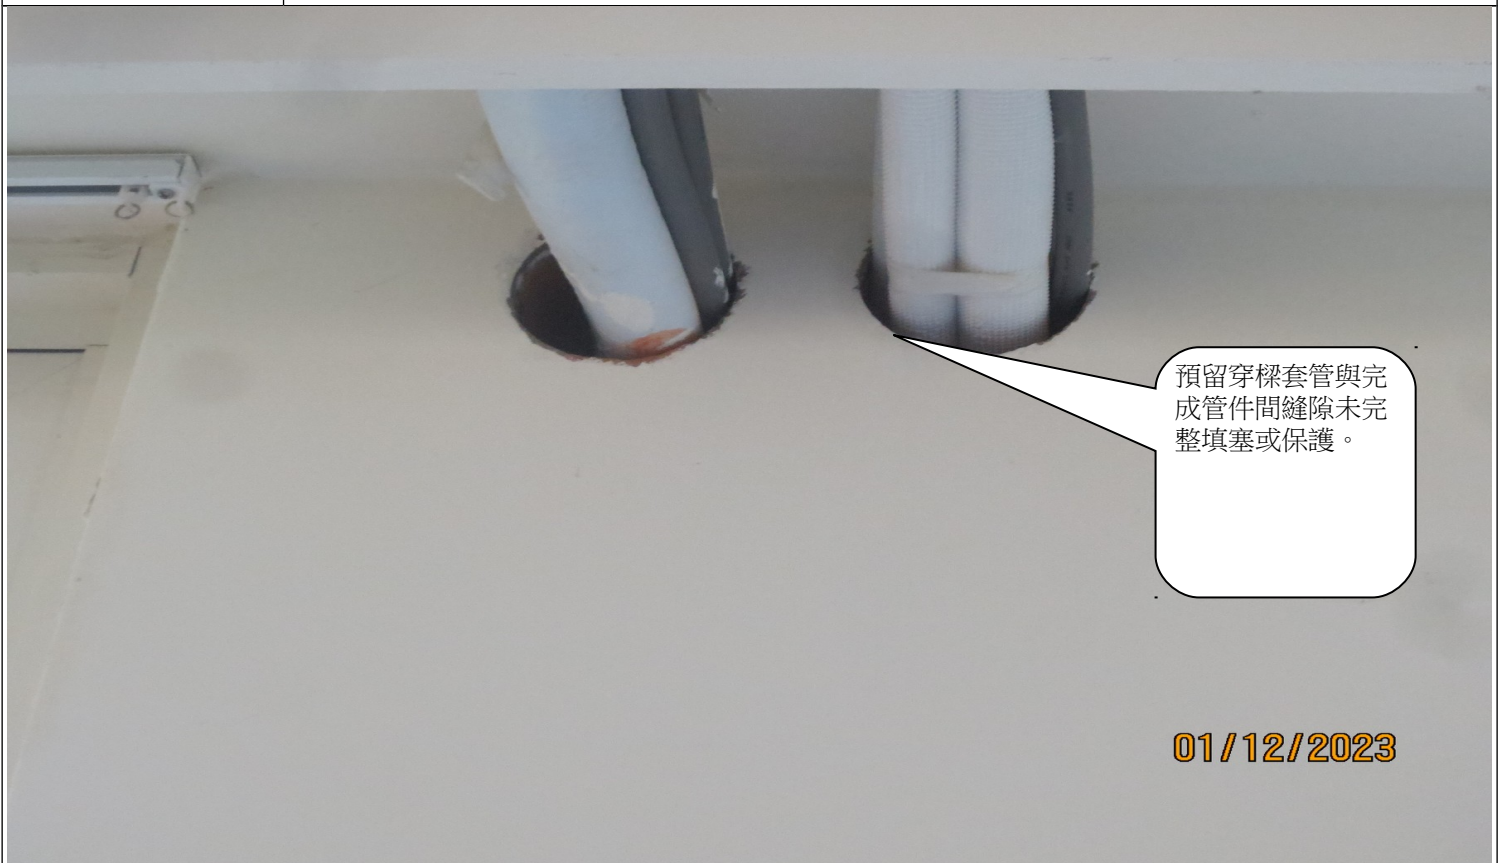

預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。

01/12/2023

說明

預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。
