

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.09.05

工程名稱：竹北市安興國小學生活動中心興建工程



說明

新設地下停車場與既有停車場之間的水泥混凝土坡道，接合縫之切割不平整且有縫緣破碎情形。

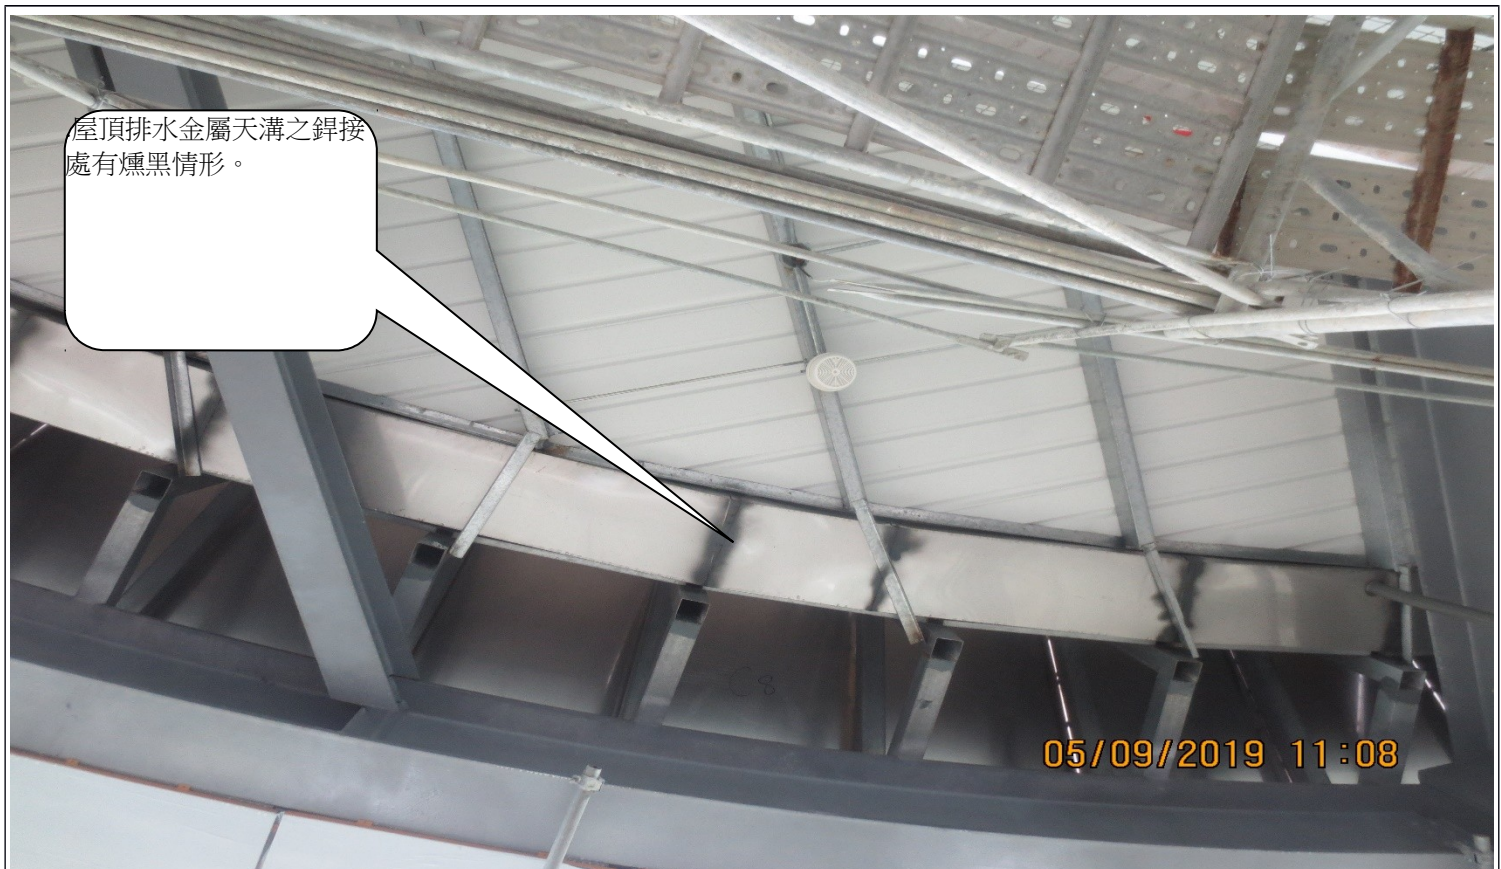

屋頂排水金屬天溝之銲接處有燻黑情形。

05/09/2019 11:08

說明

屋頂排水金屬天溝之銲接處有燻黑情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.05

工程名稱：竹北市安興國小學生活動中心興建工程



管路吊架不穩固，固定架間距未依規定施作。

2019/09/05

說明	管路吊架不穩固，固定架間距未依規定施作。
----	----------------------




說明	焊接處防銹未處理。
----	-----------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.05


工程名稱：竹北市安興國小學生活動中心興建工程

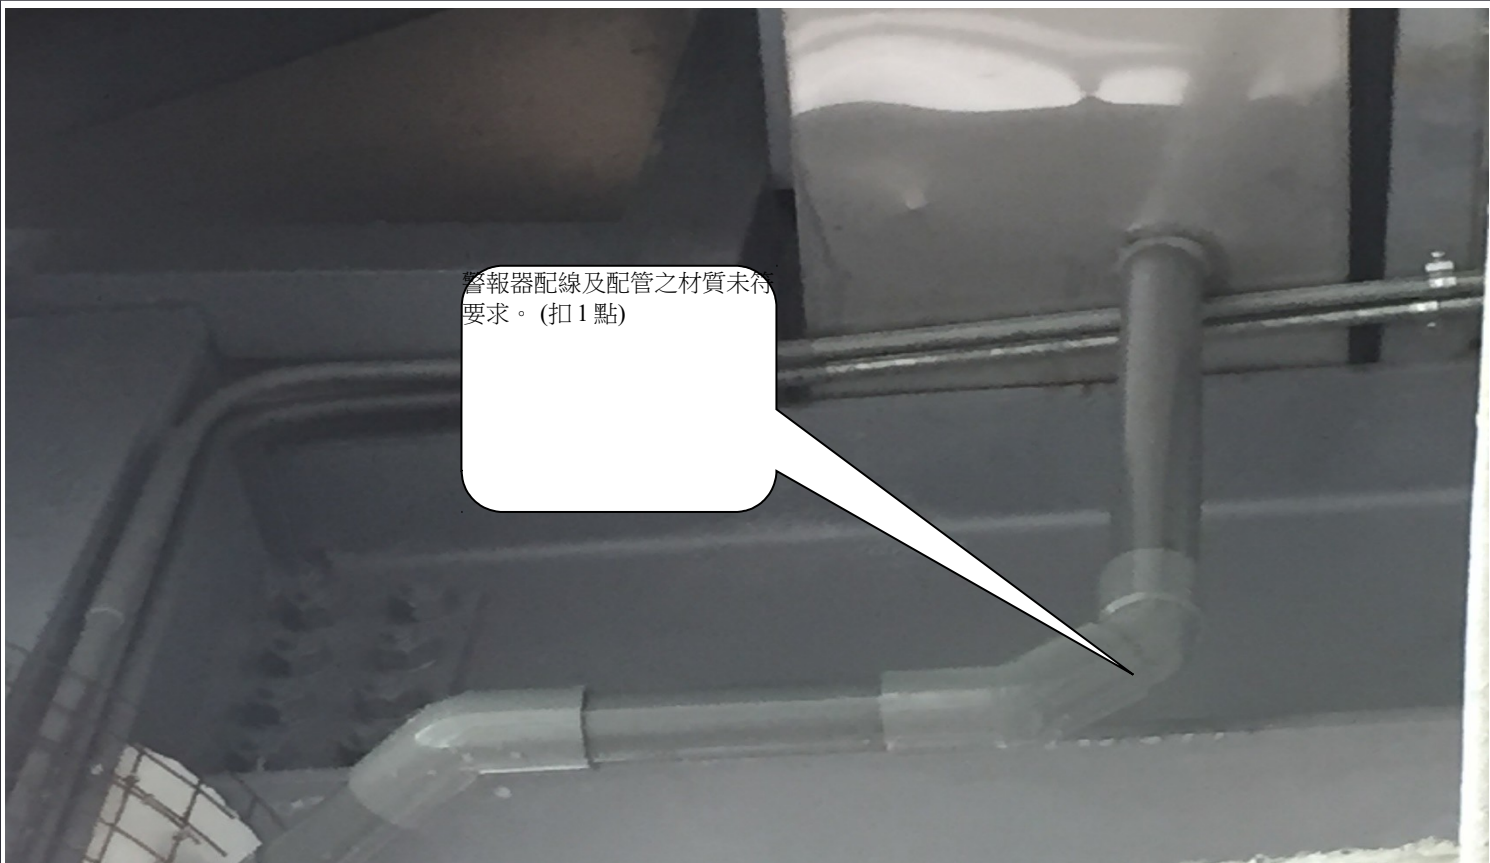

警報器配線及配管之材質未符要求。(扣1點)

說明

警報器配線及配管之材質未符要求。(扣1點)



部分圓柱及牆面的噴漿塗抹面之抹平紋路不甚平順。


05/09/2019 10:23

說明

部分圓柱及牆面的噴漿塗抹面之抹平紋路不甚平順。

拍攝日期：108.09.05

工程名稱：竹北市安興國小學生活動中心興建工程

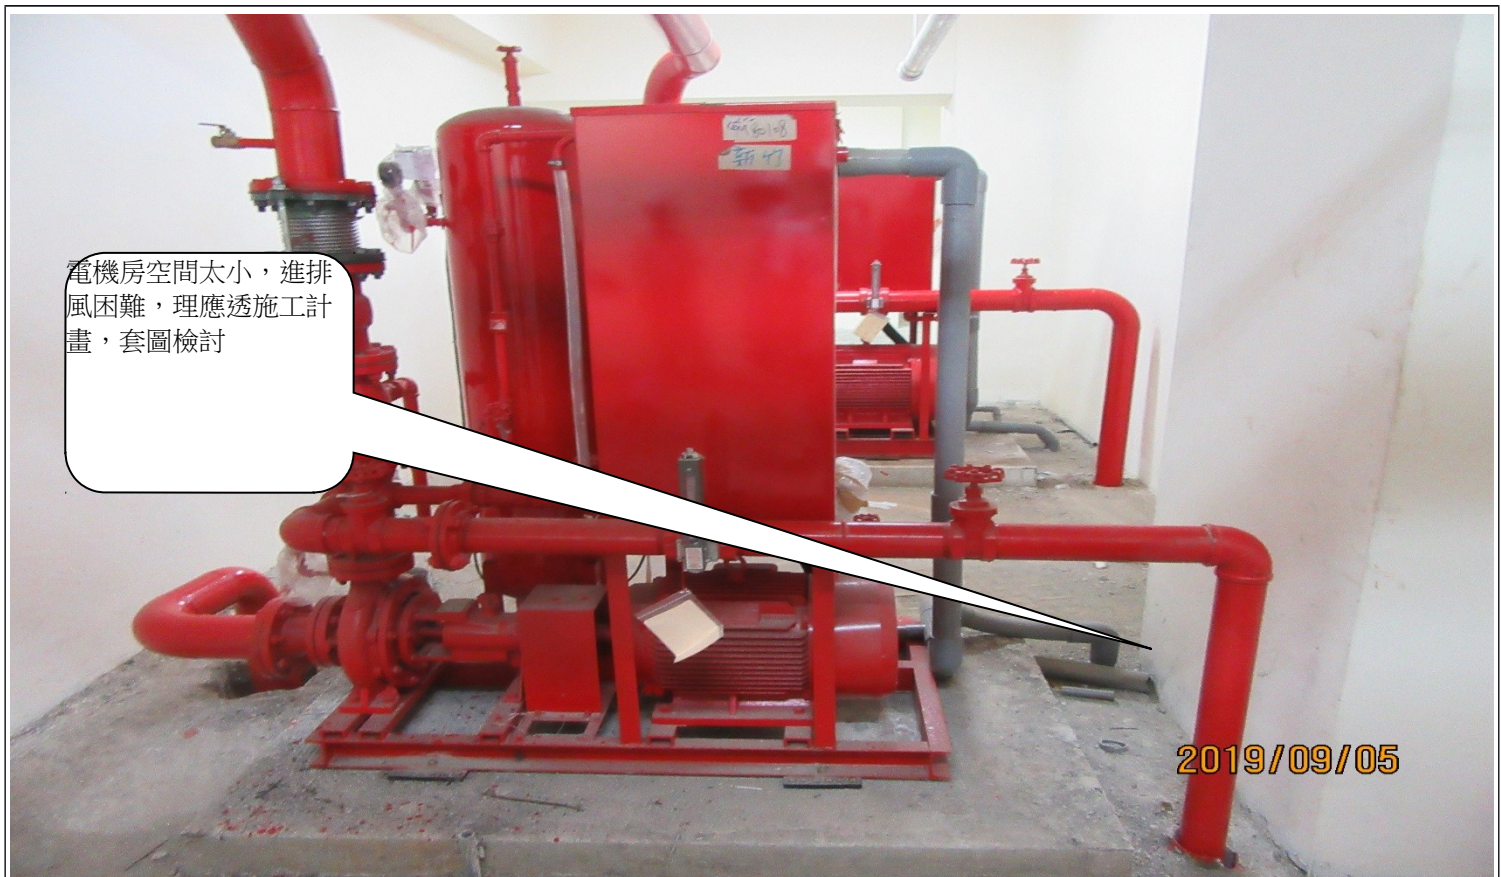

說明

發電機房空間太小，進排風困難，理應透施工計畫，套圖檢討，作必要之調整 或加大機房空間，或其他因應措施，不是將就了事。



說明	伸出地面之預留電線塑膠管線，未有防撞損保護。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.05

工程名稱：竹北市安興國小學生活動中心興建工程



說明	地下室，或光線微弱的地方未設置適當之照明，恐影響工作人員之安全。
----	----------------------------------

焊接處防銹未處理。

2019/09/05

說明

焊接處防銹未處理。
