
拍攝日期:110.01.07

工程名稱:照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程



說明

刨除 PU 跑道面層廢料,部份未以帆布覆蓋。

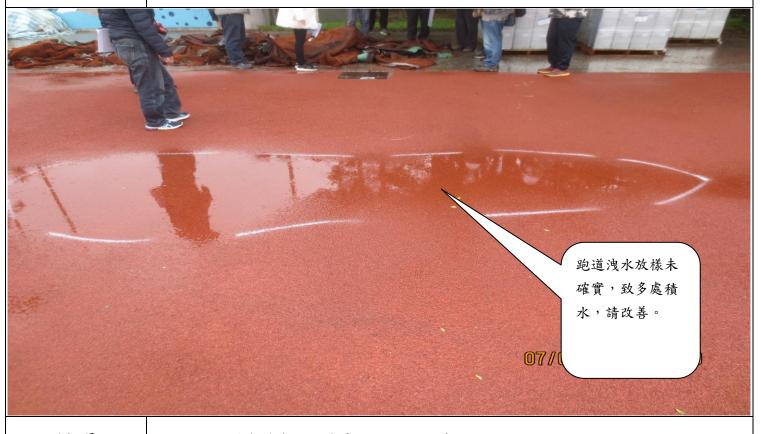

說明

跑道洩水放樣未確實,致多處積水,請改善。

拍攝日期:110.01.07

工程名稱: 照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程



說明

起跑點 PU 跑道已進行施作,相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行,易造成 PU 跑道完成面之污損。



說明

起跑點 PU 跑道相鄰樹穴沃土未阻絕,易流入跑道上,請加以改善。

拍攝日期:109.12.17

工程名稱:照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程



說明

跑道既有排水孔請隨時保持暢通。



說明

PU跑道基層有部分區域噴塗不均勻。

拍攝日期:110.01.07

工程名稱:照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程



說明

跳遠砂坑貯砂未適當保護,造成 PU 橡膠粒混雜其間。



說明

跑道內側排水井口有高差,易衍生危險,請研議處理。
