

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.12.

工程名稱：泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程



工業區進入鳳山整壓站  
燃氣專用管線之開挖溝  
槽深度不符合設計要  
求，壁面有凸出物未挖除  
與溝槽底有雜物及鬆散

12/08/2021 11:04

## 說明

工業區進入鳳山整壓站燃氣專用管線之開挖溝槽深度不符合設計要求，壁面有凸出物未挖除與溝槽底有雜物及鬆散土方



溝底有塑膠袋、空  
罐、膠帶紙輪圈等  
雜物。

12/08/2021 11:04

## 說明

溝底有塑膠袋、空罐、膠帶紙輪圈等雜物。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.12

工程名稱：泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程



移動式工程告示牌應綠底白字，非白底藍字；施工期間應載該區域施工期間，不是契約開工日期與工程期限。

## 說明

移動式工程告示牌應綠底白字，非白底藍字；施工期間應載該區域施工期間，不是契約開工日期與工程期限。



PE管堆放工地沒有防外物碰撞保護措施及覆蓋帆布防陽光照射。

## 說明

PE管堆放工地沒有防外物碰撞保護措施及覆蓋帆布防陽光照射。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.08.12

工程名稱：泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程



說明

· 工地有工人沒戴安全帽及口罩。

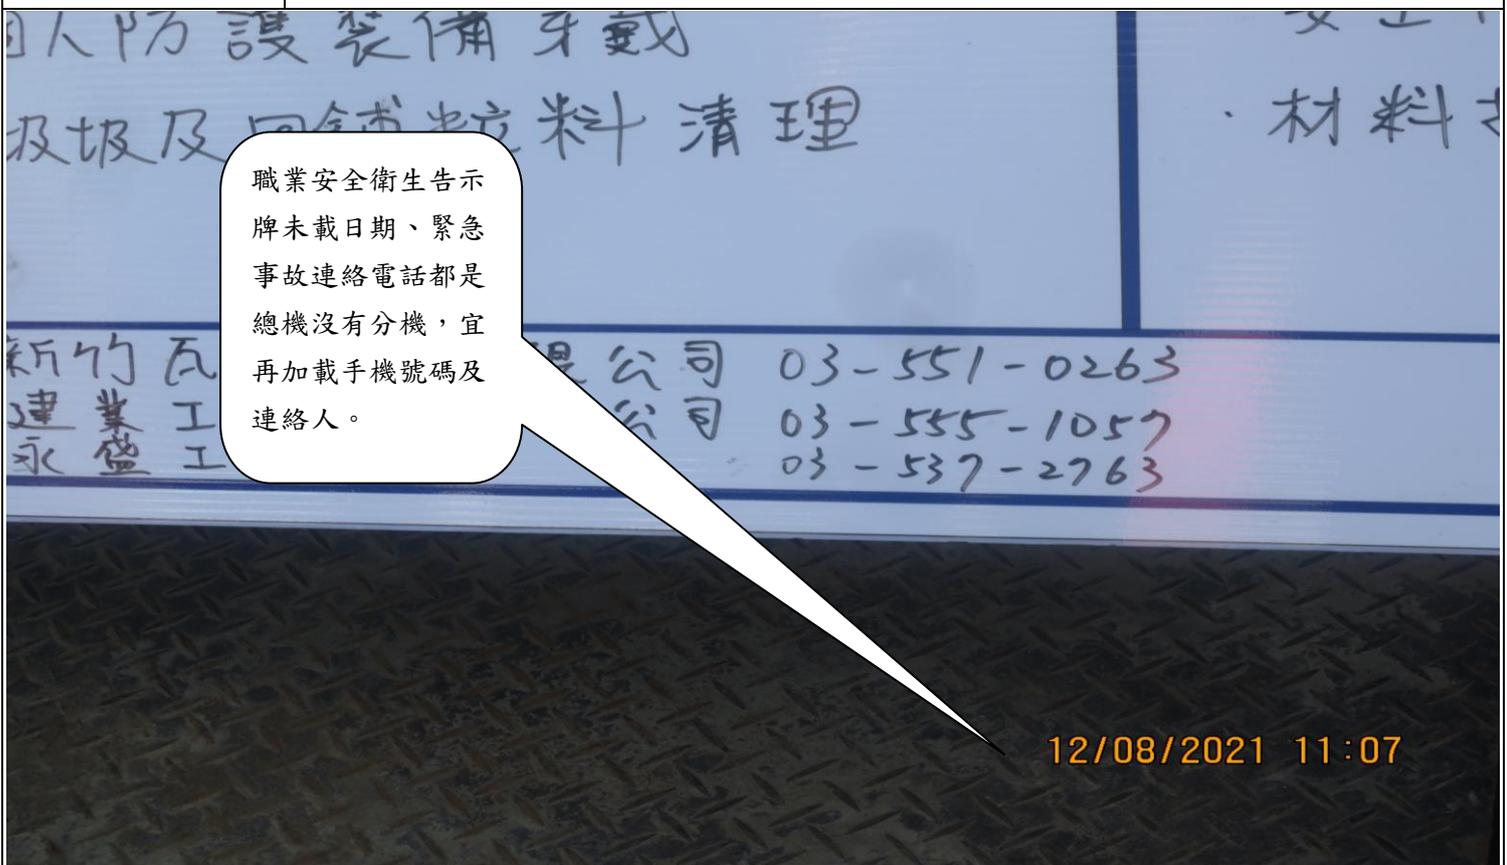

說明

職業安全衛生告示牌未載日期、緊急事故連絡電話都是總機沒有分機，宜再加载手機號碼及連絡人。
