


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21


工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)



自強國中配電室內變壓器
垂直向未確實固定。

說明

自強國中配電室內變壓器垂直向未確實固定。

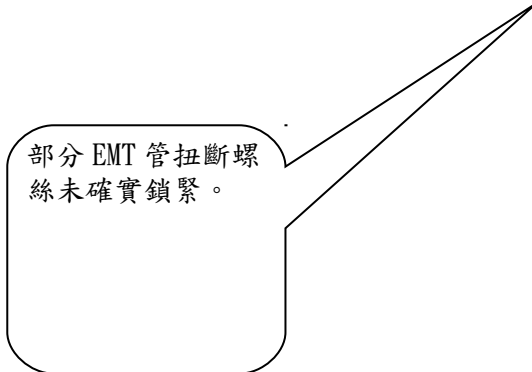

部分 EMT 管扭斷螺
絲未確實鎖緊。


說明

部分 EMT 管扭斷螺絲未確實鎖緊。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)



穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。

說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。
----	------------------




線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。

說明	線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。
----	-------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21
工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)

	
說明	配管固定不當，垂直或水平管路固定不合規範。

管路與線槽之間
未使用軟管連
接。。

說明


管路與線槽之間未使用軟管連接。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)

自強國中配電室
為密閉空間，未
設通風設備，散
熱效果不佳，影
響設備運轉效率。

說明	自強國中配電室為密閉空間，未設通風設備，散熱效果不佳，影響設備運轉效率。
穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。 	
說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。
