


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.15

工程名稱：新竹縣 109 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)

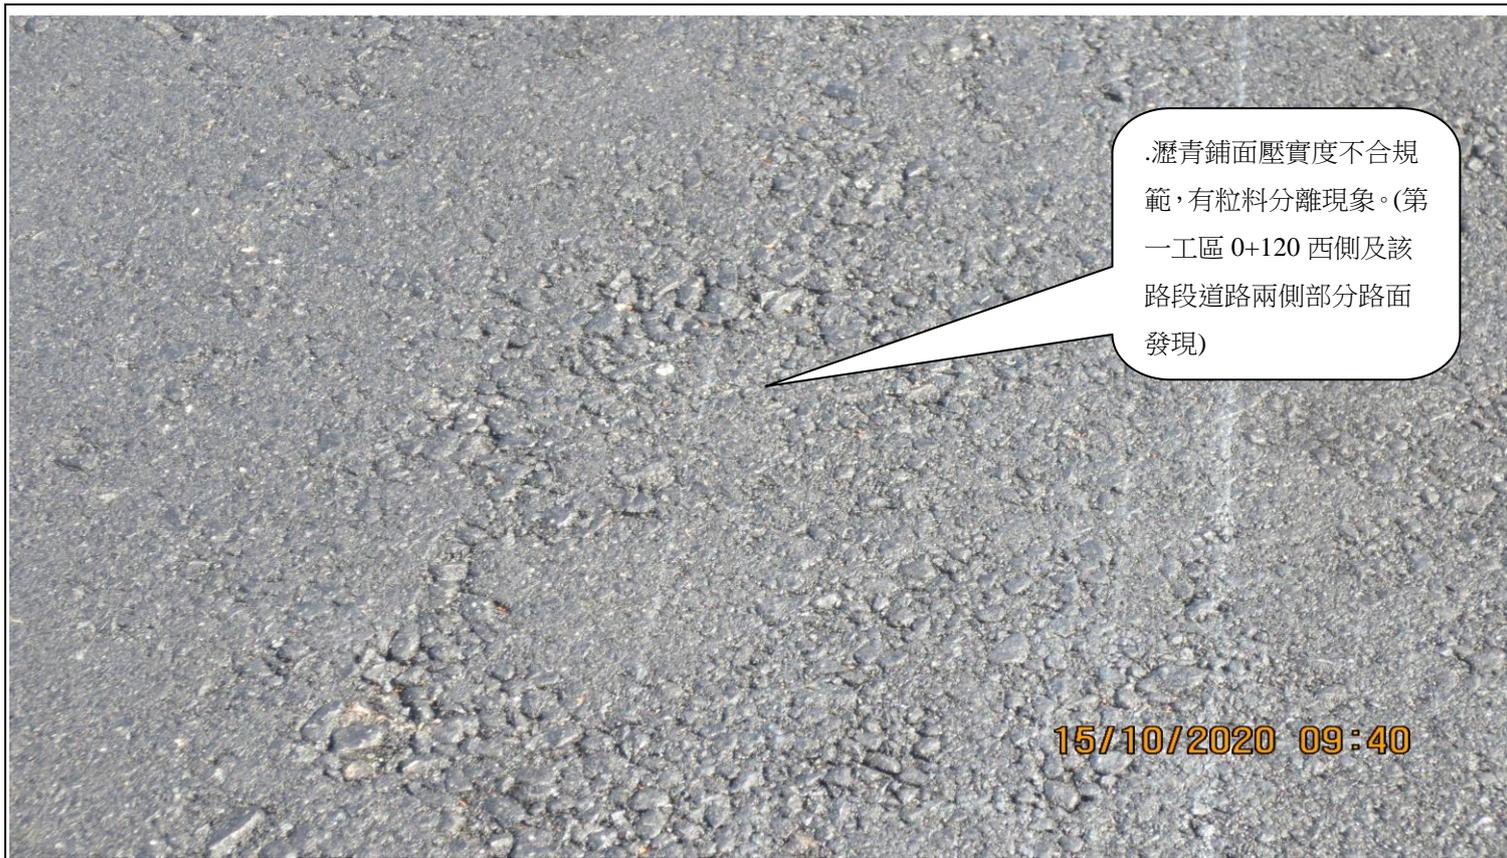

說明

瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(第一工區 0+120 西側及該路段道路兩側部分路面發現)




說明

道路標線劃設不合規範。(已完成路面各路口之跳動標線有重疊突起現象及第二工區 0+040~0+080 南側道路標線不平整有孔洞)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.15

工程名稱：新竹縣 109 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)

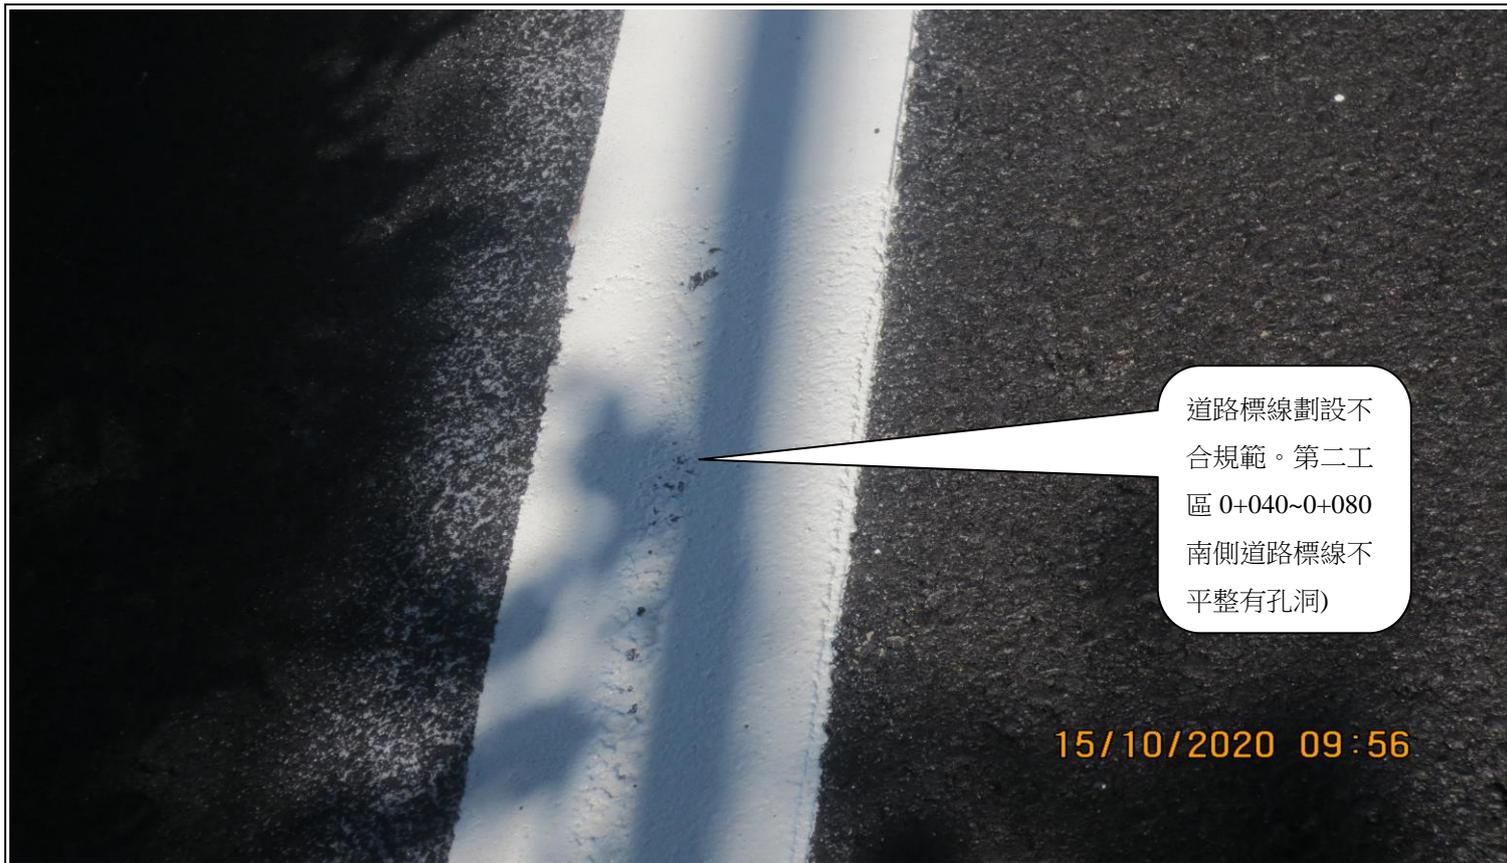

說明	道路標線劃設不合規範。(已完成路面各路口之跳動標線有重疊突起現象及第二工區 0+040~0+080 南側道路標線不平整有孔洞)
----	---



說明	廢棄物未清理,影響環境。(第一工區 0+080~0+100 西側邊溝內有廢棄瀝青混凝土殘渣、160~0+260 西側發現有瀝青混凝土殘渣掉入農田、0+260~0+340 西側農田內之蔬菜有被瀝青噴灑痕跡)
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：新竹縣 109 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



說明

160~0+260 西側發現有瀝青混凝土殘渣掉入農田



說明

0+260~0+340 西側農田內之蔬菜有被瀝青噴灑痕跡

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.15

工程名稱：新竹縣 109 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)



說明

瀝青混凝土厚度有不足之嫌。



說明

第一工區 0+340~0+359 東側水溝牆高於路面，現場發現有積水可能，建議主辦單位與監造研議改善。
