

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.08.10**

工程名稱：生活圈道路交通系統建設計畫-竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程案-車道拓寬工程案



說明

現場「預鑄 L 型溝蓋板」，部分有碎角情形，請再檢視。




說明

位處新舊界面之「場鑄 L 型溝蓋板」，完成面有積水情形；請檢視排水高程，必要時請施作導溝，將水排至原有水溝。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.08.10**

工程名稱：生活圈道路交通系統建設計畫-竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程案-車道拓寬工程案

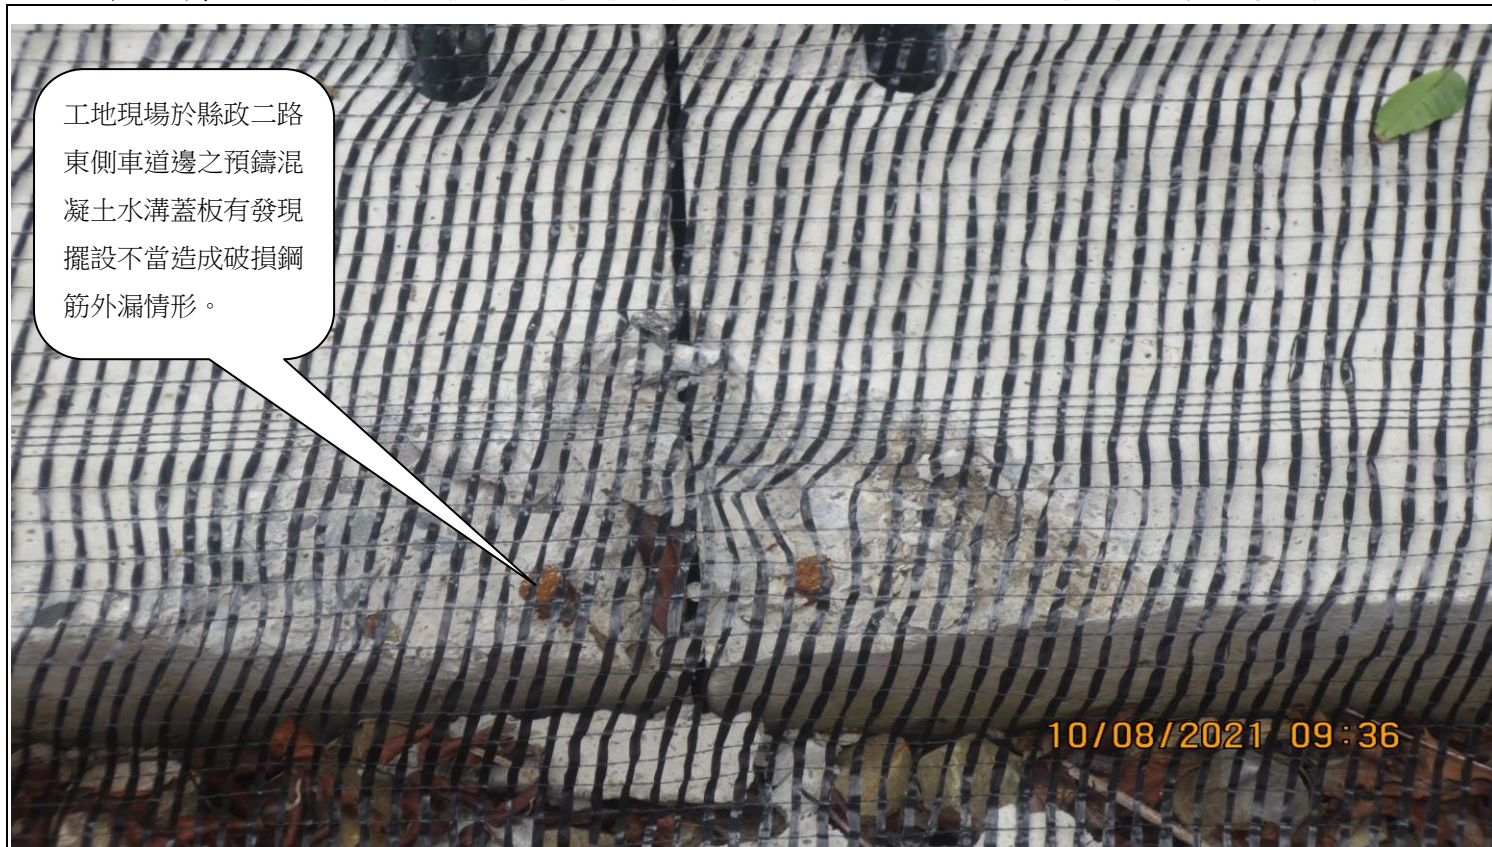

說明

工地現場於縣政二路東側車道邊之預鑄混凝土水溝蓋板有發現擺設不當造成破損鋼筋外漏情形。



說明

工程告示牌顯示：(1) 以鐵線固定在樹木上，不符環保要求。(2) 工地負責人聯絡電話，請填寫手機號碼。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.08.10**

工程名稱：生活圈道路交通系統建設計畫-竹北市環北路與中山路口道路交通改善工程案-車道拓寬工程案



說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護(縣政二路與中山路口東側發現一支道路名牌置放人行道上，在西側國小圍牆邊有堆放材料均未作妥適之覆蓋保護)。



說明

場鑄L型溝蓋板與原有人行步之界面，請加以整合，並以平順度為原則，避免有高低差情形。。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.08.10**

工程名稱：生活圈道路交通系統建設計畫-竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程案-車道拓寬工程案



說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護(在西側國小圍牆邊有堆放材料均未作妥適之覆蓋保護)。



說明

工地現場於縣政二路東側拓寬，將原有人行道移置石頭公園內之人行道，造成縣政二路與公園人行道銜接不平整且材質不同。
