

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



人行道鋪設不合規範
部分基底施工不佳，
部分地磚與地磚間密
合縫隙過大且不對稱
(直線未對齊)。

15/12/2023

說明	人行道鋪設不合規範部分基底施工不佳，部分地磚與地磚間密合縫隙過大且不對稱(直線未對齊)。
----	--



工程告示牌之格式及內容為舊版，請更新（如無空污編號等）。

新竹縣竹東鎮公所 (Zhudong Township Administration Office)			
工程名稱 (Project Name)	竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	百維工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	百維工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	立宸營造有限公司	工程概要 (Project Description)	人行道更新單位設置
施工期間 (Duration)	民國112年10月20日 至 民國113年3月20日		
任工地負責人 (Supervisor)	邱勇偉	電話 (TEL)	0910-175-602
	林明祥	電話 (TEL)	03-5826318
通報專線 (Complaints & Suggestions)	督工專線及網址 (Government Hotline and Internet Address)	0900-009-609	http://www.pcc.gov.tw
	服務單位 (Service Unit)	03-5941228	
經費來源 (Budgetary Source)	1. 中央: 16,810 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
	1. 地方: 3,690 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D)		
	2. 年(Yr) 月(M) 日(D)		

職業安全衛生告示牌 (Labor Safety & Health Signboard)			
112年12月14日			
工程名稱 (Project Name)	竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程		
主辦機關 (Title of the Agency)	新竹縣竹東鎮公所		
監造單位 (Construction Supervisor)	西維工程顧問有限公司		
施工廠商 (Contractor)	立宸營造有限公司	安全衛生管理人員 (Safety & Health Keeper)	林玉彤

15/12/2023

說明	工程告示牌之格式及內容為舊版，請更新（如無空污編號等）。
----	------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明

工地現場材料任意堆置於路旁，有影響交通疑慮。



說明

不合格材料堆置區，未設置不合格品標示區且應立即運離工地。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明

垂直格柵進水孔與既有水溝之銜接應以方型洩水槽，更利於排水及清淤作業。

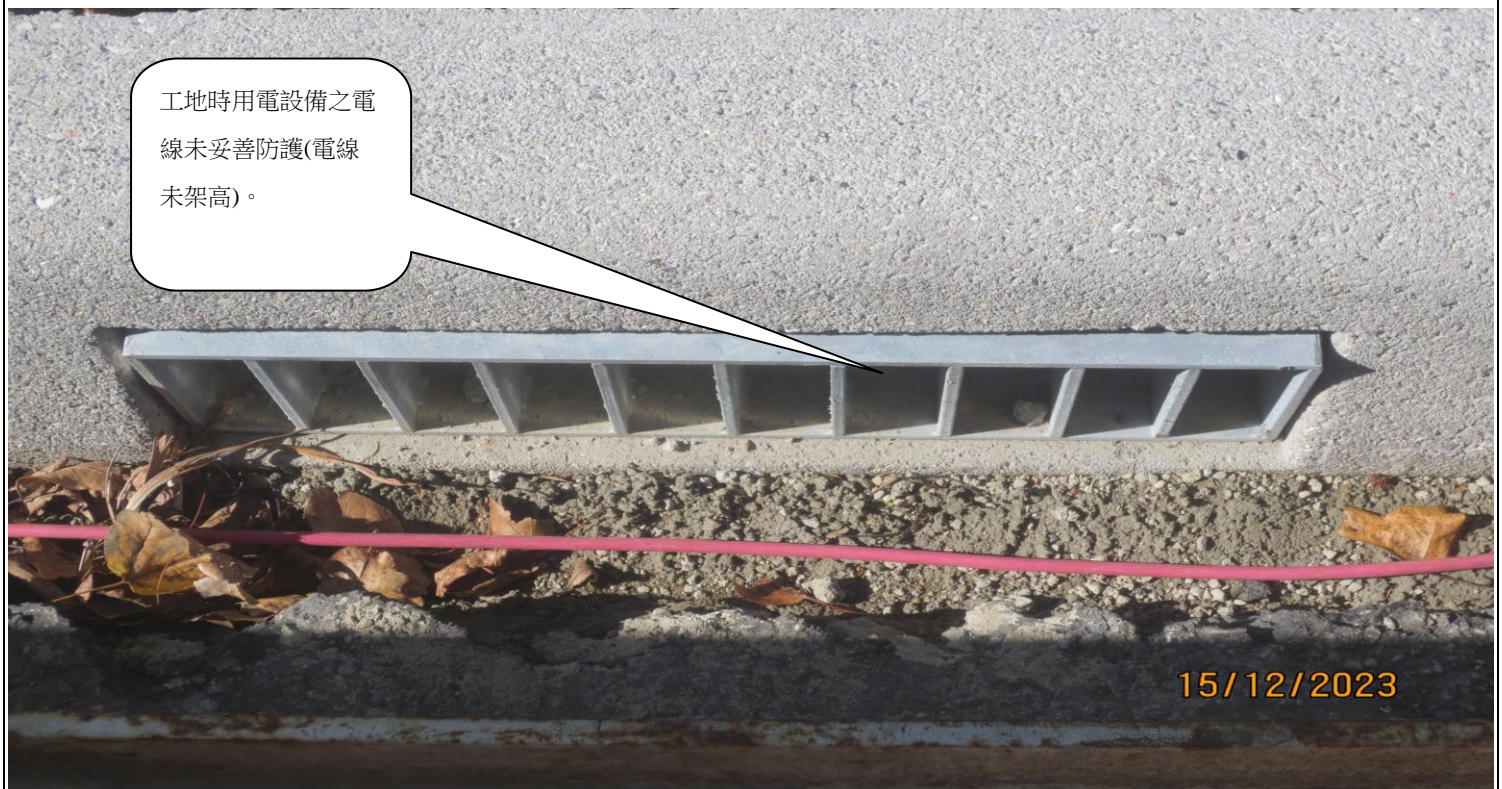


說明

工地時用電設備之電線未妥善防護(電線未架高)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程

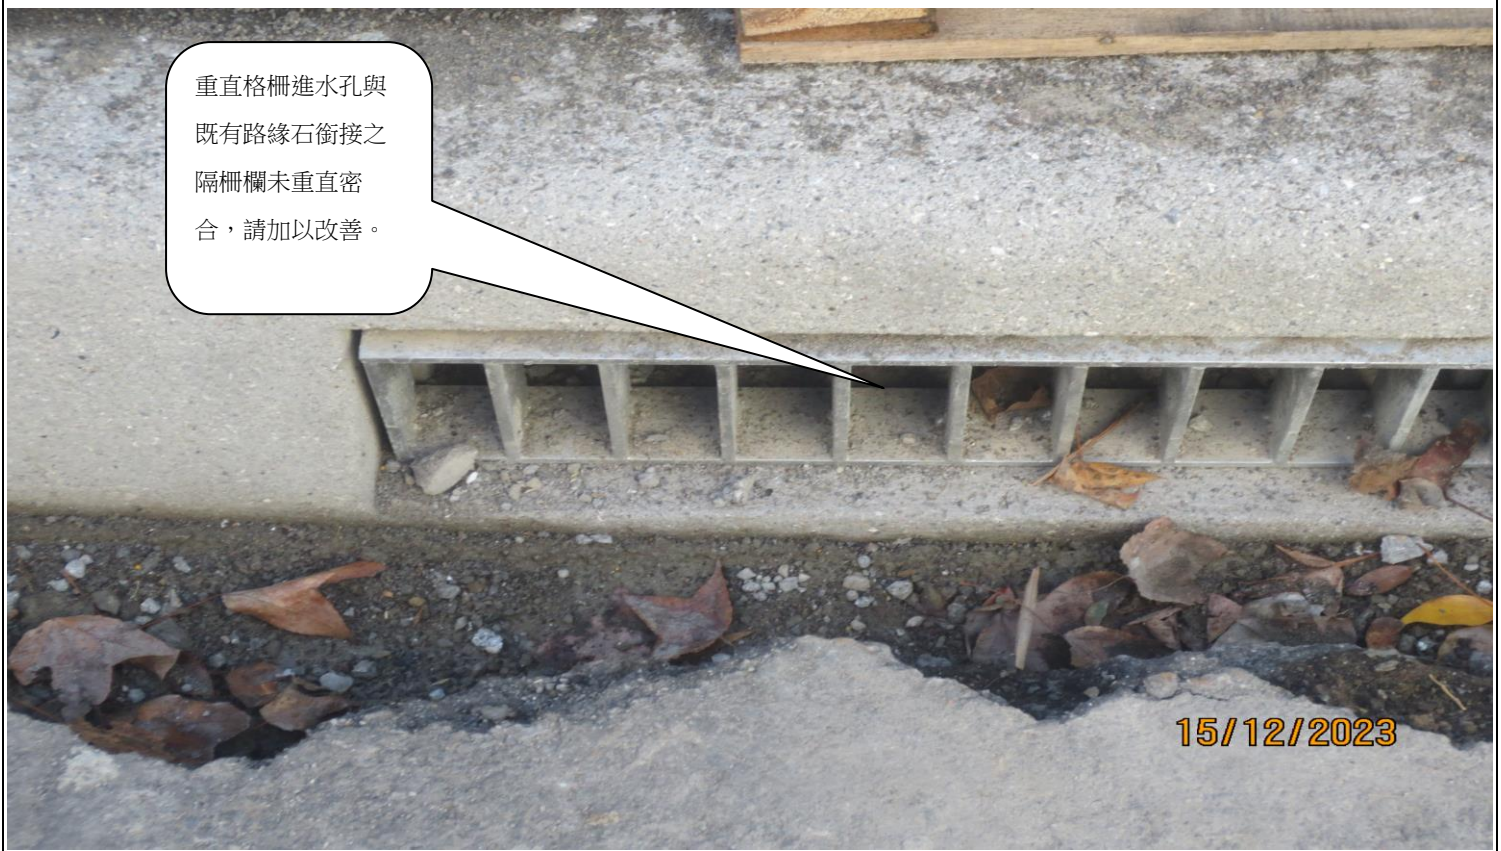

說明

垂直格柵進水孔與既有路緣石銜接之隔柵欄未垂直密合，請加以改善。



說明

工區起終點交通警示設施不足(無連桿)，並應加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。
