


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.15

工程名稱：竹北市東興國中學生活動中心暨多功能專科教室興建工程

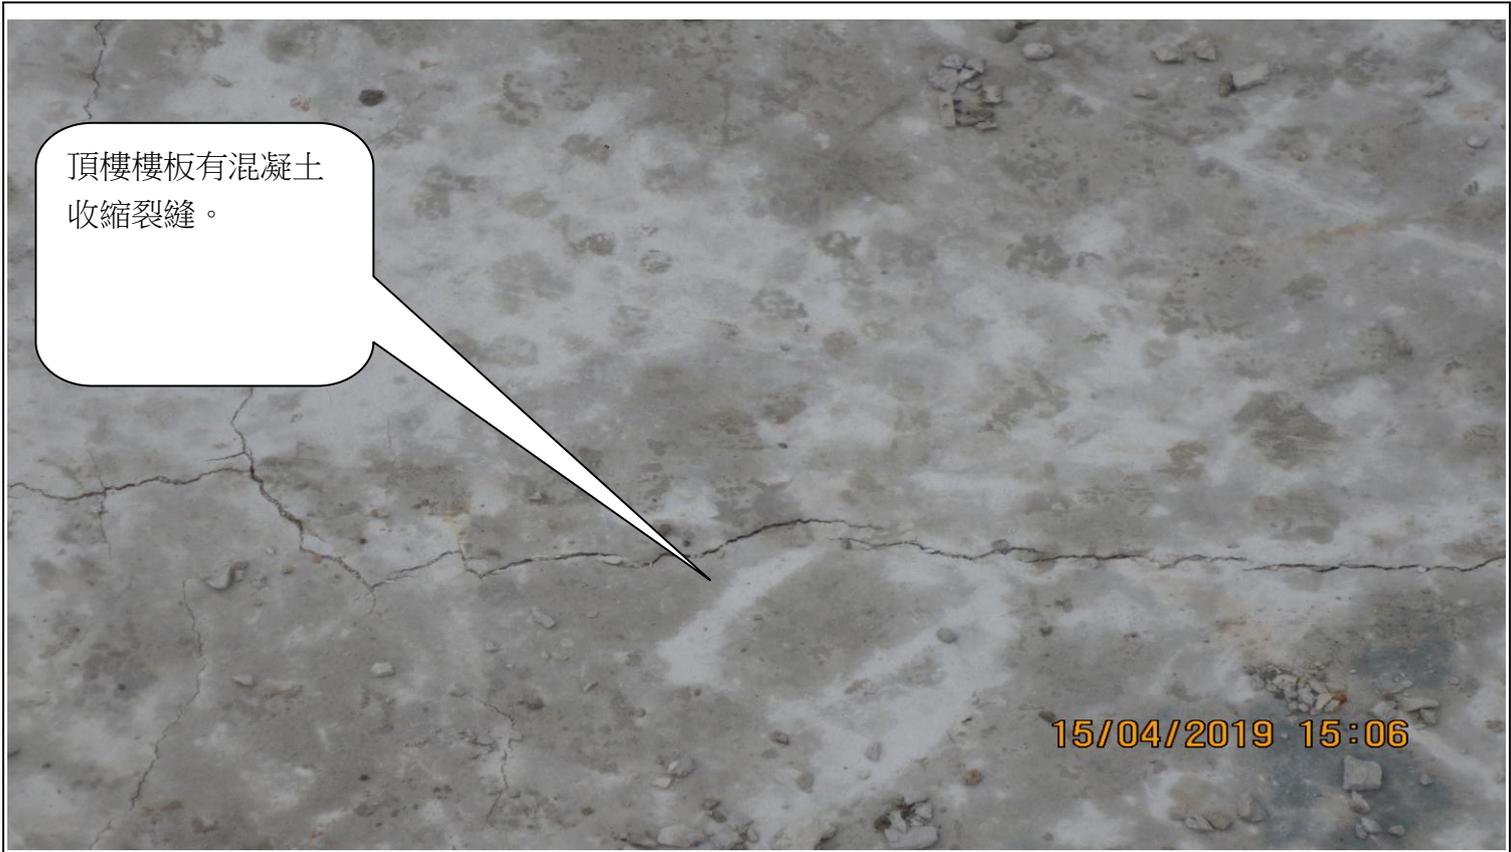

說明

頂樓樓板有混凝土收縮裂縫。



說明

混凝土牆面殘留木片及金屬物未徹底清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.15

工程名稱：竹北市東興國中學生活動中心暨多功能專科教室興建工程



說明	混凝土樓版仍有發生泌水或滲水情形，專任工程人員應協助確實查明漏水原因，並請研議改善方法及修補。
----	---



說明	未確實管理工地安全衛生(如現場模板零亂，有被強風吹落致傷人之虞)。(扣1點)
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.15

工程名稱：竹北市東興國中學生活動中心暨多功能專科教室興建工程



說明

部分工作架與外牆間距超過 30 公分，應掛設安全網。

混凝土樓版仍有發生泌水或滲水情形，專任工程人員應協助確實查明漏水原因，並請研議改善方法及修補。



說明

混凝土樓版仍有發生泌水或滲水情形，專任工程人員應協助確實查明漏水原因，並請研議改善方法及修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.15

工程名稱：竹北市東興國中學生活動中心暨多功能專科教室興建工程



說明

部分配線接線後保護蓋掉落，致電線遭水泥砂漿黏附。



說明

部分管路出口未設置管帽保護。
