


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.14

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程

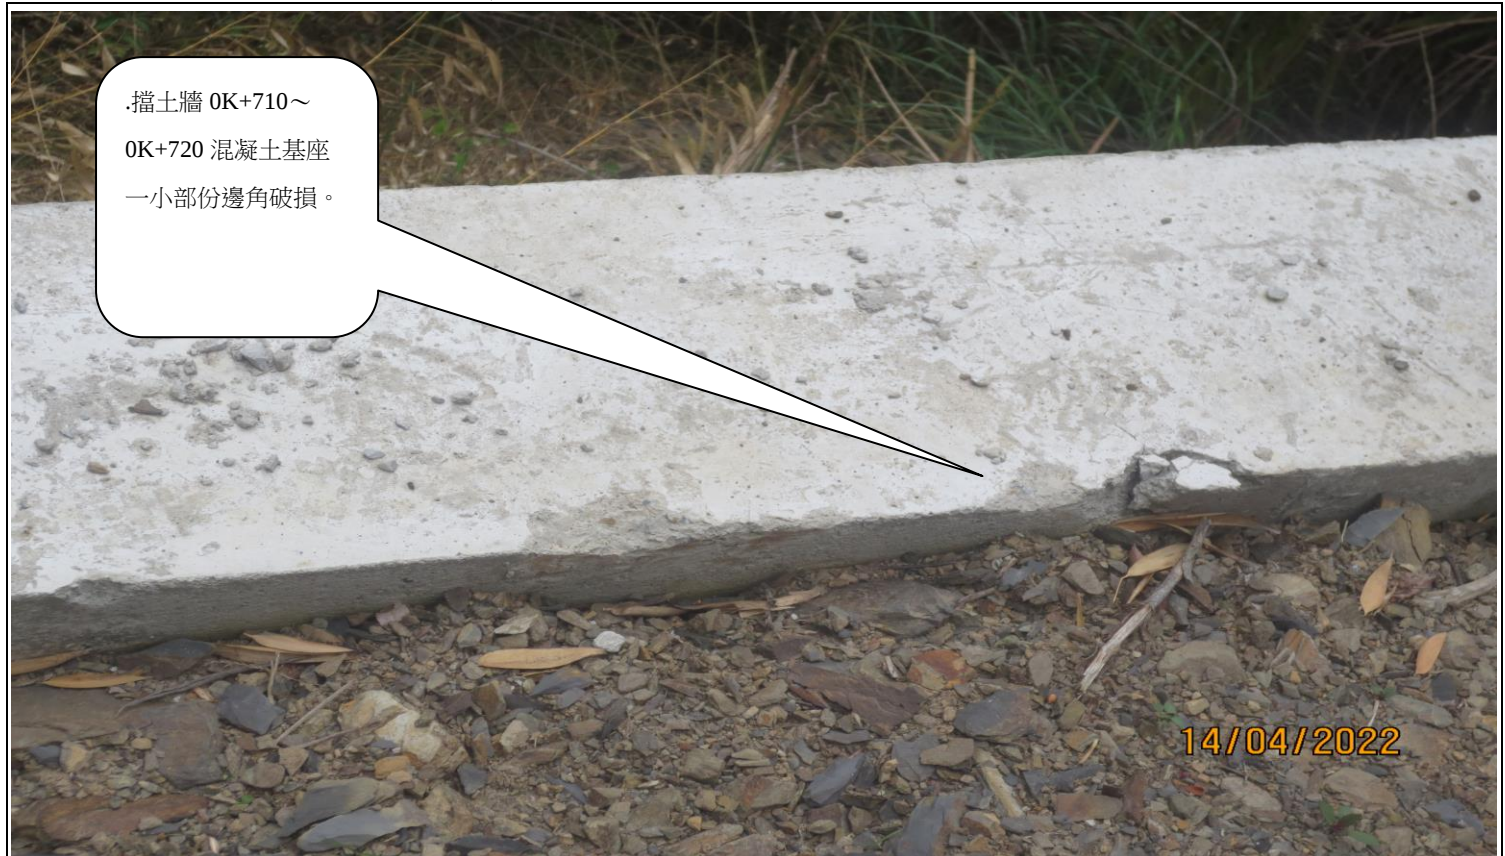

說明

. 擋土牆 0K+710~0K+720 混凝土基座一小部份邊角破損。



說明

6K+325 L 型側溝因模板接縫不平整致混凝土立面不平。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.14

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程



說明

6K+325 L 型側溝前後端部介面收頭未填實。



說明

6K+325~+345 部分，截流溝之陰井兩側 L 行排水溝入口斷面不足(進水口太小易阻塞)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.14

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程



擋土牆 0K+710~
0K+720 鋼板護欄
立柱套管，局部填
縫不平整，易積
水。

14/04/2022

說明

擋土牆 0K+710~0K+720 鋼板護欄立柱套管，局部填縫不平整，易積水。



工程告示牌內容
未記載經費、完工
日期及 QR-code
不符規定。

尖石鄉公所 (Jianshih Township Office)			
工程名稱 (Project Name)	新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	國聖工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	國聖工程顧問有
施工廠商 (Contractor)	志佳營造有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	道路改善
施工期間 (Duration)	民國 110 年 11 月 11 日至 111 年 03 月 10 日 (11/11/2021~10/03/2022)		
地主任或工地負責人 (Site Manager)	傅步展	電話 (TEL)	0975-109810
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	張萬庭	電話 (TEL)	03-5935281
全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw		
政風單位 (Integrity Ethics Department)	03-5841001		
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央： (千元)(Unit:NT\$1,000) 2. 地方： (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 3. 空污管制編號 : 14/04/2022		

說明

工程告示牌內容未記載經費、完工日期及 QR-code 不符規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.14

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程



說明

6K+325 路面截水溝鍍鋅格柵開口方向，未考慮自行車輪易掉落卡住問題，建議可調整加密格柵間距改善(建議加2道原設計為4道)，以維自行車行駛安全。



說明

擋土牆 0K+710~0K+720 兩側端部介面，收頭未確實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.14

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程



說明

排水路臨下邊坡排水口，未設簡易消能沉澱設施，砂石易流失，請研議改善方法。



說明

L 型側溝因模板接縫不平整致混凝土立面不平。
