

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.04.20

工程名稱：新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案



說明

無障礙廁所混凝土路面高程與設計不符，請檢討修正。

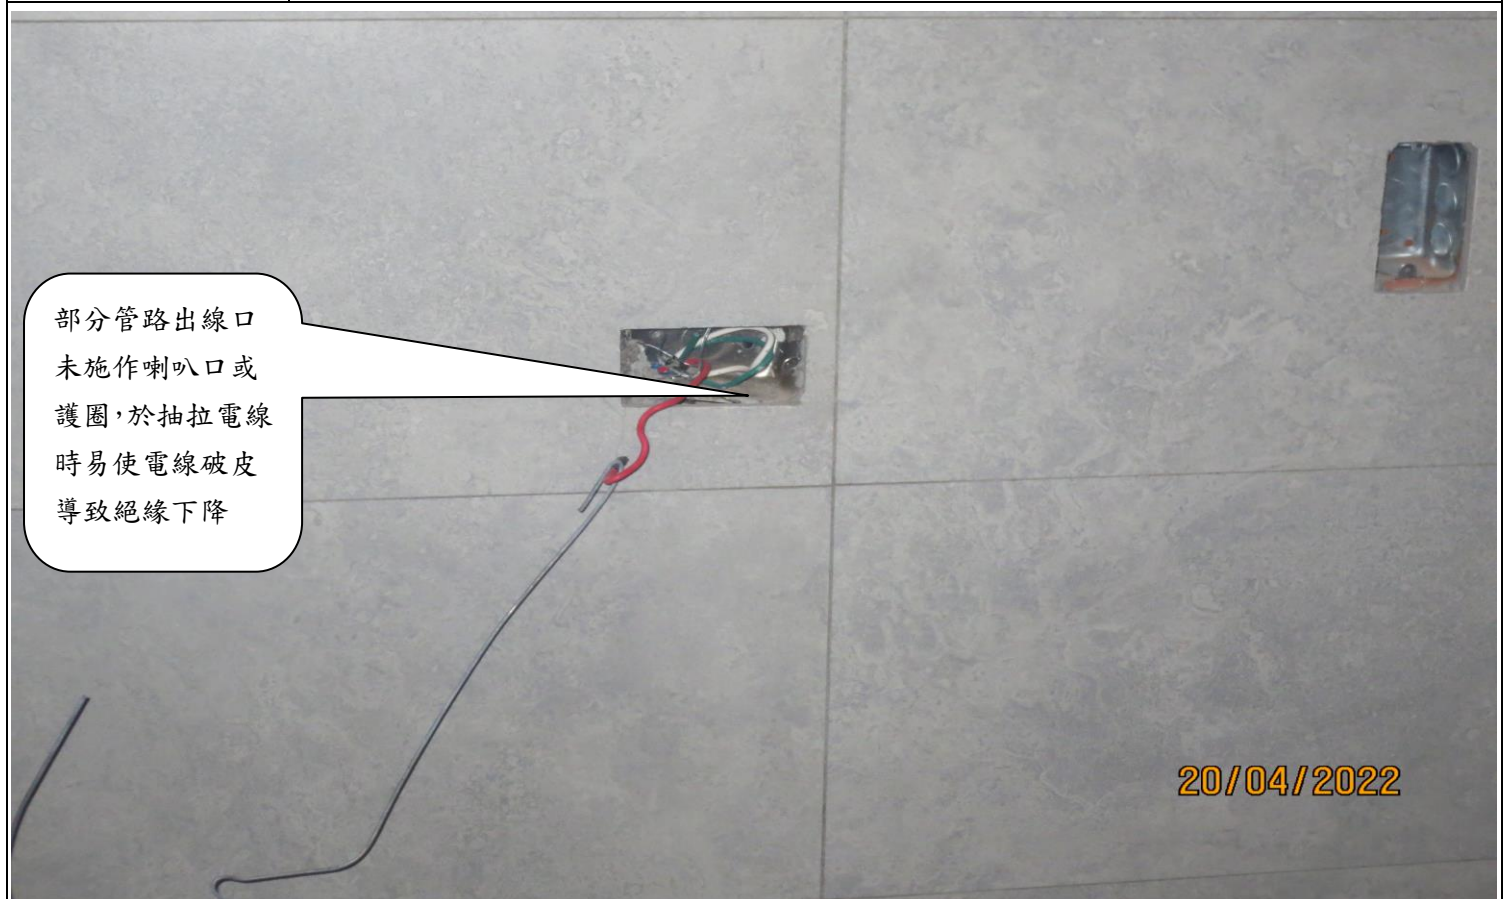


說明

部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.20

工程名稱：新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案

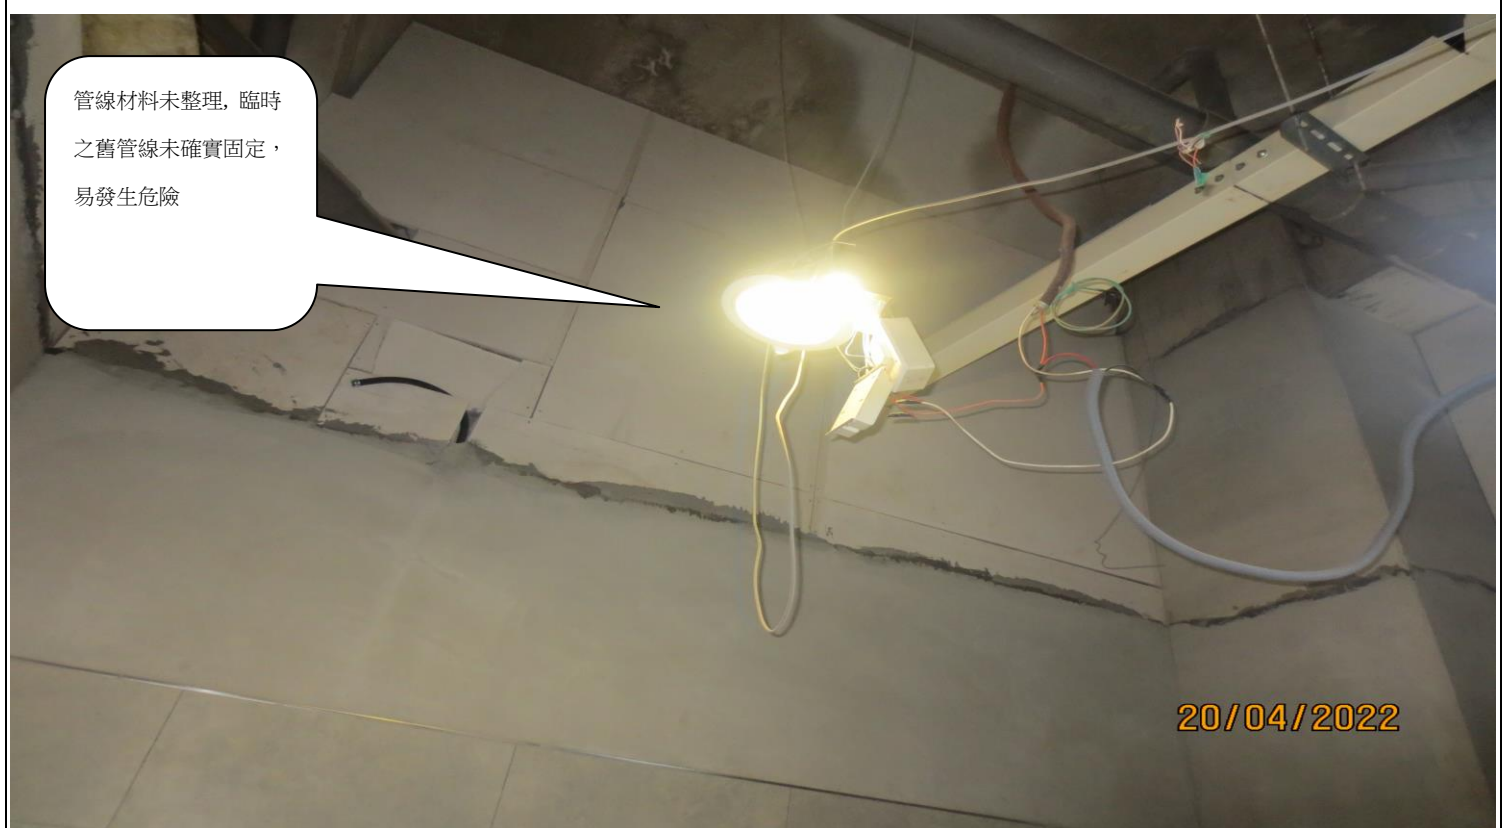

說明

管線材料未整理，臨時之舊管線未確實固定，易發生危險



說明

· 管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.20

工程名稱：新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案



廁所裝修磁磚頂端，界面有不平整情形，請改善。

20/04/2022

說明

廁所裝修磁磚頂端，界面有不平整情形，請改善。



工程告示牌內工地負責人的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。

2

說明

工程告示牌內工地負責人的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.04.20

工程名稱：新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案



說明

磁磚鋪貼應有鋪貼計畫，避免鋪貼零碎非整磚影響美觀。

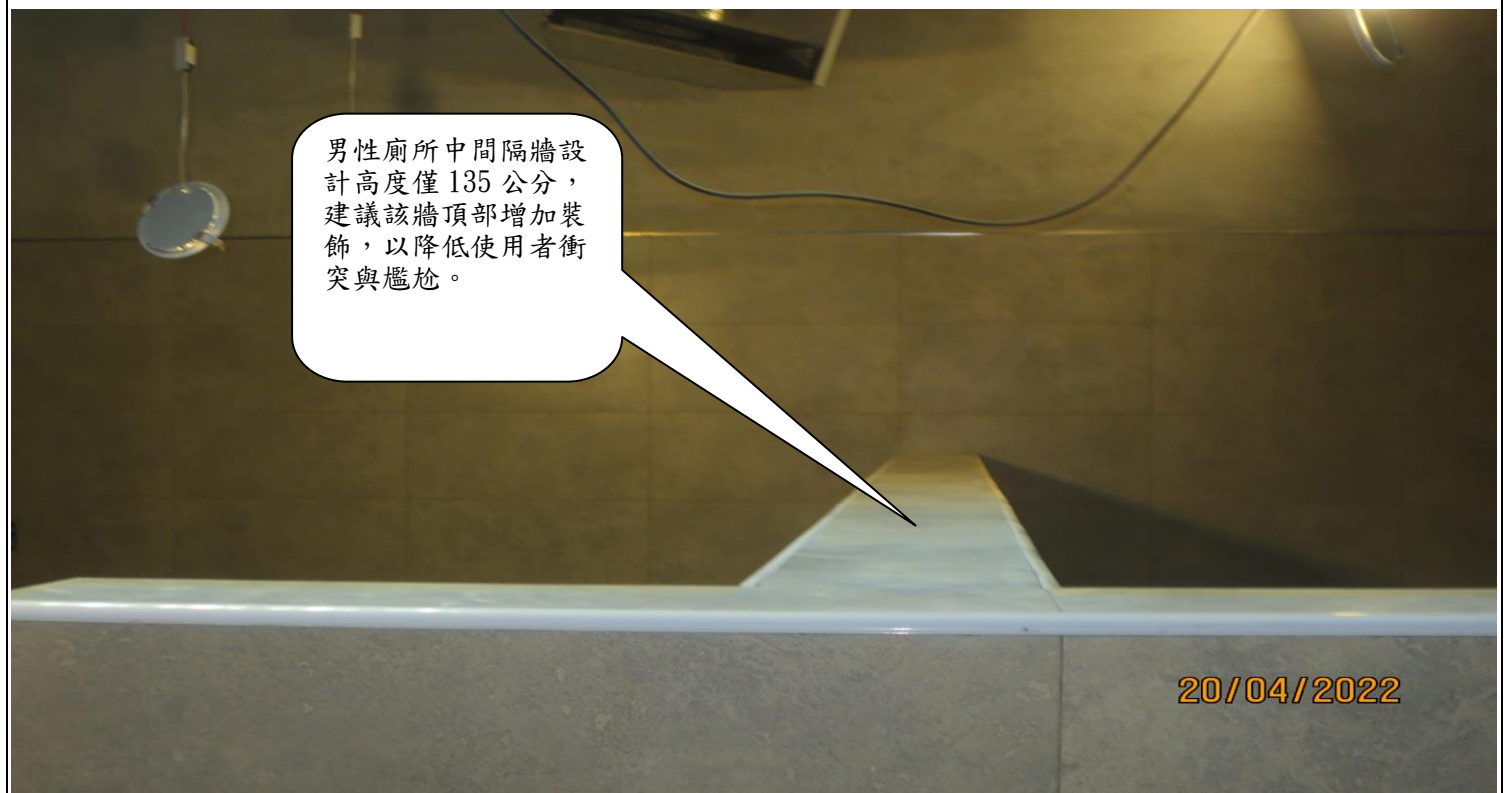

說明

男性廁所中間隔牆設計高度僅 135 公分，建議該牆頂部增加裝飾，以降低使用者衝突與尷尬。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.20

工程名稱：新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案



說明

現場施工部分未依契約圖面施工，建議如需調整應先行報備。

說明
