

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.05.23.

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程



說明

混凝土澆置表面高低不平、有弧形。

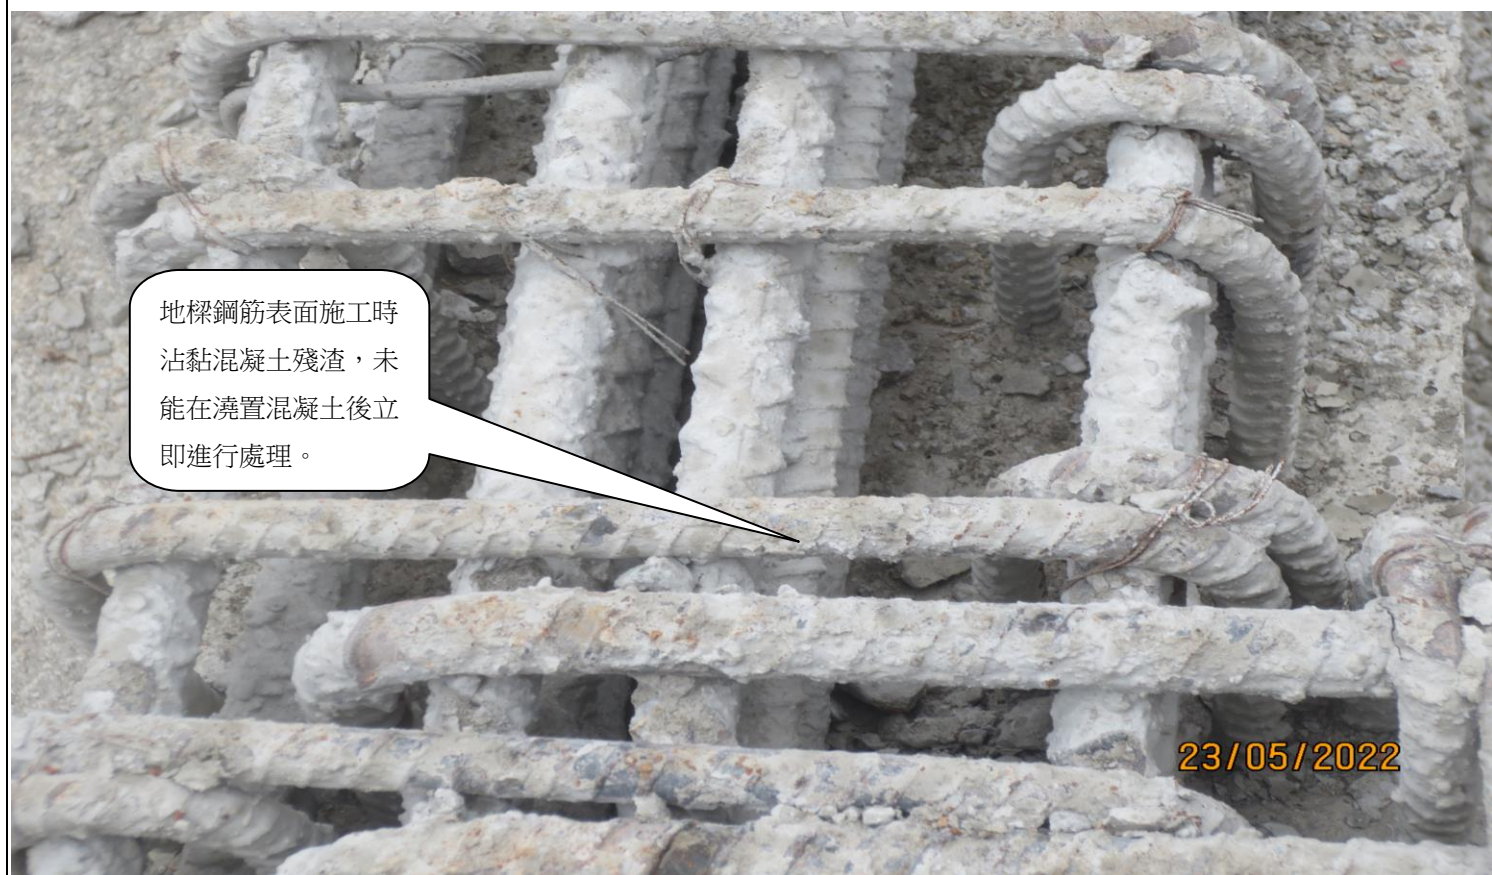


地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。

說明

地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。

拍攝日期：111.05.23

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程

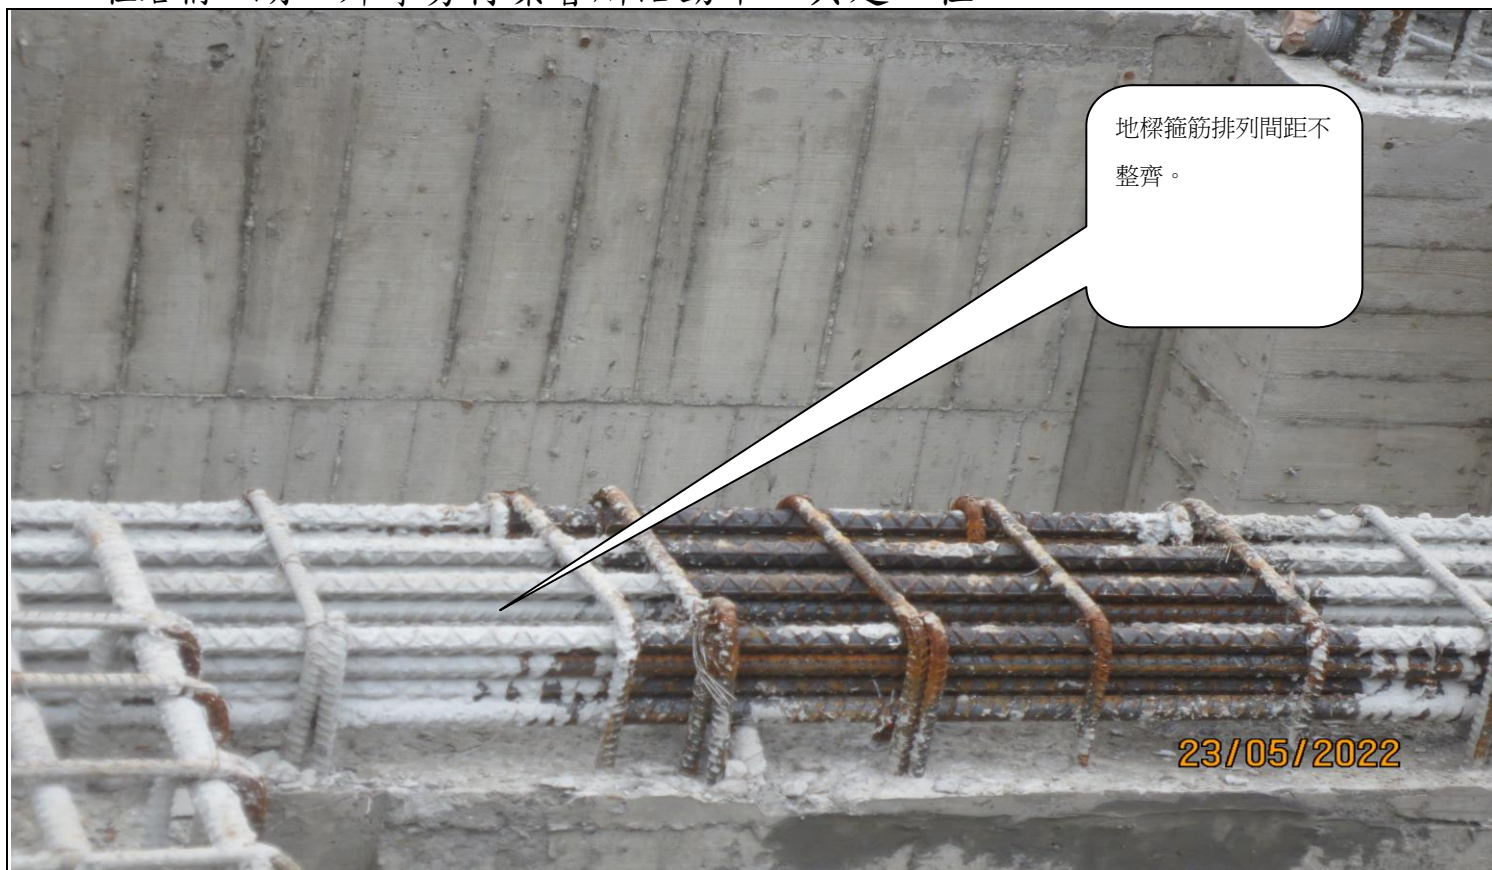

地樑箍筋排列間距不整齊。

23/05/2022

說明

地樑箍筋排列間距不整齊。



鋼軌樁中間之擋板為6分板，而夾板過雨水會膨脹，擋土效果不良。

23/05/2022

說明

鋼軌樁中間之擋板為6分板，而夾板過雨水會膨脹，擋土效果不良。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23.

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程

新竹縣湖口鄉公所 (Hsinchu County Hukou Township Office)			
工程名稱 (Project Name)	湖口鄉公所湖口鄉孝勢村集會所活動中心 興建工程		營建工程空氣污染防治費徵收管制編號: (Serial number of Air Pollution Control Fee collection)
監造單位 (Construction Supervisor)	陳建勳建築師事務所	設計單位 (Designer)	陳建勳建築師事務所
施工廠商 (Contractor)	朝新營造事業股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	地上4層、1幢棟3戶、新建集會所
施工期間 (Duration)	民國111年3月17日至111年11月11日 (17/3/2022 ~ 11/11/2022)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	張家碩	電話 (TEL)	03-5317775
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	劉俊秀	電話 (TEL)	03-5317775
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009609 https://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5269193/0800-286-586	
經費來源 (Budgetary sources)	1.中央：4000 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方：26530 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		

新竹縣環保局公害檢舉電話:
(Public nuisance report hotline)
0800-009609
0800-286-586
(03)5519345#5007
全民督工行動應通報網址

工程告示牌，政風電話有誤，工地負責人及專任工程人員電話請填寫手機號碼，令空污編號未載明，請補正。

說明

工程告示牌，政風電話有誤，工地負責人及專任工程人員電話請填寫手機號碼，令空污編號未載明，請補正。



說明

未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工中之地樑高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備及防墜措施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.23.

工程名稱：湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程



說明

施工中之地樑模板使用過度未經妥善整理有老舊破損情形。



說明

因工地在市區，夜間照明及警告設施應加強。
