

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.26

工程名稱：關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程



護岸（頂面）養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。

說明

護岸（頂面）養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。



混凝土表面殘留雜物（已完成擋土牆-護岸）發現鐵絲未剪除。


說明

混凝土表面殘留雜物（已完成擋土牆-護岸）發現鐵絲未剪除。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.26

工程名稱：關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程

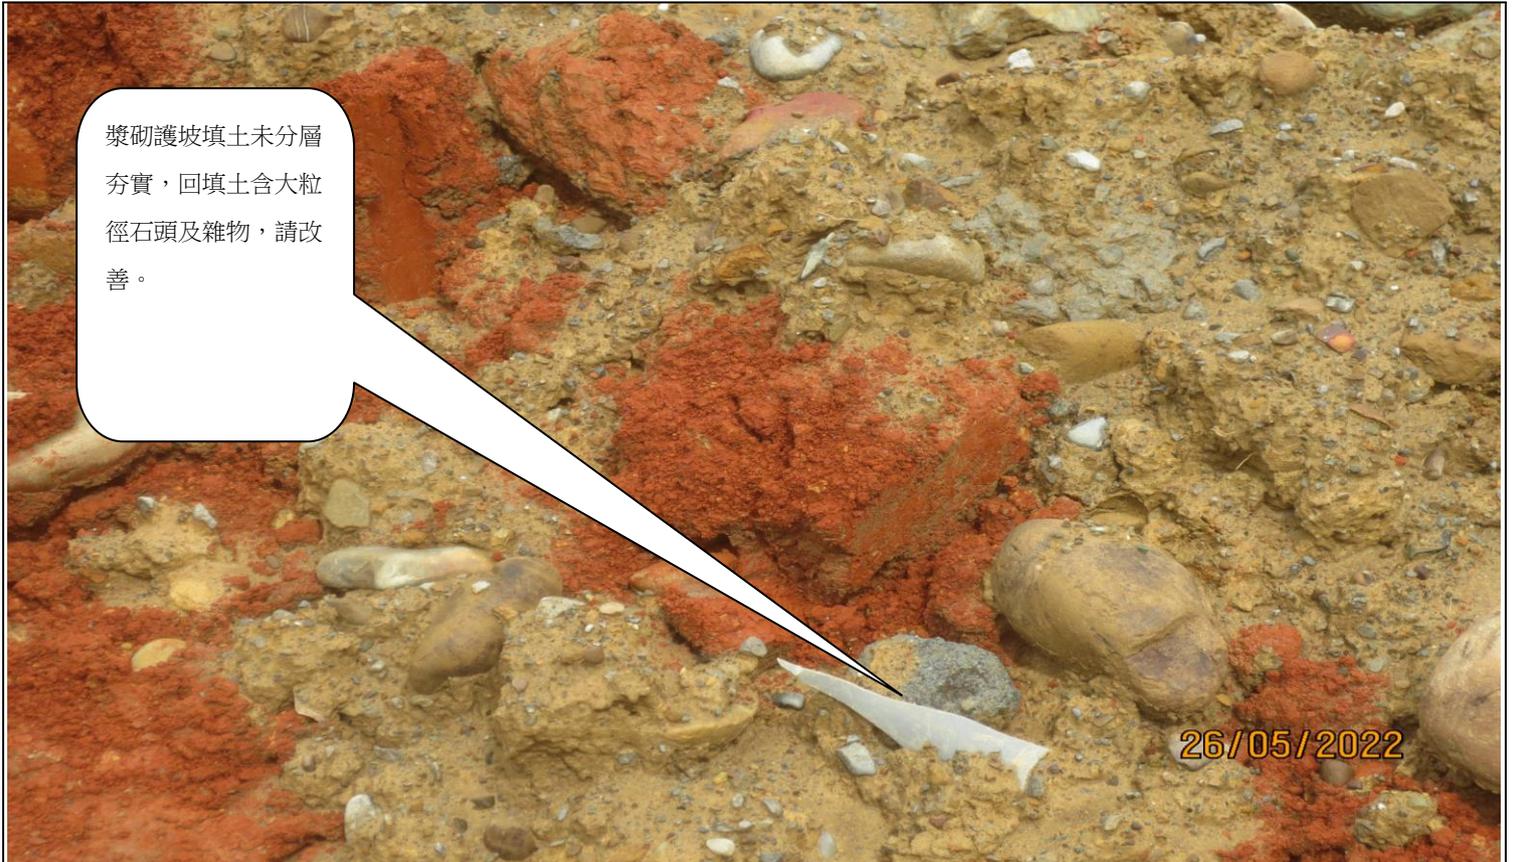

說明

漿砌護坡填土未分層夯實，回填土含大粒徑石頭及雜物，請改善。



說明

工區之開挖整地覆土(護坡邊)，局部裸露面未適當保護，遇雨易流失。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.26

工程名稱：關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程



工程告示牌，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。

說明：工程告示牌，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。



圍籬施作未按規定施作，且警告設施不足。

說明：圍籬施作未按規定施作，且警告設施不足。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.26

工程名稱：關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程



說明

工地施工管制夜間警示措施不足。



說明

請主辦機關審查設計圖說時，應考量結構物協調性，以免完工後，完成結構物，和現況建物產生不一致情形。
