

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.03.06

工程名稱：縣道122線(24.6K)5月22日及(39.8K)5月16日大雨災害復建工程



說明

39.8K 下邊坡擋土牆處部分伸縮縫施作不確實。

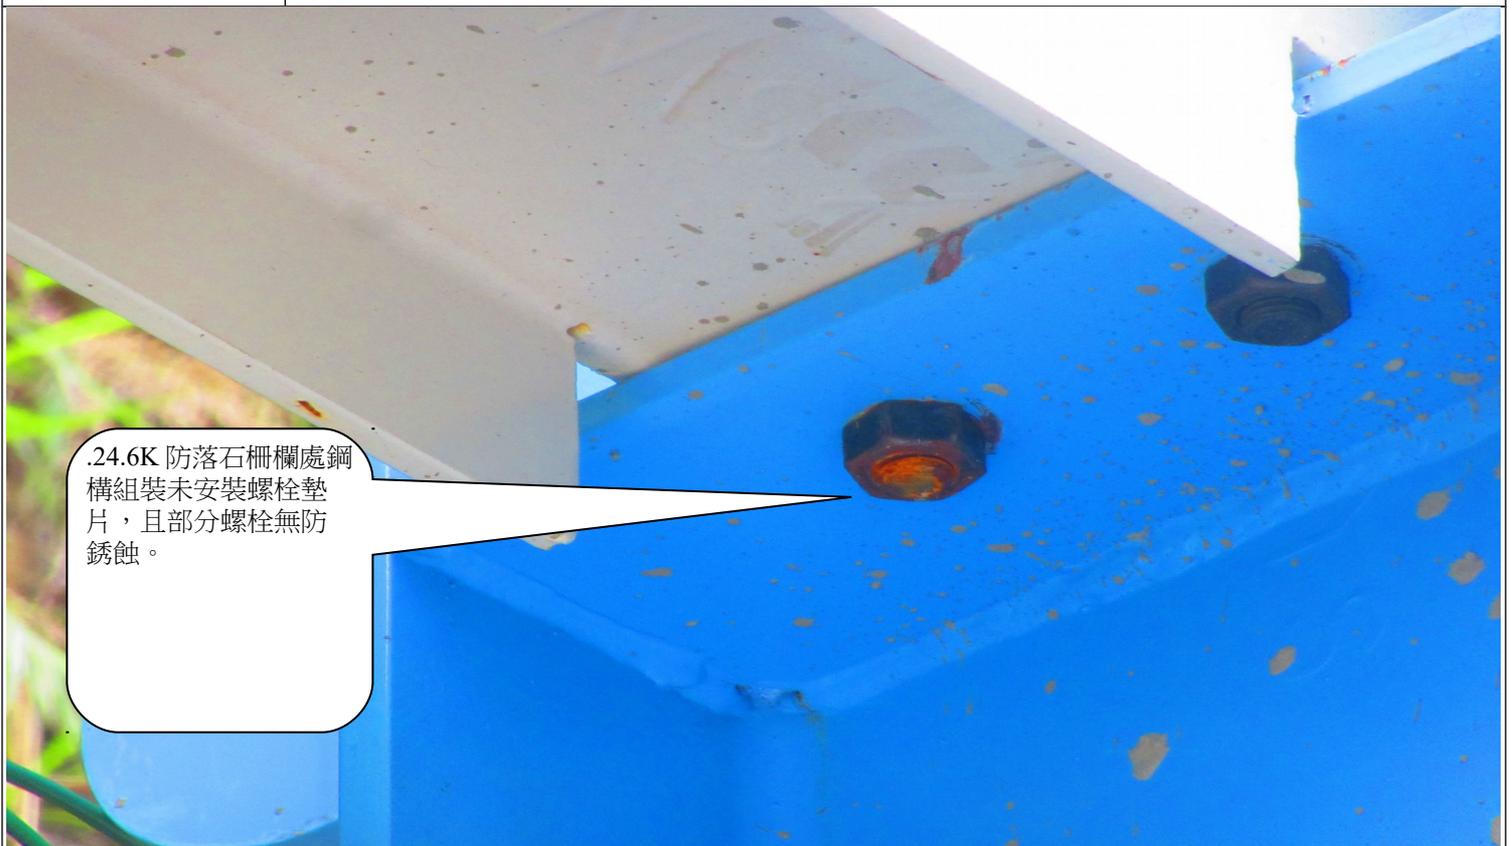


說明

24.6K 防落石柵欄處鋼構組裝未安裝螺栓墊片，且部分螺栓無防銹蝕。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.04

工程名稱：縣道122線（24.6K）5月22日及（39.8K）5月16日大雨災害復建工程

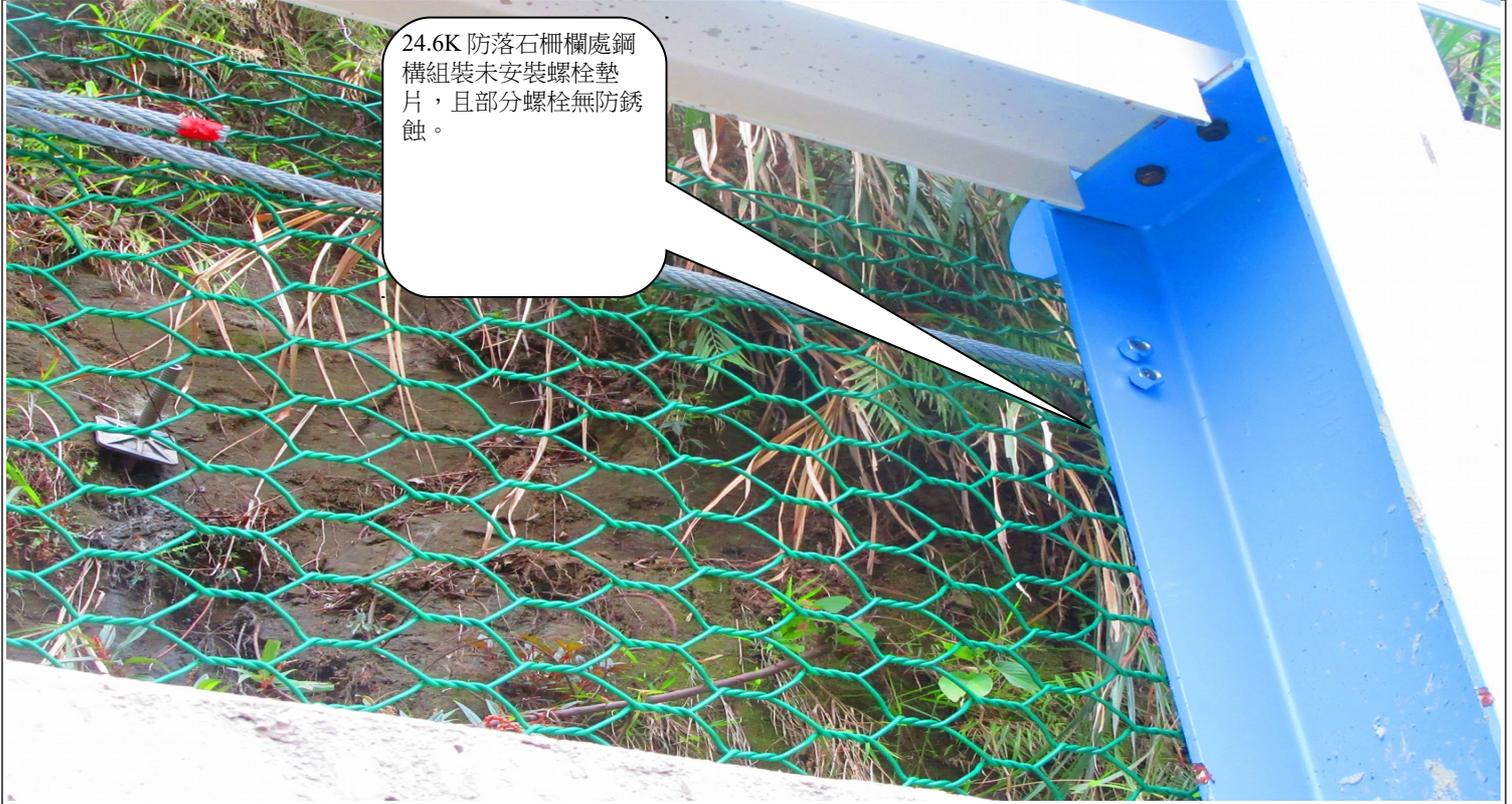

說明

24.6K 防落石柵欄處鋼構組裝未安裝螺栓墊片，且部分螺栓無防銹蝕。



說明

24.6K 防落石柵欄處鋼構支柱與鍍鋅鋼板有銲接，銲接完成後未補塗裝與防銹蝕。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.04

工程名稱：縣道122線（24.6K）5月22日及（39.8K）5月16日大雨災害復建工程



說明

24.6K 防落石柵欄處鋼構支柱與鍍鋅鋼板有銲接，銲接完成後未補塗裝與防銹蝕。

39.8K 下邊坡擋土牆邊坡下方廢棄混凝土塊未妥當處理。



說明

39.8K 下邊坡擋土牆邊坡下方廢棄混凝土塊未妥當處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.04

工程名稱：縣道122線（24.6K）5月22日及（39.8K）5月16日大雨災害復建工程

39.8K 型框植生下方水溝內有廢棄物未清理。



說明

39.8K 型框植生下方水溝內有廢棄物未清理。

.24.6K 防落石柵欄少數排水孔堵塞。



說明

.24.6K 防落石柵欄少數排水孔堵塞。

拍攝日期：113.03.06

工程名稱：縣道122線（24.6K）5月22日及（39.8K）5月16日大雨災害復建工程



說明

39.8K 下邊坡擋土牆處之道路轉彎處的鍍鋅護欄線形不良。



說明

39.8K 下邊坡擋土牆處之鍍鋅護欄無 U 形護欄收尾。
