

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.14

工程名稱：新竹縣橫山鄉村里生活道路養護整建工程



說明

工區二之前段排水溝有殘料掉落，路邊有殘料未清等現象請清除。



說明

工區二之前段排水溝有殘料掉落，路邊有殘料未清等現象請清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.14

工程名稱：新竹縣橫山鄉村里生活道路養護整建工程



工區二之 0K+380 處
之收邊瀝青混凝土有
裂縫，請修補。

14/11/2019 10:23

說明

工區二之 0K+380 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。



工區二之全段瀝青
路面有跳料，請全段
檢查並改善。

14/11/2019 10:26

說明

工區二之全段瀝青路面有跳料，請全段檢查並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.14

工程名稱：新竹縣橫山鄉村里生活道路養護整建工程



說明

工區二之 0K+400 處之人手孔壓實不確實，請修補。




說明

工區五之 C 段與 D 段銜接不順，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.14

工程名稱：新竹縣橫山鄉村里生活道路養護整建工程

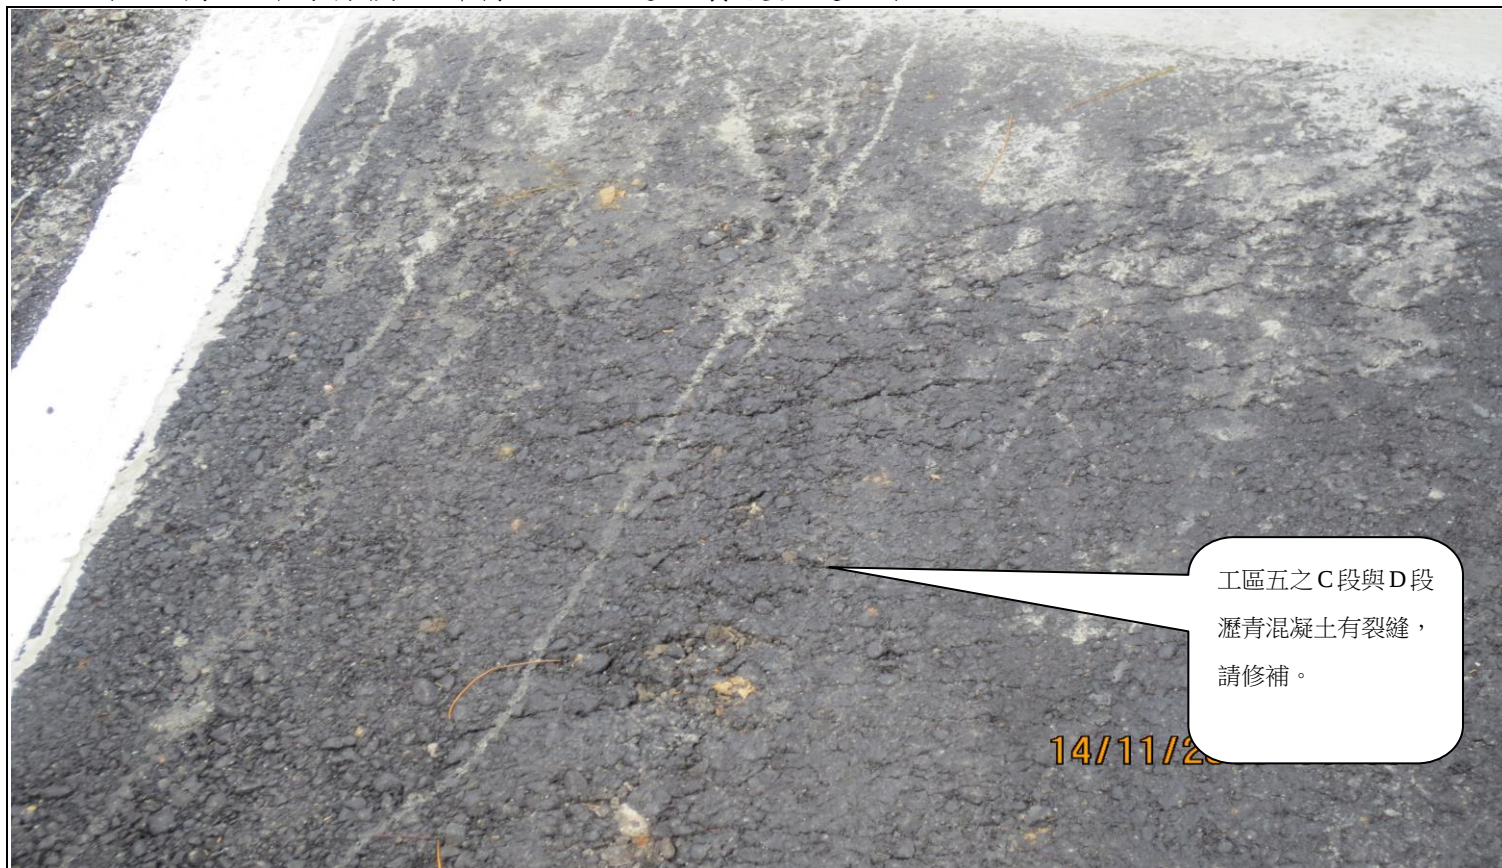

工區五之 C 段與 D 段
瀝青混凝土有裂縫，
請修補。

14/11/2019

說明

工區五之 C 段與 D 段瀝青混凝土有裂縫，請修補。



C 鋪設之完成面與水
溝頂上有高差不平整
之問題存在，建議主
辦機關應予以督促設
計單位研商如何予以
順接，以利車行之安
全無虞。

14/11/2019 10:18

說明

本工程為 AC 路面之刨鋪，與排水溝及蓋版更新等，但 AC 鋪設之完成面與水溝頂上有高差不平整之問題存在，建議主辦機關應予以督促設計單位研商如何予以順接，以利車行之安全無虞。
