

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程



伸縮縫應修飾美觀及注意強度(切割長度應加深)。

說明

伸縮縫應修飾美觀及注意強度(切割長度應加深)。

混凝土施工界面與
連接外面 AC 道路
之應切割平整並挖
至所需之深度。



說明	混凝土施工界面與連接外面 AC 道路之應切割平整並挖至所需之深度。
----	-----------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程



說明	廟前廣場混凝土拉毛地坪，有腳印，請改善。
----	----------------------




說明	工區路緣石，施工外表部份不平整，請改善。
----	----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

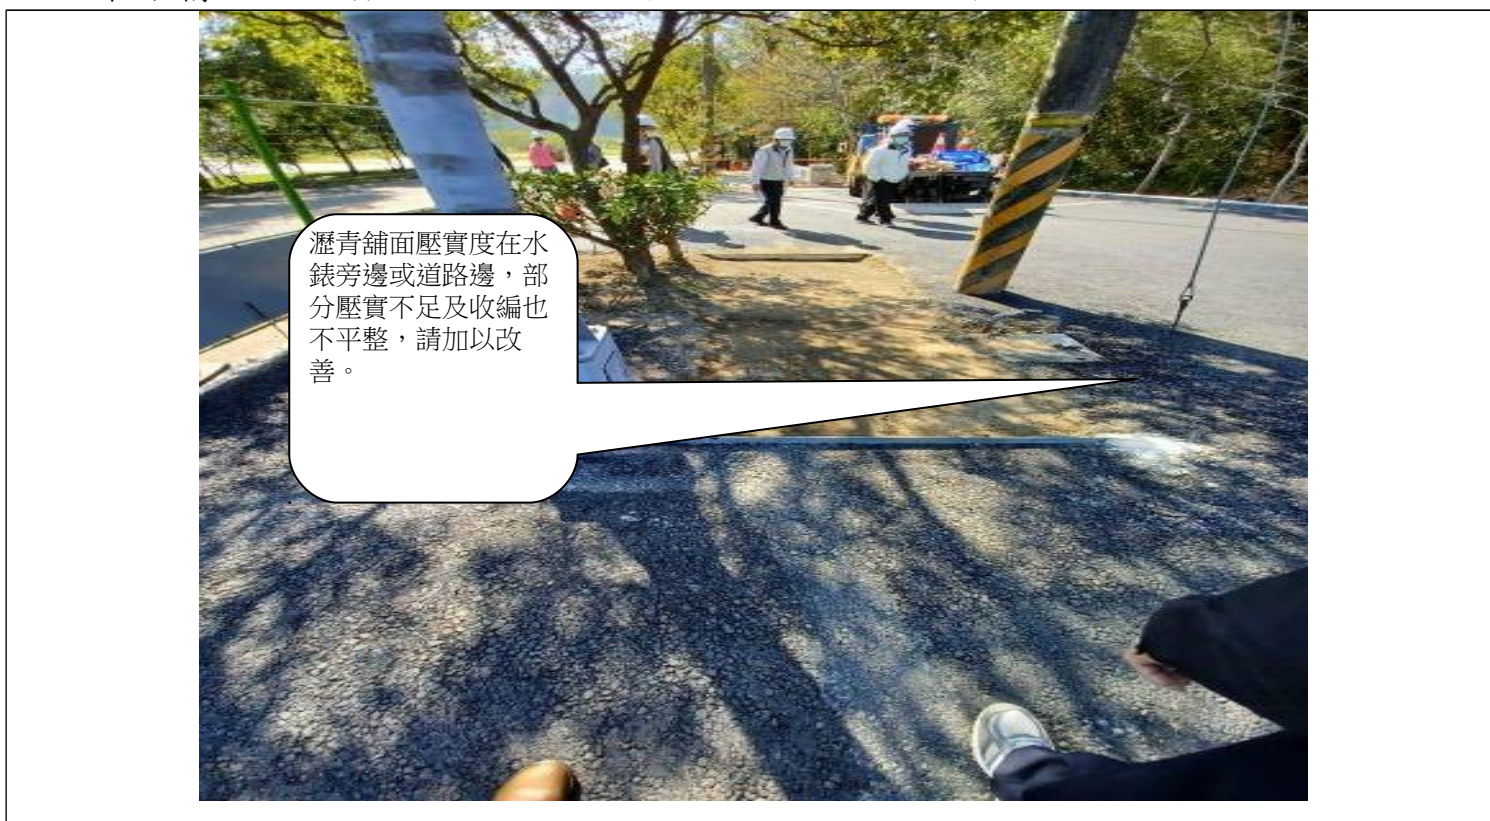

說明	瀝青鋪面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。
	
說明	瀝青鋪面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

C 停車場少部份鋪面，粗粒料過多，請改善。



說明

AC 停車場少部份鋪面，粗粒料過多，請改善。

工區四周緣石中間排水口，後方有土阻擋請挖除做排水措施。



說明

工區四周緣石中間排水口，後方有土阻擋請挖除做排水措施。

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

移植樹木應適度修枝，用#5鋼筋固定，樹穴週圍做花台保水及美化。



說明

移植樹木應適度修枝，用#5鋼筋固定、樹穴週圍做花台保水及美化。

自行車道與外面道路應設計進出通道鋪面，空地種草皮。



說明

自行車道與外面道路應設計進出通道鋪面，空地種草皮。
